



DOCUMENTO TÉCNICO

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões
2. Dados da Empresa Elaboradora
3. Dados do Estabelecimento / Cliente
4. Introdução e Metodologia do PGR
5. Memorial Descritivo — Obra
6. Memorial Descritivo — Áreas de Vivência
7. Base Legal e Responsabilidades
8. Definições e Critérios de Avaliação
9. Levantamento Preliminar / Identificação de Perigos
10. Avaliação de Riscos — Metodologia e Matriz
11. Controle dos Riscos — Hierarquia de Prevenção
12. AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPRT)
13. Prevenção com Máquinas e Equipamentos (NR-12)
14. Preparação para Emergências e Simulados
15. Análise de Acidentes e Doenças Relacionadas
16. Indicadores de Monitoramento e Desempenho SST
17. Plano de Ação — Medidas de Prevenção (5W2H)
18. Contratação de Prestadores de Serviços
19. Introdução de Novas Tecnologias ou Mudanças
20. Procedimentos para Registro de Acidentes
21. CIPA — Comissão Interna de Prev. de Acidentes e de Assédio
22. Segurança com Produtos Químicos (NR-26)
23. Comunicação, Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
24. eSocial — Obrigações Decorrentes do GRO
25. Profissional Habilitado e Responsável pelo PGR
26. Inventário de Riscos das Funções
- 26.1 Inventário de Riscos Psicossociais
27. Inventário de Riscos das Funções – Empresas Terceirizadas
28. Documentos e Projetos Obrigatórios

1. CONTROLE DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	REV.	ELABORAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	RESP. IMPLEMENTAÇÃO
06/2025	Emissão inicial — PGR	0	Adriano G. / SECONCI	Mariana de Jesus Souza Ribeiro	Mariana de Jesus Souza Ribeiro
06/2026	Inclusão Psicossocial	1	Adriano G. / SECONC	Mariana de Jesus Souza Ribeiro	Mariana de Jesus Souza Ribeiro

2. DADOS DA EMPRESA ELABORADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás – SECONCI GO
CNPJ	36.863.637/0001-59
Endereço	Rua C 136 Nº 681 Qd 3037 – Lotes 20 e 21 – Jardim América – Goiânia/GO
Telefone	(62) 3250-7544
Eng. Responsável	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Registro CREA	CREA – GO n.º 101672344D-GO
Contato Direto	(62) 9 9430-0089
E-mail	segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br

Página 2 de 26

3. DADOS DO ESTABELECIMENTO / CLIENTE

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	SPE T-65 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA
CNPJ	37.944.082/0001-32
Atividade Principal / CNA	4120-4/00 - Construção de edifícios
Grau de Risco (GR)	3
Endereço	Rua T-65 esquina, Rua S-3, Quadra S-6, Lote 1-26/28, Bela Vista, Goiânia - GO
Horário de Trabalho	Turno de segunda a quinta-feira: 07h - 17h Turno de sexta-feira: 07h-16h Horas extras: Negociadas em casos de necessidade com a equipe.
Nº Total de Trabalhadores	118
Responsável da Empresa	Guilherme Jorge Binns
Responsável pelo PGR (cliente)	Mariana de Jesus Souza Ribeiro
Responsável pela Implementação	Mariana de Jesus Souza Ribeiro

Página 3 de 26

4. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DO PGR

Este documento constitui o **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** da organização, sendo a materialização do processo contínuo de **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** exigido pela NR-01 (Capítulo 1.5), atualizada pela Portaria MTE n.º 1.419/2024. Enquanto o GRO é o macroprocesso de gestão, o PGR é o seu conjunto de documentos fundamentais, estabelecendo os procedimentos para identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais para todos os trabalhadores (próprios, terceirizados e estagiários) expostos no estabelecimento.

O PGR é composto por dois documentos fundamentais, conforme exige a NR-01 subitem 1.5.6.1: (a) o **Inventário de Riscos**, que registra os perigos identificados, os riscos avaliados e as medidas de prevenção existentes por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE); e (b) o **Plano de Ação**, que estabelece as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, com indicação de responsável, prazo e recursos. Estes documentos são interdependentes: o Inventário fundamenta o Plano de Ação, e o Plano de Ação é avaliado por meio dos indicadores definidos na Seção 16.

O PGR integra-se ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO — NR-07), ao qual fornece os agentes de risco identificados como subsídio para a determinação dos exames médicos periódicos. A integração é bidirecional: o PCMSO retroalimenta o PGR com agravos à saúde identificados nas avaliações médicas, gerando necessidade de revisão do Inventário de Riscos quando pertinente. O PGR também fundamenta as obrigações de envio de informações ao eSocial (eventos S-2240 e S-2245), conforme detalhado na Seção 24.

Normas regulamentadoras e referenciais técnicos que fundamentam este PGR: NR-01 (GRO), NR-05 (CIPA), NR-06 (EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (Avaliação de Riscos), NR-10 (Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-15 (Insalubridade), NR-16 (Periculosidade), NR-17 (Ergonomia), NR-18 (Construção Civil), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-24 (Condições Sanitárias), NR-26 (Sinalização de Segurança), NR-33 (Espaço Confinado), NR-35 (Trabalho em Altura), AIHA 2015 / Fundacentro (metodologia de avaliação posicional), e Manual GRO MTE 2025.

4.1 METODOLOGIA E ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

REQUISITO	FORMA DE ATENDIMENTO	REFERÊNCIA NR-01
Periodicidade de Revisão	Análise crítica a cada 2 anos ou quando ocorrerem modificações previstas na NR-01	Subitem 1.5.4.4.6
Gestão de Mudanças	Atualização dinâmica a cada transição de etapa construtiva ou alteração significativa em processos	Subitens 1.5.4.4.6 alíneas a–f
Ferramenta de Gestão	Ciclo PDCA e planos de ação 5W2H	Subitem 1.5.6.2
Solicitação de Revisão	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada mediante formulário específico	Subitem 1.5.4.4.6 alínea f

4.2 ABRANGÊNCIA DO GRO

- **Riscos Físicos** — ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante (UV solar), umidade, pressões anormais;
- **Riscos Químicos** — poeiras respiráveis (sílica), fumos metálicos, gases, névoas, produtos químicos conforme FDS;
- **Riscos Biológicos** — micro-organismos, vetores, agentes biológicos em fossas e solos contaminados;
- **Riscos Ergonômicos** — levantamento manual de cargas, posturas inadequadas, repetitividade, monotonia;
- **FRPRT** — Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17);
- **Riscos de Acidentes / Eventos Perigosos** — queda de altura, queda de materiais, máquinas, eletricidade, incêndio;
- **Perigos Externos Previsíveis** — fatores externos que possam afetar a SST (NR-01 subitem 1.5.3.2).

5. MEMORIAL DESCRITIVO — OBRA / ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Nome do Empreendimento	Construção Civil / Edifício Residencial Vertical
Tipo de Obra	Construção Civil / Edifício Residencial Vertical
Fase Atual	Estrutura
Nº de Pavimentos	32
Área Total Construída	24.953,57 m²
Duração Prevista	

6. MEMORIAL DESCRITIVO — ÁREAS DE VIVÊNCIA

Em conformidade com a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto), o Anexo 04 apresenta o módulo de dimensionamento do canteiro de obras.

★ Integração com NR-24 obrigatória. Dimensionamento deve considerar o número efetivo de trabalhadores por turno, conforme NR-18 item 18.5.

7. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES (NR-01 GRO)

Todos os requisitos da NR-01 foram contemplados neste PGR, especialmente o capítulo 1.5 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), atualizado pela Portaria MTE nº 1.419/2024 (vigência: 26/05/2026), utilizando a metodologia de Avaliação por Multiplicação Aritmética (Probabilidade x Severidade).

7.1 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

REQUISITO NR-01	COMO ATENDER / EVIDÊNCIA	SEÇÃO NESTE PGR
1.5.2 – Levantamento Preliminar	Realizado antes do início das atividades e nas mudanças	Seção 9
1.5.3 – Identificação de Perigos	Inventário de Riscos por GHE com indicação de trabalhadores expostos	Seção 9
1.5.4 – Avaliação de Riscos	Multiplicação Aritmética (P x S) — Matriz 5×5 / Fundacentro	Seção 10
1.5.4.4.2 – Critérios Documentados	Escalas de Probabilidade e Severidade documentadas e registradas	Seção 10
1.5.5 – Controle dos Riscos	Hierarquia de medidas de prevenção + Plano de Ação 5W2H	Seção 11 / Seção 17
1.5.5.3 – Monitoramento e Desempenho	Indicadores proativos e reativos com fórmulas e metas	Seção 16
1.5.5.4 – Integração com PCMSO	Tabela de exames por agente de risco; conexão com médico do trabalho	Seção 15
1.5.5.5 – Análise de Acidentes	Procedimento completo com causa raiz (5 Porquês / Ishikawa)	Seção 15

1.5.5.6 – Preparação para Emergências	Cenários identificados + brigada constituída + exercícios simulados obrigatórios	Seção 14
1.5.6 – Documentação do PGR	Critérios, Inventário de Riscos e Plano de Ação assinados e datados	Inventário + Seção 17

7.2 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITENS 1.4 E 1.5.1)

REQUISITO	COMO IMPLEMENTAR	REGISTRO / EVIDÊNCIA
Participação no GRO (1.4.2.a)	Formulários de percepção de risco; inspeções com trabalhadores	Formulários preenchidos (Anexo 02)
Consulta via CIPA (1.4.2.b)	Item fixo na pauta das reuniões ordinárias da CIPA	Atas de reunião da CIPA
Comunicação dos riscos (1.4.2.c)	DDS focados nos riscos do PGR e Plano de Ação	Listas de presença dos DDS
Melhoria do desempenho (1.4.2.d)	Dashboards de SST; planos PDCA; lições aprendidas	Relatórios mensais de SST
Solicitação de revisão (1.5.4.4.6.f)	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada do PGR	Formulário de solicitação de revisão

7.3 RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEM 1.4.4)

Todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício (próprios, terceirizados ou estagiários), têm as seguintes responsabilidades no âmbito deste PGR:

- Cumprir as determinações deste PGR e das instruções de segurança aplicáveis à sua função, conforme treinamento recebido;
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização, conservando-os em perfeito estado e comunicando ao responsável qualquer avaria, vencimento ou necessidade de substituição;
- Comunicar imediatamente ao supervisor imediato e ao Técnico de SST qualquer situação de risco grave e iminente, quase-acidente ou condição insegura identificada no canteiro, sem aguardar autorização para tal;
- Participar obrigatoriamente dos treinamentos, Diálogos Diários de Segurança (DDS) e exercícios simulados programados pela organização, assinando as respectivas listas de presença;
- Colaborar ativamente com a identificação de perigos e com as inspeções de segurança realizadas pela equipe de SST e pela CIPA, respondendo a questionários e percepções de risco quando solicitado;
- Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho, contribuindo com as práticas de 5S e as medidas de controle administrativo estabelecidas neste PGR;
- Recusar a execução de atividades que coloquem em risco grave e iminente a sua própria segurança ou a de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior imediato e ao SST (NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158 da CLT).

★ O trabalhador que recusar a execução de atividade em condição de risco grave e iminente não poderá sofrer retaliação, penalidade ou qualquer forma de discriminação, conforme NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158, parágrafo único, da CLT.

7.4 ATRIBUIÇÕES DO SESMT / TÉCNICO DE SST (NR-01 SUBITEM 1.4.3)

Cabe ao SESMT ou ao Técnico de SST **subsidiar, orientar e assessorar tecnicamente** a organização no cumprimento das obrigações de SST, tendo como principais atribuições:

- **Subsidiar a elaboração:** fornecer suporte técnico para a criação, monitoramento e revisão do Inventário de Riscos e do Plano de Ação, em conjunto com o Engenheiro de Segurança responsável (SECONCI GOIÁS);
- **Orientar a prevenção:** realizar inspeções técnicas periódicas no canteiro para identificar desvios e orientar as equipes sobre as medidas corretivas necessárias;
- **Promover a capacitação:** ministrar ou coordenar os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as integrações de novos trabalhadores e os treinamentos obrigatórios previstos;

- **Assessorar em acidentes:** conduzir tecnicamente a investigação de acidentes e incidentes, fornecendo subsídios para a análise de causas e sugestão de medidas preventivas;
- **Monitorar registros:** apoiar a organização na manutenção e atualização dos registros de entrega de EPIs e dos prontuários de SST dos trabalhadores;
- **Apoiar a CIPA:** participar das reuniões da CIPA, fornecendo dados técnicos e orientando o cumprimento das recomendações da comissão;
- **Consolidar indicadores:** organizar os indicadores de SST da Seção 16 e reportá-los mensalmente à direção da obra para subsidiar a tomada de decisão.

7.5 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / EMPREGADOR (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

Cabe à organização, conforme as diretrizes da NR-01 e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO):

- **Implementar o GRO:** garantir que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais seja efetivo em todas as etapas da obra, provendo os recursos necessários;
- **Cumprir as Normas:** cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- **Informar os Trabalhadores:** informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas e os resultados das avaliações ambientais;
- **Elaborar Ordens de Serviço:** elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- **Permitir a Interrupção do Trabalho:** permitir que o trabalhador interrompa suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, por motivos razoáveis, considere envolver um risco grave e iminente para sua vida ou saúde;
- **Garantir a Integração:** assegurar que as empresas contratadas (terceirizadas) recebam informações sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção do canteiro de obras.

8. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

8.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS (NR-01 / MANUAL GRO MTE 2025)

TERMO	DEFINIÇÃO
Perigo	Fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Pode ser situação, objeto, substância ou comportamento (NR-01 subitem 1.3.2.1).
Risco Ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde com a severidade dessas lesões, decorrentes da exposição a um perigo (NR-01 subitem 1.3.2.2).
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: conjunto de medidas para gestão dos riscos, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação (NR-01 subitem 1.5.1).
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos: documento do GRO composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação (NR-01 subitem 1.5.6).
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição: trabalhadores com perfil de exposição similar a determinados agentes ocupacionais.
LEO / OEL / LT	Limite de Exposição Ocupacional (NR-09 revisada) — equivalente ao OEL (AIHA) e TLV-TWA (ACGIH). Parâmetro de referência quantitativa. Limite de Tolerância (LT): valor máximo permitido pela NR-15.
EPC / EPI	EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. EPI: Equipamento de Proteção Individual — CA válido obrigatório, conforme NR-06.
PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07): integrado ao PGR para monitoramento da saúde dos trabalhadores.
FRPRT	Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório no GRO a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17).

8.2 ESCALA DE PROBABILIDADE (AIHA 2015 / FUNDACENTRO — ESCALA NUMÉRICA)

NÍVEL	CATEGORIA	AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (% LEO/OEL)	AVALIAÇÃO QUALITATIVA (CONTROLES EXISTENTES)
1	Rara	Exposição < 10 % do LEO	Controle excelente – melhor tecnologia disponível; exposição improvável
2	Pouco Provável	10 % < Exposição ≤ 50 % do LEO	Controle em conformidade legal, mantido e monitorado adequadamente
3	Possível	50 % < Exposição ≤ 100 % do LEO	Controle adequado com pequenas deficiências; exposição controlável
4	Provável	100 % < Exposição ≤ 500 % do LEO	Controle incompleto ou com deficiências relevantes; exposição frequente
5	Muito Provável	Exposição > 5× LEO	Controle inexistente ou totalmente inadequado; exposição certa/contínua

★ Os critérios quantitativo e qualitativo são **alternativos e equivalentes** — não devem ser somados ou combinados. A metodologia AIHA 2015 / Fundacentro é baseada na multiplicação aritmética (P x S).

8.3 ESCALA DE SEVERIDADE (AIHA 2015)

NÍVEL	CATEGORIA	DANO À SAÚDE / INTEGRIDADE	DANO AO PROCESSO / PATRIMÔNIO
1	Leve (Insignificante)	Lesão leve sem necessidade de atenção médica; incômodo passageiro; sem afastamento.	Perda financeira insignificante; sem interrupção do processo.
2	Baixa (Menor)	Lesão ou doença séria reversível; afastamento temporário; sem sequelas permanentes.	Dano material de baixo custo; interrupção breve e localizada.
3	Moderada	Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional; sequelas permanentes parciais.	Interrupção parcial das atividades; dano material relevante.
4	Alta	Lesão ou doença incapacitante permanente ou mortal (até 10 trabalhadores).	Paralisação significativa; dano patrimonial alto; impacto reputacional.
5	Extrema (Catastrófica)	Mortes ou incapacidades múltiplas (mais de 10 trabalhadores) — acidente ampliado.	Paralisação total; dano irreversível; impacto social e legal grave.

★ NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam **documentados e registrados**. As Seções 8.2 e 8.3 constituem o registro formal e obrigatório dos critérios adotados pelo GRO desta organização, em conformidade com a referida exigência legal.

9. LEVANTAMENTO PRELIMINAR / IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

9.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR (NR-01 SUBITEM 1.5.2)

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado: (a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações; (b) para as atividades existentes; (c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

9.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS (NR-01 SUBITEM 1.5.3)

GRUPO DE RISCO	EXEMPLOS DE PERIGOS / AGENTES IDENTIFICADOS
FÍSICO	Ruído, Vibração (mãos-braços e corpo inteiro), Calor (IBUTG), Frio, Radiação Não Ionizante (UV Solar, laser), Umidade, Pressões Anormais
QUÍMICO	Poeiras (respirável, sílica livre cristalina), Fumos Metálicos (soldagem), Gases e Vapores, Névoas, Produtos Químicos (FDS/SDS obrigatória — NR-26)
BIOLÓGICO	Micro-organismos patogênicos, Vetores e pragas, Agentes biológicos em fossas, solos contaminados e resíduos orgânicos
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manual de cargas (>23 kg — NR-17), Posturas inadequadas e forçadas, Repetitividade/Monotonia, Ritmo excessivo de trabalho — <i>Psicossociais (FRPRT)</i> : Sobrecarga de trabalho, Falta de autonomia, Suporte social insuficiente, Assédio moral/sexual, Insegurança no trabalho, Conflitos de papéis — obrigatório a partir de 26/05/2026
ACIDENTE / EVENTO PERIGOSO	Queda de Altura (NR-35), Queda de Materiais, Máquinas sem proteção (NR-12), Eletricidade (NR-10), Incêndio/Explosão, Soterramento, Cortes e perfurações
ESPAÇO CONFINADO (NR-33)	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, gases tóxicos e inflamáveis, soterramento e afogamento em fundações profundas, cisternas, galerias, poços e caixas de inspeção — verificar obrigatoriedade de PTE (Permissão de Trabalho em Espaço Confinado)
PERIGOS EXTERNOS	Condições climáticas extremas, vizinhança industrial, tráfego de veículos adjacente, interferências de terceiros no canteiro (NR-01 subitem 1.5.3.2)

9.3 CRITÉRIOS PARA REVISÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS (NR-01 SUBITEM 1.5.4.4.6)

#	GATILHO DE REVISÃO
1	Após implementação de medidas de prevenção — avaliação dos riscos residuais
2	Após mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho
3	Quando identificadas ineficácias das medidas de prevenção vigentes
4	Na ocorrência de acidentes, incidentes ou doenças relacionadas ao trabalho
5	Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis
6	Mediante solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA

Periodicidade máxima: a cada 2 anos ou até 3 anos para organizações com certificação em sistema de gestão de SST reconhecido pelo MTE.

10. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS — METODOLOGIA E MATRIZ

10.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO — MULTIPLICAÇÃO ARITMÉTICA (P X S)

A avaliação de riscos adota a metodologia **AIHA 2015 / AS-NZS 4360 / BS 8800**, implementada por meio da **Multiplificação Aritmética (P x S)** — o nível de risco é determinado pelo produto exato da Probabilidade pela Severidade (P x S). As escalas de Probabilidade e Severidade utilizadas estão integralmente documentadas na Seção 8 deste PGR, em atendimento ao subitem 1.5.4.4.2 da NR-01.

10.2 MATRIZ DE RISCO 5x5 (MULTIPLICAÇÃO P X S)

Irrelevante Baixo Moderado Alto Crítico

PROB. / SEV.	SEV 1 — LEVE	SEV 2 — BAIXA	SEV 3 — MODERADA	SEV 4 — ALTA	SEV 5 — EXTREMA
Prob 5 — Muito Provável	MODERADO (5)	ALTO (10)	ALTO (15)	CRÍTICO (20)	CRÍTICO (25)
Prob 4 — Provável	MODERADO (4)	MODERADO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	CRÍTICO (20)
Prob 3 — Possível	BAIXO (3)	MODERADO (6)	MODERADO (9)	MODERADO (12)	ALTO (15)
Prob 2 — Pouco Provável	BAIXO (2)	BAIXO (4)	MODERADO (6)	MODERADO (8)	MODERADO (10)
Prob 1 — Rara	IRRELEVANTE (1)	BAIXO (2)	BAIXO (3)	BAIXO (4)	MODERADO (5)

10.3 NÍVEL DE RISCO E AÇÕES REQUERIDAS (NR-01 SUBITEM 1.5.5.1)

NÍVEL DE RISCO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO REQUERIDA
IRRELEVANTE	1	Aceitável	Manter controles existentes.
BAIXO	2, 3, 4*	Aceitável	Melhorias de baixo custo quando possível; verificar que controles estão mantidos.
MODERADO	4*, 5, 6, 8, 9, 10*, 12*	Atenção	Elaborar Plano de Ação com prazo definido; implementar controles adicionais em prazo razoável.
ALTO	10*, 12*, 15, 16	Urgente	Não iniciar a atividade sem controles adequados. Plano de Ação imediato com prazo curto.
CRÍTICO	20, 25	PARALISAÇÃO	PARALISAR a atividade IMEDIATAMENTE. Implementar controles eficazes antes de qualquer reinício.

★ **Nota (*):** Devido à assimetria da matriz, produtos 4, 10 e 12 possuem classificações distintas conforme a origem P×S — verificar diretamente na Matriz 10.2. NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam documentados. Esta seção constitui o registro formal dos critérios adotados pelo GRO desta organização.

11. CONTROLE DOS RISCOS — HIERARQUIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção devem seguir obrigatoriamente a hierarquia estabelecida na NR-01 subitem 1.5.5.1.2. O EPI é **sempre o último recurso** e deve ser justificado quando EPCs são inviáveis ou insuficientes.

ORDEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EXEMPLO — CANTEIRO DE OBRAS
1ª	Eliminação	Remover completamente o perigo do processo produtivo	Eliminar etapa com exposição a agente cancerígeno; suprimir subida em andaime redesenhando o processo

2ª	Substituição	Substituir por agente, processo ou equipamento menos perigoso	Trocar produto químico por similar menos tóxico; substituir corte manual por equipamento mecanizado
3ª	Controles de Engenharia (EPC)	Barreiras físicas, enclausuramento, ventilação localizada, isolamento da fonte	Proteções em máquinas NR-12; linhas de vida fixas (NR-35); aspiração localizada; guarda-corpos
4ª	Controles Administrativos	Procedimentos, treinamentos, rodízio de postos, sinalização, limitação de tempo de exposição	DDS diário; NR-35 AR/PT; procedimento LOTO (NR-12); rotação de postos; 5S no canteiro
5ª	EPI — Último Recurso	Proteção individual complementar ou emergencial — apenas quando EPCs são inviáveis ou insuficientes	Capacete, cinturão tipo paraquedista, respirador (CA válido — NR-06); protetor auricular conforme dosimetria

12. AEP E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS (FRPRT)

12.1 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 ART. 17.3.1.2

ÁREA DE AVALIAÇÃO	ASPECTOS VERIFICADOS	RESULTADO ESPERADO
1. Organização do trabalho	Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia	Identificação de sobrecarga e fatores psicossociais
2. Condições ambientais	Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar	Subsídio para avaliação dos riscos físicos
3. Posto de trabalho e equipamentos	Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador	Identificação de inadequações posturais
4. Carga mental / cognitiva	Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia	Avaliação da carga cognitiva e mental
5. FRPRT	Suporte social, assédio, insegurança, conflitos de papel	Obrigatório a partir de 26/05/2026 — NR-01/NR-17

12.2 FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

⚠ A partir de **26/05/2026**, a organização deve avaliar e gerenciar os FRPRT no âmbito do GRO, conforme NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17 e Guia de Riscos Psicossociais MTE (abril/2025).

FATOR PSICOSSOCIAL (FRPRT)	DESCRIÇÃO / COMO AVALIAR	INSTRUMENTO SUGERIDO
Sobrecarga de trabalho	Excesso de demandas, jornadas extensas, pressão por produtividade	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Falta de autonomia e controle	Pouco controle sobre o próprio trabalho, supervisão excessivamente rígida	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Suporte social insuficiente	Baixo suporte de colegas e liderança; isolamento	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Assédio moral / sexual	Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Insegurança no trabalho	Medo de demissão, instabilidade contratual, incerteza sobre o futuro	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS

Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
-----------------------------------	--	---

12.3 AET — QUANDO NECESSÁRIA

Quando a AEP identificar riscos ergonômicos (incluindo FRPRT) com classificação **Moderado ou superior**, a organização deverá contratar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado, conforme NR-17 item 17.3.1.3.

13. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR-12)

MÁQUINA / EQUIPAMENTO	LOCAL	PROTEÇÕES NR-12 (EPC)	DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	LOTO
Betoneira		Proteção da coroa dentada; botão de parada de emergência; proteção dos pontos de aprisionamento	Manual; registro de manutenção preventiva; treinamento do operador	Procedimento de cadeamento e bloqueio
Serra Circular de Bancada		Protetor superior regulável; divisor de corte; empurrador; capuz de aspiração	NR-12 Checklist; CA dos EPIs; dossiê NR-18	Procedimento de desligamento antes de manutenção
Grua / Guincho		Limitadores de carga e de curso; proteção da cabine; dispositivo anticaída do cabo	Certificado ART; inspeção periódica; treinamento operador e sinaleiro	Procedimento de isolamento para manutenção
Elevador de Obra (Cremalheira)		Trava de segurança; portas nas paradas; limitador de carga e velocidade; para-choque	ART de instalação; inspeção mensal; dossiê NR-18; SPDA	Procedimento de bloqueio de manutenção

★ NR-12 item 12.135: o procedimento LOTO é obrigatório para todas as máquinas que requeiram manutenção com energias residuais. O dossiê por máquina deve ser mantido atualizado no canteiro.

14. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E EXERCÍCIOS SIMULADOS

14.1 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADOS

CENÁRIO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
Queda de Altura	Média	Primeiros socorros; SAMU 192; isolamento da área; comunicação ao SST; AR/análise de causas	Técnico SST / Encarregado
Incêndio / Explosão	Baixa-Média	Extinção com extintores adequados; abandono; ponto de encontro; CBMGO 193; brigada	Brigada de Incêndio
Soterramento	Baixa	Paralisação imediata; resgate especializado; CBMGO 193; não mover a vítima sem orientação	Encarregado / SST / CBMGO
Choque Elétrico	Baixa	Desligar energia (LOTO); PCR se necessário; SAMU 192; afastar vítima com material isolante	Eletricista NR-10 / SST

Acidente com Máquinas	Baixa–Média	Desligar equipamento; primeiros socorros; SAMU 192; preservar cena; emitir CAT	Operador / Encarregado / SST
Acidente Ampliado / Grande Magnitude	Muito Baixa	Plano de Emergências de Grande Magnitude (subitem 1.5.5.6.2); acionamento de Defesa Civil; comunicação ao MTE	SST / Engenheiro / Diretoria

14.2 BRIGADA DE INCÊNDIO — CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS (NR-23 / IT-17 CBMGO)

A Brigada de Incêndio é obrigatória nos canteiros de obras em conformidade com a NR-23 e com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (IT-17 CBMGO). Sua constituição, treinamento e manutenção são responsabilidade do empregador, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Dimensionamento:** mínimo de [X] brigadistas, calculado conforme o número de trabalhadores por turno e o risco de incêndio do canteiro, observando a IT-17 CBMGO e a NR-23;
- **Treinamento teórico-prático:** carga horária mínima conforme IT-17 CBMGO, incluindo: prevenção e combate a incêndio com extintores portáteis, abandono de área, primeiros socorros básicos (RCP e DEA), e comunicação de emergência;
- **Periodicidade de reciclagem:** anual, ou sempre que houver renovação de mais de 50% dos brigadistas ou mudança de fase construtiva que altere o perfil de risco;
- **Registros obrigatórios:** lista de presença dos treinamentos, certificados individuais, designação formal dos brigadistas (portaria ou ato equivalente) e escala de cobertura por turno;
- **Equipamentos da brigada:** mapa de localização dos extintores, mangueiras e hidrantes (se houver), kit de primeiros socorros, rádio comunicador e dispositivo de alarme sonoro;
- **Ponto de encontro:** definir e sinalizar, no canteiro, o ponto de encontro para reunião dos trabalhadores após abandono de área, com distância segura da edificação.

⚠ A ausência de Brigada de Incêndio constituída e treinada configura não conformidade com a NR-23 e pode resultar em autuação fiscal.

14.3 DOCUMENTAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	REGISTRO
Exercício Simulado (OBRIGATÓRIO)	Simulação de abandono e/ou emergência médica com avaliação de desempenho	Anual (mínimo) — NR-01 subitem 1.5.5.6.3	Relatório de exercício simulado assinado
Treinamento da Brigada	Primeiros socorros, combate a incêndio conforme CBMGO	Anual / conforme CBMGO	Lista de presença; certificado
Inspeção de Equipamentos de Emergência	Extintores, macas, kits de primeiros socorros	Mensal	Checklist de inspeção assinado
Atualização do Quadro de Emergências	SAMU 192, CBMGO 193, hospital de referência	Semestral	Quadro fixado em local visível no canteiro
Plano de Grande Magnitude	Eventos com potencial de múltiplas vítimas ou grandes perdas	Revisão anual	Documento aprovado; ART (se aplicável)

15. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

O procedimento abaixo estabelece as 7 etapas obrigatórias para investigação de acidentes de trabalho, incidentes (quase-acidentes) e doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.5.5. O procedimento deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores e da CIPA, e deve estar afixado no canteiro em local de fácil acesso. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

#	ETAPA	DETALHAMENTO E RESPONSÁVEL
1	Notificação Imediata	Comunicar ao Técnico de SST e responsável da obra imediatamente após o evento. Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 1 dia útil para acidentes com afastamento ou óbito (Lei n.º 8.213/91, art. 22). Para quase-acidentes, preencher o Registro de Quase-Acidente (Near Miss) no mesmo dia. <i>Responsável: Encarregado / Técnico de SST.</i>
2	Preservação da Cena	Não alterar o local do acidente até a realização da análise inicial pelo Técnico de SST, salvo risco imediato de novos acidentes ou necessidade de atendimento médico de urgência . Realizar registro fotográfico e croqui da cena o mais rapidamente possível. <i>Responsável: Encarregado / SST.</i>
3	Coleta de Dados e Evidências	Contextualização completa do cenário; coleta de depoimentos da vítima (quando possível), preposto e testemunhas — preferencialmente de forma independente. Levantamento de Análises de Risco (ARs), Permissões de Trabalho (PTTs), fichas de entrega de EPI, registros de treinamento, histórico de manutenção de equipamentos e ordens de serviço. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
4	Análise de Causa Raiz	Aplicar o método dos 5 Porquês para causas diretas e o Diagrama de Ishikawa (Causa-Efeito) para mapeamento sistêmico. Identificar e documentar: (a) causas imediatas — ato inseguro ou condição insegura que diretamente causou o evento; (b) causas básicas — fatores pessoais ou de trabalho que geraram as causas imediatas; (c) causa raiz — falha sistêmica de gestão ou processo que originou toda a cadeia causal. <i>Responsável: Técnico de SST</i>
5	Elaboração do Relatório de Investigação	Redigir Relatório de Investigação de Acidente (RIA) contendo: descrição cronológica do evento, caracterização da vítima e do posto de trabalho, evidências coletadas, árvore de causas, diagrama de Ishikawa, avaliação das medidas de prevenção existentes e sua eficácia, conclusão sobre a causa raiz identificada. O RIA deve ser assinado pelo Técnico de SST e pelo Engenheiro de Segurança. <i>Responsável: Técnico de SST</i>
6	Plano de Ação Corretivo	Elaborar ações corretivas e preventivas para eliminar ou controlar as causas identificadas, seguindo a hierarquia de medidas de prevenção da Seção 11. Cada ação deve ser inserida no Plano de Ação do PGR (Seção 17) com: descrição da ação, responsável, prazo de implementação e indicador de verificação. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra.</i>
7	Revisão do PGR e Comunicação	Rever obrigatoriamente o Inventário de Riscos e as medidas de prevenção afetadas pelo evento (gatilho NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea d). Comunicar os resultados da investigação, as causas identificadas e as ações corretivas adotadas a todos os trabalhadores que atuem em atividades similares, preferencialmente em DDS específico, com lista de presença. Encaminhar cópia do RIA à CIPA. <i>Responsável: Técnico de SST</i>

★ Todos os registros de acidentes, incidentes e relatórios de investigação devem ser arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos e devem estar disponíveis para auditoria do MTE a qualquer tempo. A comunicação do acidente ao eSocial (evento S-2210) deve ser feita no prazo legal.

16. INDICADORES DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO EM SST

16.1 INDICADORES PROATIVOS (PREVENÇÃO)

INDICADOR	FÓRMULA / CÁLCULO	META	FREQUÊNCIA
Taxa de conclusão do Plano de Ação	$(\text{Ações concluídas} / \text{Total de ações}) \times 100$	$\geq 80 \%$	Mensal
Cobertura de DDS realizados	$(\text{DDS realizados} / \text{DDS programados}) \times 100$	$\geq 95 \%$	Mensal
Treinamentos em SST concluídos	$(\text{Trabalhadores treinados} / \text{Total expostos}) \times 100$	100 %	Trimestral
Inspeções de segurança realizadas	$(\text{Inspeções realizadas} / \text{Programadas}) \times 100$	100 %	Semanal
Ações corretivas atendidas	$(\text{Ações corrigidas} / \text{Não conformidades abertas}) \times 100$	$\geq 90 \%$	Mensal
EPIs entregues com recibo	$(\text{EPIs com recibo} / \text{Total EPIs entregues}) \times 100$	100 %	Contínuo
Exercícios simulados realizados	Nº realizados / Nº programados	100 % (mín. 1/ano)	Anual

16.2 INDICADORES REATIVOS (HISTÓRICO DE EVENTOS)

INDICADOR	FÓRMULA	META	FREQUÊNCIA
Taxa de Frequência de Acidentes (TF)	$(\text{Nº acidentes com afastamento} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Gravidade (TG)	$(\text{Dias perdidos} + \text{debitados} \times 1.000.000) / \text{HH trabalhadas}$	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Incidência de Doenças Ocupacionais	$(\text{Nº casos} \times 1.000) / \text{Nº trabalhadores}$	Tendência decrescente	Semestral
Quase-acidentes (near miss)	Número absoluto de quase-acidentes reportados	Tendência crescente (cultura de reporte)	Mensal
Absenteísmo por causas ocupacionais	$(\text{Dias afastamento ocup.} / \text{Dias totais trabalhados}) \times 100$	$< 2 \%$	Mensal
Índice de Gravidade de DORT/LER	Casos confirmados por 100 trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

Os indicadores, fórmulas e metas apresentados nesta seção **não têm caráter obrigatório** e representam exclusivamente uma **sugestão técnica** fundamentada nas boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). A empresa contratante **não está obrigada a segui-los**, podendo adotar indicadores distintos, redefinir metas, alterar frequências ou substituir este conjunto por metodologia própria, conforme sua realidade organizacional. O único requisito legal aplicável é o monitoramento mínimo do GRO previsto na **NR-01 (subitem 1.5.7)**. A adoção de um sistema estruturado de indicadores é fortemente recomendada como boa prática de gestão, mas a escolha dos instrumentos é prerrogativa exclusiva da organização.

17. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS DE PREVENÇÃO (5W2H)

Este Plano de Ação consolida as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, vinculadas ao Inventário de Riscos (Anexo I), em conformidade com a NR-01 subitem 1.5.6.1, alínea "b". Adota-se a abordagem **PDCA (Plan, Do, Check and Act)**, largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional.

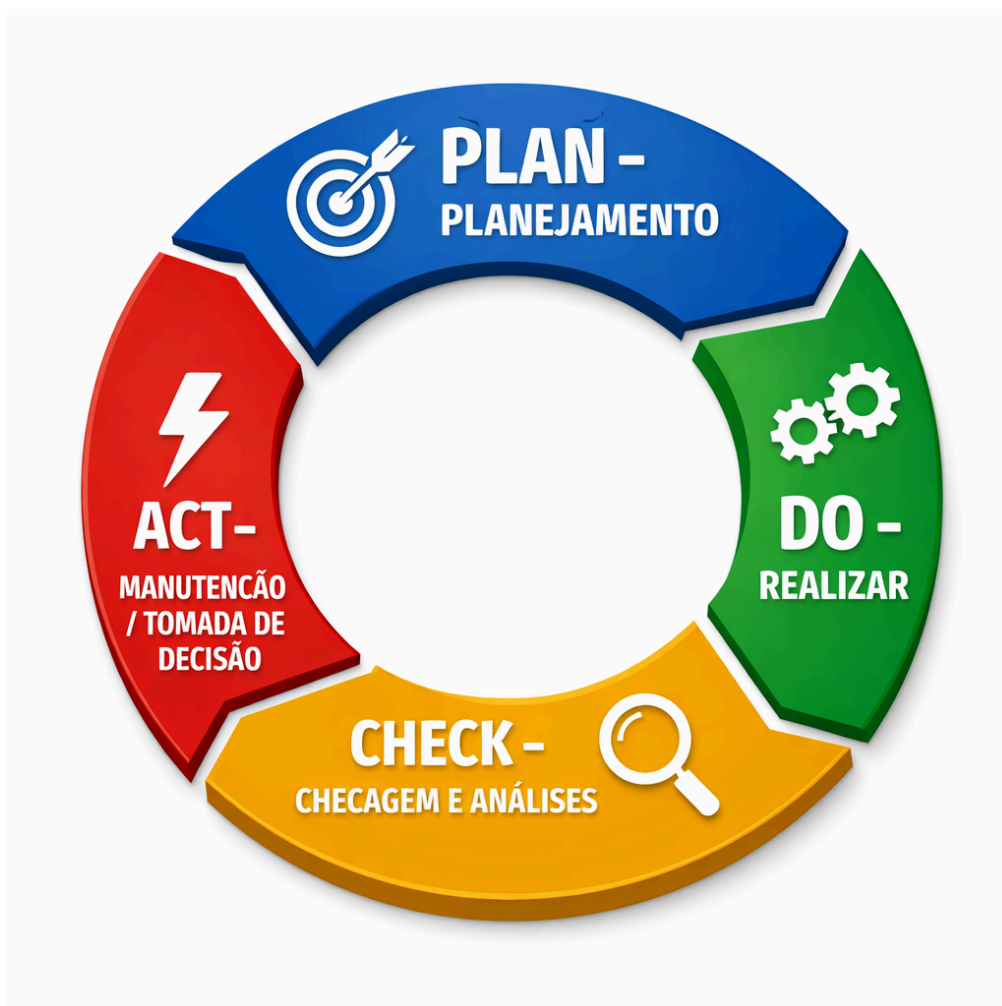


Figura: Metodologia PDCA aplicada ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

17.1 PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS POR GHE / RISCO (METODOLOGIA PDCA)

SELECIONE A FASE DA OBRA: FASE ESTRUTURAL * Filtra as ações recomendadas para cada etapa.

PRAZO INÍCIO / FINAL	AÇÃO / PERIGO	PLAN (PLANEJAR)	DO (REALIZAR)	CHECK (CHECAR)	ACT (MANUTENÇÃO)	STATUS
__/__/__	ATUALIZAÇÃO DO INVENTÁRIO DE RISCO	Levantamento preliminar de perigos específicos para atividades de pintura, revestimento e gesso.	Atualizar o Inventário classificando severidade e probabilidade de novas exposições.	Verificar se o novo inventário contempla todos os GHEs.	Ajustar as medidas de prevenção no PGR caso o nível de risco seja Moderado ou superior.	
__/__/__	GESTÃO DE PRODUTOS QUÍMICOS	Listar todos os acabamentos e coletar suas Fichas de Dados de Segurança (FDS/FISPQ).	Implementar rotulagem preventiva e segregar inflamáveis em local ventilado.	Inspeção diária no almoxarifado para verificar estocagem e compatibilidade.	Aplicar medidas administrativas se houver falta de identificação ou organização.	
__/__/__						
__/__/__	ATUALIZAÇÃO DA ERGONOMIA (AEP)	Verificar se a transição introduziu modificações nos processos ou organização.	Proceder com a atualização da AEP ou elaboração de adendos específicos.	Avaliar se o Inventário por GHE permanece eficaz e se há novas queixas.	Manter validade da documentação ou adequar postos de trabalho.	
__/__/__						
__/__/__	PROTEÇÃO EM ALTURA (TRANSIÇÃO)	Planejar transição das proteções coletivas para as definitivas ou temporárias.	Executar instalação rigorosa garantindo que nenhum vão fique desprotegido.	Verificar diariamente se a instalação das esquadrias deixa aberturas críticas.	Manter proteções atualizadas ou reforçar sistema temporário se houver atraso.	
__/__/__						
__/__/__	ORGANIZAÇÃO E LIMPEZA	Planejar rotina de limpeza para evitar acúmulo de entulho em corredores.	Manter os locais de acesso desobstruídos e sinalizados.	Inspeção diária da limpeza dos pavimentos.	Readequar layout de armazenamento ou reforçar orientação no DDS.	
__/__/__						
__/__/__	GESTÃO E DOSSIÊ DE TERCEIRIZADOS	Exigir que contratadas forneçam inventários de riscos para integração ao PGR.	Organizar dossiês individuais com treinamentos, EPIs e procedimentos.	Validar diariamente se os métodos respeitam as diretrizes de segurança.	Notificar gestão contratual ou paralisar atividade se houver descumprimento.	
__/__/__						
__/__/__	CONSULTAR TRABALHADORES (NR-01)	Verificar formulário e realizar de forma individual (NR 1.5.3.3).	Fornecer e realizar a consulta com o formulário.	Verificar as informações e gerar plano de ações se necessário.	Executar ações necessárias e continuar com novos colaboradores.	
__/__/__						
__/__/__	CONTROLE DE FERRAMENTAS MANUAIS	Analisar locais para uso em ambientes com iluminação e proteção umidade.	Manter dossiê atualizado e garantir dispositivos de segurança operacionais.	Realizar inspeções diárias para validar cabos, plugues e proteções.	Retirar de uso imediatamente qualquer ferramenta com falha ou improvisação.	
__/__/__						
__/__/__	ELÉTRICA PROVISÓRIA E ATERRAMENTO	Planejar distribuição para evitar sobrecargas e garantir aterramento.	Seguir execução conforme projeto, utilizando dispositivos DR nos quadros.	Verificar mensalmente o laudo de aterramento e mudanças de layout.	Manter execução conforme projeto e realizar novas medições se necessário.	
__/__/__						

__/_/____	ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES	Estabelecer metodologia focada em falhas nos processos e não em culpados.	Coletar evidências e realizar entrevistas técnicas com os envolvidos.	Verificar mensalmente o laudo de aterramento e mudanças de layout.	Analisar circunstâncias anormais para determinar a causa raiz do evento.	
__/_/____						
__/_/____	CONSULTAR TRABALHADORES (NR-01)	Verificar formulário e realizar de forma individual (NR 1.5.3.3).	Fornecer e realizar a consulta com o formulário.	Verificar as informações e gerar plano de ações se necessário.	Executar ações necessárias e continuar com novos colaboradores.	
__/_/____						
__/_/____	CONTROLE DE FERRAMENTAS MANUAIS	Analisar locais para uso em ambientes com iluminação e proteção umidade.	Manter dossiê atualizado e garantir dispositivos de segurança operacionais.	Realizar inspeções diárias para validar cabos, plugues e proteções.	Retirar de uso imediatamente qualquer ferramenta com falha ou improvisação.	
__/_/____						
__/_/____	ELÉTRICA PROVISÓRIA E ATERRAMENTO	Planejar distribuição para evitar sobrecargas e garantir aterramento.	Seguir execução conforme projeto, utilizando dispositivos DR nos quadros.	Verificar mensalmente o laudo de aterramento e mudanças de layout.	Manter execução conforme projeto e realizar novas medições se necessário.	
__/_/____						
__/_/____	ANÁLISE DE ACIDENTES E INCIDENTES	Estabelecer metodologia focada em falhas nos processos e não em culpados.	Coletar evidências e realizar entrevistas técnicas com os envolvidos.	Verificar mensalmente o laudo de aterramento e mudanças de layout.	Analisar circunstâncias anormais para determinar a causa raiz do evento.	
__/_/____						
__/_/____	ORGANIZAÇÃO DO ALMOXARIFADO	Planejar rotina de recebimento e estocagem identificável.	Manter materiais separados por pavimento e protegidos contra umidade.	Verificação diária para garantir que empilhamento respeita limites técnicos.	Ajustar layout sempre que novos volumes de materiais chegarem à obra.	
__/_/____						
__/_/____	GESTÃO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS	Definir metodologia de coleta sobre carga, pressão e relações.	Realizar consulta individual garantindo sigilo e sensibilizar equipe.	Analisar resultados para determinar nível de risco ocupacional.	Implementar medidas administrativas e atualizar Inventário e PCMSO.	
__/_/____						

★ **GESTÃO DINÂMICA POR FASES:** Este Plano de Ação está estruturado de forma evolutiva. Utilize o seletor acima para filtrar as ações recomendadas para a **Fase Inicial**, **Acabamento** ou **Final** da obra.

A equipe de SST e a CIPA devem revisar mensalmente o status das ações da fase ativa. Ao transitar entre fases, certifique-se de atualizar o Inventário de Riscos e validar as novas medidas de prevenção (ex: gestão de químicos no acabamento).

17.2 PLANO DE AÇÃO — GESTÃO DE INDICADORES E METAS

Abaixo, apresentam-se os indicadores sugeridos para o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção, conforme subitem 1.5.7 da NR-01.

17.3 AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO	FINALIDADE / OBRIGATORIEDADE	STATUS
LIP — Laudo de Insalubridade e Periculosidade	NR-15, NR-16, eSocial (evento S-2240) — obrigatório para trabalhadores com exposição a agentes insalubres ou perigosos	
LTCAT — Laudo Técnico das Condições do Ambiente	Fins previdenciários e eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos para aposentadoria especial	
ART — Anotação de Responsabilidade Técnica	Responsabilidade técnica do PGR (Anexo 01) — obrigatório quando elaborado por Engenheiro de Segurança	
Avaliações Quantitativas	Ruído (NHO-01), poeira, calor (NHO-06), vibração (NHO-09), iluminação — subsidiar LIP, LTCAT, PCMSO e Inventário	
PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário	INSS / eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos com potencial de aposentadoria especial	

17.4 CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

[illegible]

18. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TERCEIRIZADOS)

O Inventário de Riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) está integrado ao PGR do canteiro de obras, em conformidade com o disposto na NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As atividades, perigos e riscos identificados nos processos executados pelas contratadas foram incorporados ao Inventário de Riscos consolidado do estabelecimento, assegurando a gestão unificada de todos os agentes ocupacionais presentes no canteiro, independentemente do vínculo empregatício dos trabalhadores expostos.

Toda nova contratação de empresa prestadora de serviços deve acionar a revisão do Inventário de Riscos, configurando-se como gatilho obrigatório de Gestão de Mudanças, nos termos da NR-01, subitem 1.5.4.4.6, alínea "b" — que determina a reavaliação dos riscos sempre que houver mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho. A entrada de novos prestadores no canteiro pode introduzir perigos antes não mapeados, alterar os níveis de exposição existentes ou exigir medidas de prevenção adicionais, razão pela qual o processo de revisão deve ser conduzido previamente ao início das atividades da contratada.

Cabe à organização contratante:

- Exigir da prestadora de serviços a entrega do seu Inventário de Riscos específico, que será analisado e integrado ao PGR do canteiro;
- Verificar a compatibilidade entre os riscos declarados pela contratada e os riscos efetivamente presentes no ambiente do canteiro;
- Manter dossiê individual dos trabalhadores terceirizados com cópias de: ASO vigente, comprovantes de treinamentos obrigatórios (NRs aplicáveis), fichas de entrega de EPIs e habilitação para operação de máquinas e equipamentos;
- Verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria pela empresa terceirizada, conforme NR-05;
- Garantir que os trabalhadores terceirizados participem das ações de integração de SST do canteiro, incluindo DDS, treinamentos e exercícios simulados de emergência.

A organização contratante deve exigir da prestadora de serviços a entrega formal de seu Inventário de Riscos específico, que deve ser analisado e incorporado fisicamente aos anexos deste PGR para garantir a gestão unificada de riscos no canteiro.

★ A integração do Inventário de Riscos dos terceirizados ao PGR do canteiro é obrigatória e deve ser formalizada por meio de registro documental. A ausência de revisão do Inventário quando da contratação de novos prestadores configura descumprimento do processo de Gestão de Mudanças previsto na NR-01.

19. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS

A organização deve manter um processo contínuo de **Gestão de Mudanças**, assegurando que o Inventário de Riscos e o Plano de Ação sejam revisados sempre que ocorrerem alterações nas condições de trabalho. Em conformidade com o subitem 1.5.4.4.6 da NR-01 e as diretrizes da Inspeção do Trabalho (CANPAT), a revisão do PGR é obrigatória nos seguintes casos:

- **A) Implementação de Medidas de Prevenção:** Após a adoção de novos controles, para avaliar o risco residual;
- **B) Inovações ou Modificações:** Introdução de novas tecnologias, equipamentos, produtos químicos ou mudanças nos processos e organização do trabalho;
- **C) Inadequações ou Ineficácia:** Quando identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção existentes;
- **D) Acidentes ou Doenças:** Na ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho;
- **E) Mudanças Legais:** Quando houver alteração nos requisitos legais aplicáveis (normas regulamentadoras).

Independentemente dos critérios acima, a avaliação de riscos deve ser revista a cada **2 (dois) anos**, ou em até 3 (três) anos para organizações com sistema de gestão de SST certificado. Toda mudança significativa deve ser precedida de Análise de Risco (AR/APR) e registro no formulário de Gestão de Mudanças.

20. PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Seguir as 7 etapas da Seção 15 deste PGR. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos e devem estar disponíveis para auditoria a qualquer tempo. O procedimento deve ser comunicado a todos os trabalhadores e à CIPA (NR-01 subitem 1.5.5.5 / Manual GRO MTE 2025, seção 12.4). O acidente de trabalho deve ser notificado ao eSocial pelo evento S-2210 no prazo legal estabelecido.

Página 17 de 26

21. CIPA — COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) deve ser constituída conforme os requisitos da NR-05 e do Quadro I de dimensionamento, levando em conta o número de empregados e o Grau de Risco da atividade principal do estabelecimento. A CIPA é um órgão bipartite, composto por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pelo empregador.

21.1 CONSTITUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Dimensionamento:** conforme Quadro I da NR-05, com base no número total de empregados do estabelecimento e no Grau de Risco da atividade (CNAE), verificar o número de membros titulares e suplentes por parte do empregador e dos trabalhadores — [preencher após consulta ao Quadro I para o CNAE específico] ;
- **Mandato:** 1 (um) ano, com uma única reeleição permitida para os membros eleitos pelos trabalhadores;
- **Processo eleitoral:** organizado pelo empregador com prazo mínimo de 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, garantida a participação de todos os trabalhadores com registro no estabelecimento;
- **Obrigatoriedade de CIPA própria por terceirizadas:** empresas prestadoras de serviços instaladas em estabelecimentos de Grau de Risco 3 ou 4 devem verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria, conforme NR-05 item 5.6.

21.2 ATRIBUIÇÕES DA CIPA NO ÂMBITO DO GRO (NR-01 SUBITEM 1.4.2.B)

- Participar da identificação de perigos e da avaliação de riscos, fornecendo a percepção dos trabalhadores sobre as condições de trabalho no canteiro;
- Acompanhar a implementação e o monitoramento das medidas do Plano de Ação, verificando prazos e eficácia;
- Analisar acidentes e incidentes ocorridos no canteiro, emitindo recomendações e acompanhando as ações corretivas;

- Investigar e encaminhar denúncias de assédio moral e sexual, em conformidade com a nova denominação da comissão e com as disposições da Lei n.º 14.457/2022;
- Elaborar e manter atualizado o Mapa de Riscos do canteiro, como instrumento complementar de comunicação dos riscos aos trabalhadores;
- Solicitar a revisão justificada do Inventário de Riscos ou do PGR sempre que identificar condições de risco não contempladas ou medidas de prevenção ineficazes (NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea f).

21.3 PAUTA MÍNIMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Análise dos acidentes e incidentes ocorridos desde a última reunião;
- Acompanhamento do Plano de Ação do PGR — verificação do status de cada ação;
- Análise de denúncias de assédio e condições de risco reportadas pelos trabalhadores;
- Verificação dos indicadores de SST da Seção 16;
- Definição de assuntos a tratar na próxima reunião e atribuição de responsabilidades.

★ As atas de reunião da CIPA constituem evidência documental obrigatória do funcionamento do GRO e devem ser assinadas por todos os membros presentes, arquivadas por no mínimo 5 anos e disponibilizadas ao MTE quando solicitado.

22. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR-26)

Manter relação atualizada de todos os produtos químicos utilizados com as respectivas FDS (Fichas com Dados de Segurança — NR-26). O inventário completo de produtos químicos deve ser integrado ao Inventário de Riscos do PGR. Os trabalhadores devem ser treinados sobre os riscos e as medidas de controle de cada produto utilizado, com registro em lista de presença.

As FDS de todos os produtos químicos devem estar disponíveis no local de trabalho, em idioma português, em local de fácil acesso e conhecimento pelos trabalhadores, conforme NR-26 item 26.4. A rotulagem dos produtos deve estar em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). Produtos químicos cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução devem receber atenção prioritária no Inventário de Riscos, com adoção de medidas de controle na ordem hierárquica da Seção 11.

23. COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES (NR-01 subitem 1.5.1)

A organização deve assegurar que todos os trabalhadores — próprios, terceirizados e estagiários — sejam informados sobre os riscos identificados no Inventário de Riscos referentes às suas atividades, bem como sobre as medidas de prevenção adotadas e os procedimentos de emergência vigentes, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.1 e subitem 1.4.2, alínea "c".

23.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES

Todo trabalhador admitido — próprio ou terceirizado — deve passar por integração de SST antes de iniciar suas atividades no canteiro. A integração deve abordar, no mínimo:

- Apresentação do PGR: estrutura, objetivos e como acessá-lo;
- Riscos identificados para a função/GHE do trabalhador, conforme Inventário de Riscos;
- Medidas de prevenção em vigor: EPCs disponíveis, procedimentos de trabalho seguro e EPIs obrigatórios para cada atividade;
- Procedimentos de emergência: cenários identificados na Seção 14, pontos de encontro, números de emergência e atribuições da brigada;
- Direitos do trabalhador: recusa de atividade em risco grave e iminente (NR-01 subitem 1.4.4.1); canais para comunicação de riscos e solicitação de revisão do PGR;

- Procedimento para registro de quase-acidentes (near miss).

★ A integração deve ser documentada com lista de presença assinada pelo trabalhador, data e conteúdo abordado. Cópia deve ser arquivada no dossiê do trabalhador e no prontuário de SST do canteiro.

23.2 CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR NR

TREINAMENTO	NORMA	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	PERIODICIDADE DE RECICLAGEM	TRABALHADORES-ALVO
Integração de SST / GRO	NR-01 subitem 1.5.1	4 h	Admissão; retorno após afastamento > 30 dias	Todos
EPI — Uso, Guarda e Conservação	NR-06	2 h	Anual	Todos
Saúde e Segurança na Construção Civil	NR-18	6 h	Anual	Todos do canteiro
Trabalho em Altura	NR-35	8 h (básico)	A cada 2 anos	Trabalhadores em altura ≥ 2 m
Eletricidade — Segurança	NR-10	40 h (básico)	A cada 2 anos	Eletricistas / expostos
Máquinas e Equipamentos	NR-12	Conforme risco	Mudança de Risco / equipamento	Operadores
Brigada de Incêndio	NR-23 / IT-17 CBMGO	Conforme IT-17	Anual	Brigadistas designados
Espaço Confinado	NR-33	16 h (supervisor/vigia)	Anual	Quando aplicável
Ergonomia e FRPRT	NR-17 / NR-01	4 h	Anual — obrigatório a partir de 26/05/2026	Todos
CIPA — Formação de Cipeiros	NR-05	20 h	A cada mandato (1 ano)	Membros da CIPA

23.3 DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS)

O DDS deve ser realizado diariamente, no início de cada turno de trabalho, com duração mínima de 5 a 10 minutos. Cada DDS deve abordar temas relevantes ao trabalho do dia, com foco nos riscos do Inventário de Riscos e nas medidas de prevenção. O registro do DDS deve conter: data, tema abordado, nome do condutor e lista de presença assinada por todos os trabalhadores presentes. Os registros devem ser arquivados por no mínimo 2 anos.

24. eSocial — OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO GRO

O eSocial é o sistema de registro digital de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias instituído pelo Governo Federal, e constitui o principal mecanismo de fiscalização eletrônica do cumprimento das obrigações do GRO pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Receita Federal. As informações do PGR e do PCMSO devem ser registradas no eSocial nos seguintes eventos obrigatórios:

EVENTO ESOCIAL	CONTEÚDO	PRAZO / PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
S-2220 — Monitoramento da Saúde do Trabalhador	Registro dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) emitidos pelo médico do PCMSO: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	Até o dia 15 do mês subsequente ao do evento	Médico Responsavel pelo PCMSO / RH
S-2240 — Condições Ambientais do Trabalho	Registro dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, com base no Inventário de Riscos e no LIP/LTCAT: agente, intensidade, técnica utilizada, limite de tolerância e EPC/EPI utilizados	Antes do início da exposição; atualizar em até 15 dias após qualquer alteração	SST
S-2210 — Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)	Registro de qualquer acidente ou doença do trabalho, independentemente de haver afastamento ou de sua duração	Até o 1º dia útil após o acidente; em caso de óbito: imediatamente	Empregador / RH / SST

⚠ O não preenchimento ou preenchimento incorreto do evento S-2240 configura descumprimento das obrigações acessórias do eSocial e pode resultar em multas administrativas e impactar a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador. A consistência entre o Inventário de Riscos do PGR e os dados enviados ao S-2240 deve ser verificada a cada revisão do PGR.

25. PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL PELO PGR

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira

Engenheiro de Segurança do Trabalho

SECONCI GOIÁS

CREA: 101672344 D-GO

Mariana de Jesus Souza Ribeiro

Responsável pela Implementação do PGR — Cliente

LOCAL E DATA

Goiâni-GO , 25 de Junho de 2026.

26. ANEXO I — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo existente no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

GHE 01 - ENGENHARIA/PRODUÇÃO

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Auxiliar de Engenharia, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Estagiário de Engenharia
Qt. Trabalhadores	04
Descrição das Atividades	Acompanham o andamento e a qualidade dos serviços utilizando procedimentos de execução e inspeção. Gerenciam obras, controlam a qualidade dos empreendimentos. Coordenam a operação, manutenção e planejamento. Supervisionam serviços elétricos, projetam sistemas e elaboram documentação técnica.
Local de Trabalho	Canteiro de obras e salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação e ventilação natural e artificial.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Pausas durante a execução das atividades	Obrigatórios: Capacete de proteção, Calçado de segurança Eventuais: Protetor auricular, Óculos de proteção, Cinto de segurança	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Materiais jogados e Falta de atenção	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	4	1	BAIXO (4)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Obrigatórios: Capacete de proteção, Calçado de segurança Eventuais: Protetor auricular, Óculos de proteção, Cinto de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	1	BAIXO (4)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco -- CA aprovado MTE (NR-06)	
Físico	Ruído	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Obrigatórios: Capacete de proteção, Calçado de segurança Eventuais: Protetor auricular, Óculos de proteção, Cinto de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 02 - ADMINISTRAÇÃO/PRODUÇÃO

Cargo / Função	Encarregado de Armação, Encarregado de Hidráulica, Encarregado de Elétrica, Encarregado de Carpintaria, Encarregado de Obras, Encarregado de Instalações, Encarregado de Pintor, Encarregado de Pedreiro, Encarregado de Pedreiro Jr.
Qt. Trabalhadores	09
Descrição das Atividades	Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais e equipes). Controlam padrões produtivos como inspeção de qualidade dos materiais, orientação sobre medidas de segurança e administram o cronograma da obra.
Local de Trabalho	Parede alvenaria e compensado, ventilação artificial e natural, iluminação artificial.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Transitar pela obra para verificar as frentes de trabalho	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Pausas durante a execução das atividades	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Materiais jogados e Falta de atenção	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	4	1	BAIXO (4)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	1	BAIXO (4)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	

Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
Físico	Ruído	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 03 - ADMINISTRAÇÃO

Cargo / Função	Encarregado Administrativo de Obras, Auxiliar Administrativo de Obras, Assistente Administrativo de Obras, Apontador, Jovem Aprendiz
Qt. Trabalhadores	05
Descrição das Atividades	Supervisionam rotinas administrativas, controlam pessoal e recebem documentos para pagamento e controle de estocagem. Controlam documentos de contratação, notas fiscais, treinamentos de integração e cartões de ponto. Realizam levantamentos de mão de obra, distribuem ordens de serviço e acompanham medição.
Local de Trabalho	Salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação e ventilação natural e artificial.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Pausas durante a execução das atividades	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	1	IRRELEVANTE (1)	Manter área de circulação livre de obstáculos, áreas de limpeza devem ser sinalizadas	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 04 - ADMINISTRAÇÃO/ALMOXARIFADO

Cargo / Função	Almoxarife, Auxiliar de Almoxarife, Ferramenteiro
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.
Local de Trabalho	Tenda revestida com compensado, piso em concreto, iluminação e ventilação natural e artificial.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Postura incorreta de trabalho, mobiliário inadequado	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Pausas durante a execução das atividades	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Postura incorreta de trabalho	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Manter postura correta ao levantar material	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar SPIQ e SPCQ adequado para a atividade	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	1	1	IRRELEVANTE (1)	Manter área de circulação livre de obstáculos, áreas de limpeza devem ser sinalizadas	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	

Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
-----------	--	--------------------------------------	---	---	---	------------------------	---	---	--

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 05 - ELÉTRICA/PRODUÇÃO

Cargo / Função	Eletricista, Meio Oficial de Eletricista, Servente
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Fazem leitura de projeto, instalam dutos, tubulações, caixas e quadros de distribuição de circuitos. Testam as instalações elétricas, passam cabos para-raios e zelam pela limpeza das instalações. Auxiliam no carregamento e descarga de materiais e demais atividades do canteiro.
Local de Trabalho	Canteiro de obras.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Físico	Ruído	Utilização de furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a máquinas ruidosas	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Ergonômico	Postural	Postura incorreta de trabalho durante execução das atividades	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	1	2	BAIXO (2)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Exigência de elevação frequente de membros superiores durante execução das atividades	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	1	2	BAIXO (2)	Pausas durante a execução das atividades	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Químico	Sílica Livre — Poeira respirável	Corte de paredes	Problemas nas vias respiratórias	2	2	BAIXO (4)	Uso de respiradores apropriados para a atividade		
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	2	BAIXO (4)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
Acidentes	Choque Elétrico	No uso de extensões, furadeiras, geradores e outros equipamentos energizados	Queimaduras cutâneas, lesões a órgãos internos e outros tecidos, arritmias e parada respiratória	3	2	MODERADO (6)	Utilizar equipamentos adequados, não realizar manutenções com equipamentos energizados		
Acidentes	Queda de materiais	Quedas de mesmo nível com impacto em objetos na obra	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Capacete de segurança	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras no canteiro de obras.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 06 - CARPINTARIA/PRODUÇÃO

Cargo / Função	Carpinteiro, Meio Oficial de Carpinteiro, Servente
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Planejam e executam trabalhos de carpintaria, montam e desmontam fôrmas de madeira, andaimes e proteções coletivas. Constroem portas e esquadrias. Auxiliam no processo de concretagem verificando as situações das formas de pilares, vigas e laje.
Local de Trabalho	Central de carpintaria e canteiro de obras.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Postura incorreta de trabalho durante execução das atividades	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	1	2	BAIXO (2)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais de manutenção de máquinas e equipamentos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Acidentes	Máquinas e equipamentos (Furadeira, Martelo, e etc..)	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	2	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
Físico	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	2	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
Físico	Ruído	Durante a operação de bancada, furadeiras e serras elétricas e batidas de martelos	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	3	2	MODERADO (6)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Corte e esmerilhamento de vergalhões; poeiras do processo produtivo	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	2	2	BAIXO (4)	Avaliação qualitativa realizada; quantitativa prevista	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
Químico	Pó de madeira	Corte de madeira utilizando serra circular manual e de mesa	Danos nos pulmões e nas vias respiratórias	2	1	BAIXO (2)	Realizar corte em locais abertos e com ventilação, utilizar respirador adequado para a atividade		

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 07 - PRODUÇÃO/OBRA

Cargo / Função	Pedreiro, Meio Oficial de Pedreiro, Servente
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Organizam e preparam o local de trabalho, constroem fundações e estruturas de alvenaria, aplicam revestimentos e contra pisos. Auxiliam na limpeza geral do canteiro, no carregamento de materiais e no processo de concretagem operando o vibrador de concreto.
Local de Trabalho	Canteiro de obras.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Transitar pela obra para verificar as frentes de trabalho	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	3	MODERADO (6)	Pausas durante a execução das atividades	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Posição de trabalho, carregamento de pesos, giricas	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	3	MODERADO (9)	Manter postura, realizar pausas durante atividade	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas e escoriações	2	1	BAIXO (2)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de acompanhamento de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Acidentes	Queda de materiais	Quedas de mesmo nível com impacto em objetos na obra	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Capacete de segurança	
Físico	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	2	1	BAIXO (2)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
Físico	Ruído	Utilização de furadeiras, marteleiros, geradores ou em trabalhos executados próximo a máquinas ruidosas	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	2	BAIXO (4)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Químico	Sílica livre — Poeira respirável	Corte de blocos cerâmicos, limpeza de obra	Danos nas vias respiratórias	2	2	BAIXO (4)	Umidificar os locais de varrição, utilizar respirador apropriado para a atividade		
Químico	Cimento portland	Corte de blocos cerâmicos, limpeza de obra	Danos nas vias respiratórias	2	2	BAIXO (4)	Umidificar os locais de varrição, utilizar respirador apropriado para a atividade	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 08 - CENTRAL DE ARGAMASSA

Cargo / Função	Operador de Betoneira, Servente
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Programam a produção e o fornecimento de concreto e misturam seus agregados. Preparam o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. Descarregam e bombeiam o concreto. Auxiliam no carregamento de materiais e demais atividades do canteiro.
Local de Trabalho	Ambiente coberto de tenda com iluminação natural e artificial.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Utilização de pás e enxadas, e operação da betoneira	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	1	2	BAIXO (2)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	2	MODERADO (6)	Comunicação com o operador, manutenção preventiva no moitão, cintas, cabos e demais necessários para os equipamentos de içamentos	Capacete de segurança	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves, como a transmissão de vírus.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

Acidentes	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e (Furadeira, lixadeira, pistola de pintura a ar comprimido)	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
Físico	Ruído	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Químico	Sílica Livre — Poeira Respirável	Manipulação de areia, cimento e brita durante preparação de argamassa	Danos nas vias respiratórias	3	2	MODERADO (6)	Manter local com ventilação natural ou artificial, utilizar respirador apropriado para a atividade		
Químico	Cimento portland	Manipulação de areia, cimento e brita durante preparação de argamassa	Danos nas vias respiratórias	2	1	BAIXO (2)	Manter local com ventilação natural ou artificial, utilizar respirador apropriado para a atividade	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 09 - ARMAÇÃO/PRODUÇÃO

Cargo / Função	Armador, Meio Oficial de Armador, Servente
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Preparam a confecção de armações e estruturas de concreto. Cortam e dobram ferragens de lajes. Auxiliam na limpeza geral do canteiro, no carregamento e descarga de materiais e demais atividades. (Não utilizam Policorte)
Local de Trabalho	Centrais de armação e canteiro de obras.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Amarração de ferragens de vigas, pilares e laje	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	2	BAIXO (4)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
Acidentes	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e (Furadeira, lixadeira, pistola de pintura a ar comprimido)	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Corte e esmerilhamento de vergalhões; poeiras do processo produtivo	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	2	2	BAIXO (4)	Avaliação qualitativa realizada; quantitativa prevista	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
Físico	Ruído	Uso de lixadeiras e furadeiras	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	2	2	BAIXO (4)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5x5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 10 - SESMT E MEIO AMBIENTE

Cargo / Função	Assistente de Gestão Ambiental, Técnico em Segurança do Trabalho, Assistente de Segurança do Trabalho, Estagiário de Segurança do Trabalho
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Auxiliam na manutenção e melhoria do SGQ nos aspectos ambientais. Elaboram e implementam a política de saúde e segurança no trabalho. Identificam variáveis de controle de doenças, acidentes e qualidade de vida. Gerenciam documentação de SST e participam da investigação e análise de acidentes.
Local de Trabalho	Salas administrativas em alvenaria ou compensados com iluminação natural e artificial.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	2	1	BAIXO (2)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável -- AET, ginástica laboral, pausas	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Materiais jogados e Falta de atenção	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	3	1	BAIXO (3)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	1	BAIXO (4)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	2	MODERADO (6)	Comunicação com o operador, manutenção preventiva no moitão, cintas, cabos e demais necessários para os equipamentos de içamentos	Capacete de segurança	
Acidentes	Quedas de objetos	Falta de equipamentos apropriados contra quedas de materiais	Perfurações, contusões diversas, traumatismo e mortes	2	2	BAIXO (4)	SLQA, tela piso a piso, bandejas e isolamentos de áreas		

Acidentes	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves, como a transmissão de vírus.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
Físico	Ruído	Furadeiras, compactadores, rompedores e batidas de martelos, vibradores de concreto, caminhões betoneira e bomba	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	2	BAIXO (4)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Corte e esmerilhamento de vergalhões; poeiras do processo produtivo	Chiado no peito, falta de ar, tosse; comprometimento das vias respiratórias superiores e inferiores	2	2	BAIXO (4)	Avaliação qualitativa realizada; quantitativa prevista	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

Legenda (P x S):  Irrelevante (1)  Baixo (2-4)  Moderado (4-12)  Alto (10-16)  Crítico (20-25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5x5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 11 - HIDRÁULICA/PRODUÇÃO

Cargo / Função	Encanador, Meio Oficial de Encanador, Servente
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, definem traçados e dimensionam tubulações. Preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão e estanqueidade. Auxiliam no carregamento de materiais.
Local de Trabalho	Canteiro de obras.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Posição de trabalho errada ou incomoda durante execução das atividades	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	1	2	BAIXO (2)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Carregamento e transporte de materias de impermeabilização	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras no canteiro de obras.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
Acidentes	Queda de materiais	Quedas de mesmo nível com impacto em objetos na obra	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Capacete de segurança	
Físico	Ruído	Utilização de furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a máquinas ruidosas	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	2	BAIXO (4)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Químico	Metil-etil-cetona	Utilização de adesivo plástico e solução limpadora em tubos de PVC	Desorientação, falta de memória, perda de autocontrole, visão dupla, palidez, irritação das mucosas, paralisia, lesões cardíacas, pulmonares e hepáticas	2	1	BAIXO (2)	Controlar os níveis de exposição através de avaliações quantitativas		
Químico	Acetona — Solução limpadora	No uso de solução limpadora em tubos de PVC	Desorientação, falta de memória, perda de autocontrole, visão dupla, palidez, irritação das mucosas, paralisia, lesões cardíacas, pulmonares e hepáticas	2	1	BAIXO (2)	Controlar os níveis de exposição através de avaliações quantitativas		
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	3	2	MODERADO (6)	Uso de equipamentos de proteção individual	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 12 - ELEVADOR DE CREMALHEIRA/PRODUÇÃO

Cargo / Função	Operador de Cremalheira, Operador de Máquinas
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Operam cremalheira, organizam e preparam cargas para levar aos pavimentos superiores. Organizam pessoal para transporte vertical. Realizam check list diário do equipamento.
Local de Trabalho	Elevador cremalheira e canteiro de obras.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Posição de trabalho errada ou incomoda durante execução das atividades	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	1	2	BAIXO (2)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Carregamento e transporte de materias de impermebilização	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	3	2	MODERADO (6)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Acidentes	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves, como a transmissão de vírus.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes ou morte	3	2	MODERADO (6)	Comunicação com o operador, manutenção preventiva no moitão, cintas, cabos e demais necessários para os equipamentos de içamentos	Capacete de segurança	
Físico	Ruído	Motor do elevador cremalheira	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 13 - IÇAMENTO DE CARGAS

Cargo / Função	Operador de Grua, Operador de Grua de Pequeno Porte, Operador de Máquinas, Sinaleiro e Amarrador
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Operam e avaliam as condições de funcionamento das máquinas e equipamentos de elevação. Organizam cargas para transporte até os pavimentos destinados. Orientam o operador da grua ou minigrua com sinais específicos ou rádios comunicadores, controlando peso e condição das amarrações.
Local de Trabalho	Área de içamento e Grua com ambiente climatizado.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Posição de trabalho errada ou incomoda durante execução das atividades	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	1	2	BAIXO (2)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Ergonômico	Levantamento e transporte manual de cargas	Posição de trabalho errada ou incomoda durante preparação de cargas para içamento	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	2	2	BAIXO (4)	Manter postura de trabalho adequada	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

Acidentes	Queda de materiais	Em deslocamento no canteiro de obras	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
Físico	Ruído	Motor do elevador	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	2	BAIXO (4)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 14 - PORTARIA

Cargo / Função	Vigia Diurno, Vigia Noturno, Porteiro
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Zelam pela guarda do patrimônio e exercem vigilância, percorrendo e inspecionando as dependências da obra para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades.
Local de Trabalho	Sala em alvenaria com iluminação e ventilação natural.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Posição de trabalho errada ou incomoda durante execução das atividades	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	1	2	BAIXO (2)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Queda de materiais	Em deslocamento no canteiro de obras	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 15 - PINTURA/PRODUÇÃO

Cargo / Função	Pintor, Meio Oficial de Pintura, Servente
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Pintam as superfícies externas e internas de edifícios, raspando-as, amassando-as e cobrindo-as com uma ou várias camadas de tinta. Revestem tetos, paredes e outras partes de edificações. Preparam as superfícies a revestir e combinam materiais.
Local de Trabalho	Canteiro de obras.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Posição de trabalho errada ou incomoda durante execução das atividades	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Acidentes	Queda de mesmo nível	Pisos escorregadios, materiais deixados nas áreas de circulação	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Manter atenção ao circular pelo ambiente de trabalho, retirar obstáculos da área de circulação, utilizar calçado adequado	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infeções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

Acidentes	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	Capacete de segurança	
Físico	Ruído	Utilização de furadeiras, marteletes, geradores ou em trabalhos executados próximo a máquinas ruidosas	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais grave, perda auditiva irreversível	2	2	BAIXO (4)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Químico	Alquil Lauril Éter	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
Químico	Carbonato de cálcio natural	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
Químico	Carbonato de Cálcio ppt	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
Químico	Derivados Isotiazolonas e Semi-Acetais	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
Químico	Dióxido de Titânio	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
Químico	Estireno-Acrílicos	Pinturas utilizando massa corrida e Textura	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
Químico	Hidrocarboneto Alifático	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara c/ filtro orgânico; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
Químico	Hidróxido de amônia	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Luvas de borracha; Óculos de segurança ampla visão; Máscara c/ filtro	

Químico	Polímeros acrílicos aquosos	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
Químico	Sílica Livre - Poeira respirável	Lixamento de paredes	Problemas nas vias respiratórias	2	2	BAIXO (4)	Uso de respiradores apropriados para a atividade	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
Químico	Silicato de alumínio hidratado	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara de solda; Luvas de raspa; Óculos de solda; Máscara PFF2	
Químico	Óxido de Ferro Amarelo	Tinta a Base de água	Irritações nos olhos e pele, e danos ao sistema respiratório.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Utilizar luvas contra agentes químicos na preparação do produto	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 16 - GESSO/PRODUÇÃO

Cargo / Função	Gesseiro, Servente
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Preparam ferramentas, equipamentos e materiais e selecionam peças de acordo com o projeto. Fabricam e recompõem placas, peças e superfícies de gesso. Revestem tetos e paredes e rebaixam tetos com placas de painéis e gesso. Realizam decorações com peças de gesso e montam paredes divisórias com blocos e painéis de gesso.
Local de Trabalho	Canteiro de obras.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Ergonômico	Postural	Posição de trabalho errada ou incomoda durante execução das atividades	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Manter postura de trabalho adequada	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
Acidentes	Queda de materiais	Trabalhos próximos a sacadas ou janelas	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	Manter ferramentas e materiais distante das periferias	Capacete de segurança	
Acidentes	Projeção de partículas	No uso de parafusadeiras, furadeiras e finca pino	Lesão nos olhos	2	1	BAIXO (2)	Utilizar óculos de proteção durante as atividades com furadeiras, parafusadeiras e finca pinos		
Acidentes	Trabalho em Altura	Falta de linha de vida, não uso de cinto ligado ao ponto de ancoragem, equipamentos irregulares, periferias sem proteções	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	3	2	MODERADO (6)	Utilizar os SPCQ e SPIQ indicados pela empresa	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
Acidentes	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infeções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

Físico	Ruído	Utilização de furadeiras, martelos, geradores ou em trabalhos executados próximo a máquinas ruidosas	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	2	BAIXO (4)	Manter distância de atividades ruidosas e na impossibilidade utilizar o protetor auditivo	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Químico	Sulfato de cálcio — Gesso	Poeiras provenientes de pó de gesso durante aplicação de gesso	Irritação das vias respiratórias, ressecamento e irritação da pele	1	2	BAIXO (2)	No momento da preparação da massa os colaboradores deverão estar utilizando máscaras apropriadas para a atividade		

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 17 - MARKETING/RECEPEÇÃO

Cargo / Função	Recepcionista
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	2142-05. Orientam e cobram dos colaboradores quanto a realização dos serviços, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação, manutenção e planejamento do empreendimento.3121-05. Acompanhar com o Encarregado de obra o andamento da qualidade dos serviços realizados utilizando o procedimento de execução e inspeção de serviços. Preencher planilhas de rastreabilidade de materiais e ensaios. Elaborar mensalmente os itens relacionados à qualidade e/ou controle de obra para apresentação nas reuniões críticas de obras.901 - Auxiliar a equipe da obra nas atividades de manutenção e melhoria do SGQ no que se refere aos aspectos ambientais. Auxiliar no controle e execução dos contratos para emissão de faturas aos clientes e recebimento dos pagamentos; auxiliar na elaboração do planejamento meta, elaborar fluxo de caixa, controlar os relatórios gerenciais das obras mensais e fechamento final. Colaborar no controle e qualidade, planejamento e auxiliar o Engenheiro em suas atividades diárias.
Local de Trabalho	Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalizacao das atividades.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Físico	Ruído	Equipamentos eletroportáteis e estacionários do canteiro (ruído externo ao escritório)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Avaliação Quantitativa* Nota 01	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
Ergonômico	Postural	Trabalho sentado por longos períodos;	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	1	BAIXO (2)	Avaliação Quantitativa* Nota 01	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	—
Acidente	Corte e Perfuração	Presença de materiais com pontas e arestas cortantes expostas durante os deslocamentos nas áreas do canteiro de obras.	Lacerações, hemorragias, lesões em tendões e nervos, infecções secundárias	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	—
Acidente	Queda de materiais	Em deslocamento no canteiro de obras	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes.	2	1	BAIXO (2)	—	Capacete de segurança	—

Acidente	Queda de mesmo nível	Em deslocamento no canteiro de obras	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas.	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	—
----------	----------------------	--------------------------------------	---	---	---	--------------	--	---	---

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 18 - COPA

Cargo / Função	Auxiliar de Limpeza, Auxiliar de Serviços Gerais, Copeira, Serviços Gerais
Qt. Trabalhadores	[Quantidade de trabalhadores expostos]
Descrição das Atividades	Limpeza do local de trabalho; higienização de vestiários e banheiros; conservação das dependências administrativas da obra; serviços de copa.
Local de Trabalho	Diversos locais da obra — pé-direito, iluminação e ventilação variáveis.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 07h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sábado]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Físico	Ruído	Equipamentos eletroportáteis e estacionários do canteiro	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	2	1	BAIXO (2)	Verificar Plano de Ação PDCA	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	Avaliação quantitativa (80–85 dB(A))
Químico	Particulados (insolúveis ou de baixa solubilidade) não especificados de outra maneira (PNOS)	Poeiras do processo produtivo do canteiro	Comprometimento pulmonar, chiado no peito, falta de ar, tosse	2	1	BAIXO (2)	Avaliação qualitativa realizada; quantitativa prevista		Avaliação quantitativa conforme PDCA
Ergonômico	Postural	Atividades de limpeza e conservação	A manutenção prolongada das posturas em pé ou sentada gera sobrecarga muscular e dificulta a circulação sanguínea, o que pode resultar em dores na coluna, pernas, joelhos e quadril.	2	2	BAIXO (4)	Ginástica laboral; AET; medidas conforme plano de ação	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	Implementar e acompanhar medidas ergonômicas
Acidente	Queda de mesmo nível	Piso escorregadio, irregular ou com obstáculos	Fraturas, lesões diversas, possibilidade de incapacitação	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza; sinalização; iluminação	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA
Acidente	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes	2	1	BAIXO (2)	Organização e limpeza; proteções coletivas; DDS	Capacete de segurança	Verificar plano de ação PDCA

ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	3	2	MODERADO (6)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
----------	--	--------------------------------------	---	---	---	------------------------	--	---	--

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

P = Probabilidade ajustada (considera as medidas de prevenção existentes reconhecidas pelos respondentes) · S = Severidade do dano potencial. Classificação conforme matriz de risco 5×5 adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023), em atendimento à NR-1. Os fatores psicossociais integram o grupo de fatores ergonômicos (NR-1, item 1.5.3.1). Material técnico de apoio; a validação e a execução do Plano de Ação no PGR são de responsabilidade da organização avaliada.

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo existente no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a").*

- ★ O Inventário de Riscos das Funções deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, mudança de fase construtiva, introdução de novos processos ou contratação de novas empresas prestadoras de serviços, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.
- ★ O inventário dos riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) integra este anexo, em conformidade com o disposto na Seção 18 deste PGR.

26.1 INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

O presente inventário contempla os riscos psicossociais identificados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1 e com as diretrizes da Portaria MTE n.º 1.419/2024. A avaliação segue a Matriz 5×5 da Seção 10 deste PGR.

GHE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Cargo / Função	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Qt. Trabalhadores	21
Descrição das Atividades	Atividades de técnicas de engenharia relacionadas com a gestão e execução de obra, apoio administrativo, inclusive amoxarifado, gestão de pessoas e segurança do trabalho
Local de Trabalho	Ambientes fechados, com estrutura para trabalho de escritório, climatizados, com ventilação e iluminação natural e artificial e ambiente aberto no canteiro de obra.
Jornada de Trabalho	Refere - se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Psicossocial (Ergonômico)	Demandas no trabalho Sobrecarga de trabalho / Excesso de demandas	Refere - se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Influência e desenvolvimento Falta de autonomia / Baixo controle sobre o trabalho	Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Significado e compromisso Desvinculação organizacional / Falta de propósito	Relaciona - se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Relações interpessoais Conflitos interpessoais / Baixo suporte social	Refere - se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Liderança Liderança inadequada / Falta de suporte da chefia	Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Psicossocial (Ergonômico)	Satisfação no trabalho Insatisfação organizacional / Desmotivação	Refere - se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Conflitos família e trabalho Interferência trabalho-família	Refere - se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Valores no local de trabalho Falta de confiança e justiça organizacional	Relaciona - se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Comportamentos ofensivos Assédio / Violência / Comportamentos abusivos	Refere - se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.	Transtornos mentais.	4	2	MODERADO (8)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

GHE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Cargo / Função	TÉCNICO ADMINISTRATIVO
Qt. Trabalhadores	21
Descrição das Atividades	Atividades de técnicas de engenharia relacionadas com a gestão e execução de obra, apoio administrativo, inclusive amoxarifado, gestão de pessoas e segurança do trabalho
Local de Trabalho	Ambientes fechados, com estrutura para trabalho de escritório, climatizados, com ventilação e iluminação natural e artificial e ambiente aberto no canteiro de obra.
Jornada de Trabalho	[Ex.: 08h00 às 17h00, com 1h de intervalo — Segunda a Sexta]

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Psicossocial (Ergonômico)	Demandas no trabalho Sobrecarga de trabalho / Excesso de demandas	Refere - se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Influência e desenvolvimento Falta de autonomia / Baixo controle sobre o trabalho	Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.	Transtorno mentais; LER (Lesões por Esforços Repetitivos) e DORT (Distúrbios Osteomusculares Relacionados ao Trabalho)	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Significado e compromisso Desvinculação organizacional / Falta de propósito	Relaciona - se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Relações interpessoais Conflitos interpessoais / Baixo suporte social	Refere - se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Liderança Liderança inadequada / Falta de suporte da chefia	Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Psicossocial (Ergonômico)	Satisfação no trabalho Insatisfação organizacional / Desmotivação	Refere - se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Conflitos família e trabalho Interferência trabalho-família	Refere - se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.	Transtornos mentais.	3	1	BAIXO (3)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Valores no local de trabalho Falta de confiança e justiça organizacional	Relaciona - se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.	Transtornos mentais.	2	1	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Comportamentos ofensivos Assédio / Violência / Comportamentos abusivos	Refere - se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.	Transtornos mentais.	4	2	MODERADO (8)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

* O inventário de riscos psicossociais deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições organizacionais de trabalho, mudança de gestão ou identificação de novos fatores de risco, conforme NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

27. ANEXO II — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES – EMPRESAS TERCEIRIZADAS

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3, 1.5.6.1 e 1.5.8.1.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5x5 da Seção 10.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a" c/c 1.5.8.1.1).*


★ O Inventário de Riscos das empresas terceirizadas deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, ingresso de nova prestadora de serviços ou mudança de fase construtiva, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

28. DOCUMENTOS E PROJETOS OBRIGATÓRIOS — NR-18 E NORMAS CORRELATAS

#	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	STATUS
1	Projeto da Área de Vivência do Canteiro (NR-18 item 18.5)	Profissional legalmente habilitado (ART)	
2	Projeto Elétrico das Instalações Temporárias	Engenheiro Elétrico (ART)	
3	Projetos dos Sistemas de Proteção Coletiva (SPC)	Engenheiro Civil (ART)	
4	Projeto do SPIQ — Sistema de Proteção Individual contra Quedas (NR-35)	Engenheiro (ART)	
5	Relação e Especificações Técnicas dos EPIs por GHE	SECONCI / SST	
6	Prontuário de Instalações Elétricas — PIE (acima de 75 KVA)	Engenheiro Elétrico (ART)	
7	Dossiê de Máquinas e Equipamentos (NR-12)	SST / Fabricante	

28.1 ART — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ELABORADOR

28.2 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

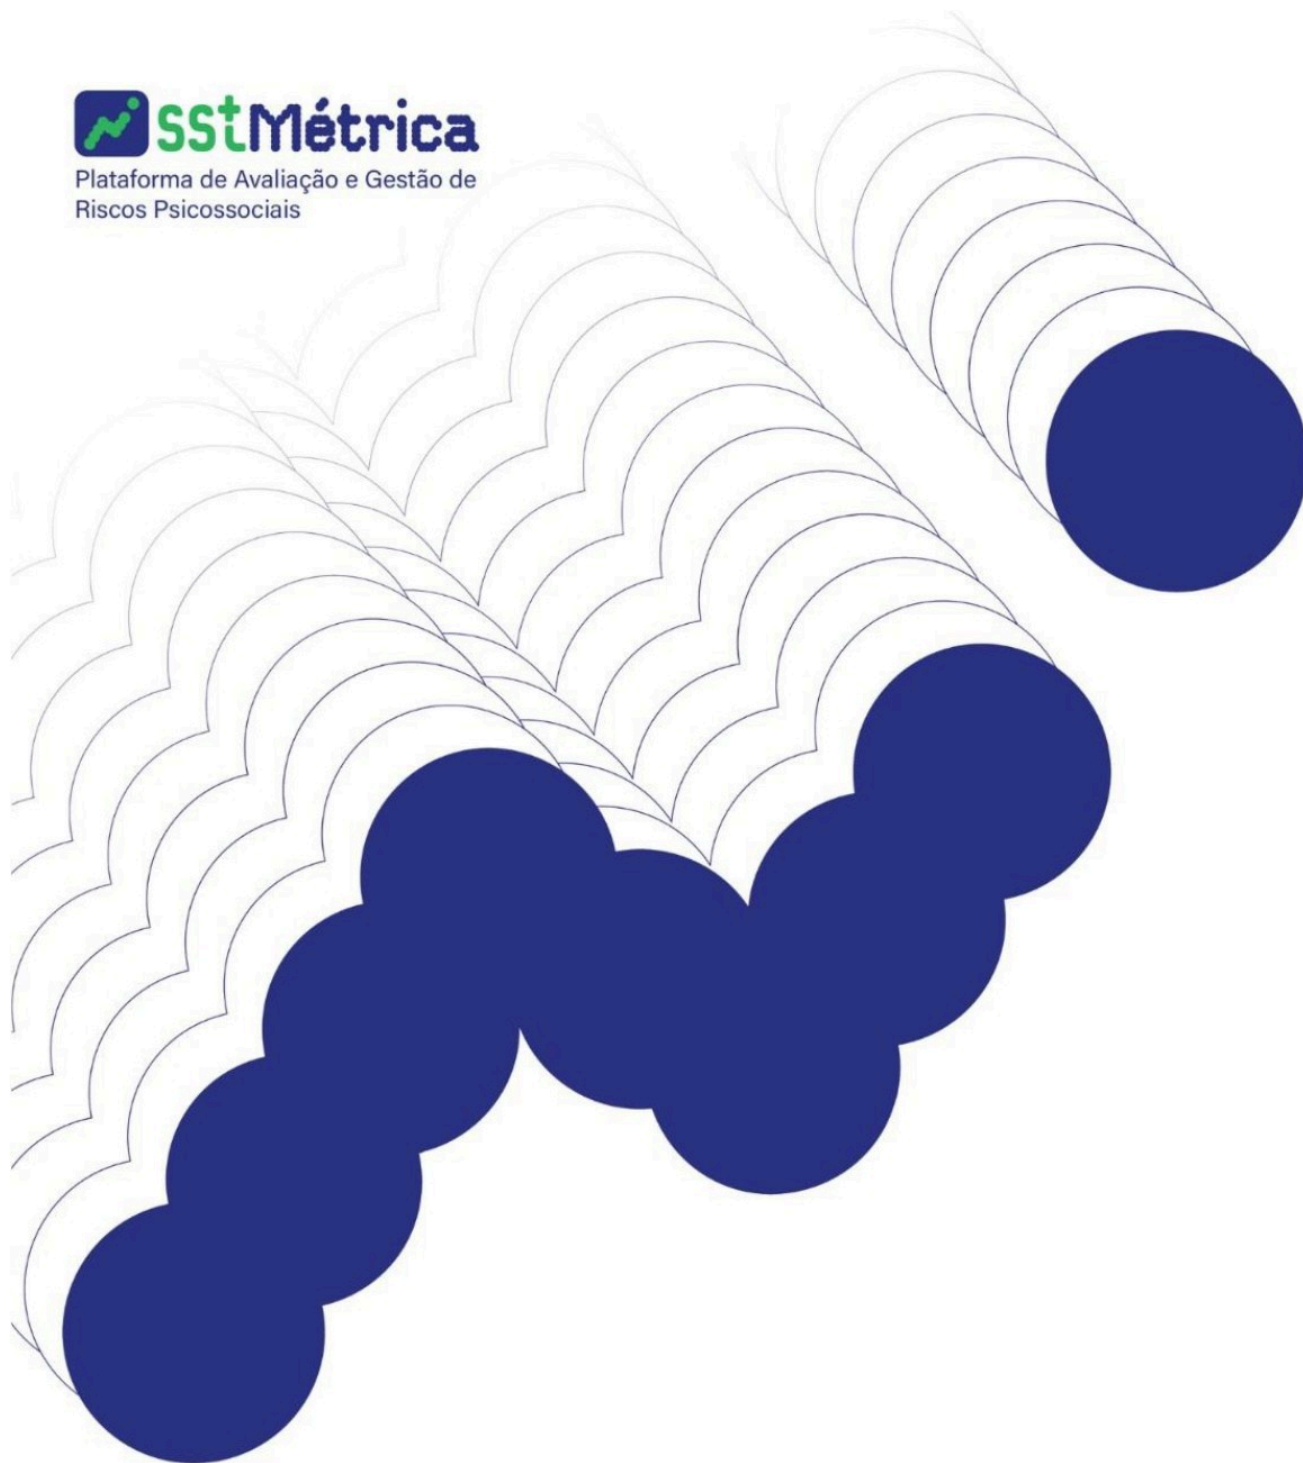

Relatório de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho

Este relatório foi elaborado no âmbito da Plataforma SSTmétrica por meio da aplicação do Instrumento de Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais no Trabalho - COPSOQ II, em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Responsáveis Técnicos

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho | UFG
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde | PUC Goiás
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais | FEUP - Portugal
CREA-PI 1964/D

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga | UnB
Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho
e das Organizações | UnB
CRP-DF: 01/8625

Nota Técnica de Responsabilidade

Este relatório contempla a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, realizada por meio do instrumento *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ II (Versão Brasileira), operacionalizado pela Plataforma de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais – SSTmétrica.

A responsabilidade técnica dos especialistas refere-se exclusivamente ao processo de avaliação e à elaboração do relatório final conclusivo, contendo o detalhamento da metodologia aplicada, os resultados alcançados e o inventário dos riscos, nos termos da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

A elaboração e execução do Plano de Ação no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) constituem responsabilidade exclusiva da organização avaliada ou de consultoria por ela formalmente designada.

As recomendações técnicas disponibilizadas pela plataforma, decorrentes da avaliação, possuem caráter técnico-orientativo e têm por finalidade subsidiar a tomada de decisão da organização na definição do Plano de Ação.

Direitos Autorais e Uso Restrito

Este relatório é de uso exclusivo da organização contratante e não poderá ser reproduzido, distribuído ou alterado, total ou parcialmente, sem autorização expressa dos responsáveis técnicos e da Plataforma SSTmétrica.

FICHA CADASTRAL

RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO

NOME FANTASIA
SECONCI-GORAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSTRUCAO
ESTADO DE GOIASCNPJ
36863637000159INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSENTOCNAE
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a
consultasTELEFONE DA EMPRESA
0EMAIL INSTITUCIONAL
coord.seguranca@seconcigoias.com.brCONTATO (TELEFONE ALTERNATIVO)
ADRIANO OLIVEIRA / E-MAIL: coord.seguran-
ca@seconcigoias.com.br / 62 99430-0089CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

DADOS DA EMPRESA AVALIADA

NOME FANTASIA
TOCTAO - ALT65RAZÃO SOCIAL
SPE T-65 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDACNPJ
37944082000132INSCRIÇÃO ESTADUAL
0000000000000000CNAE
4120-4/00TELEFONE DA EMPRESA
62981941250CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

1. Introdução

A inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) tornou-se uma exigência legal a partir da alteração do item 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR 1), promovida pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (BRASIL, 2024). Essa atualização ampliou a abrangência dos fatores de risco ao estabelecer, no item 1.5.3.1, que os fatores psicossociais passam a integrar expressamente o grupo de fatores ergonômicos a serem avaliados pelas organizações. A obrigatoriedade de aplicação dessa mudança foi definida pela Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025 (BRASIL, 2025), que fixou a vigência da alteração para 26 de maio de 2026. Dessa forma, todas as organizações, independentemente de porte ou setor econômico, estão legalmente obrigadas a realizar a avaliação dos fatores de riscos psicossociais e incluí-los em seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), garantindo sua plena integração ao processo de gestão dos riscos ocupacionais.

A avaliação dos riscos psicossociais no trabalho, realizada na com base no *Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II* (Versão Brasileira), tem como finalidade oferecer uma compreensão abrangente das condições psicossociais que podem influenciar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Os fatores de riscos psicossociais, no entendimento de Sampaio (2023), podem ser descritos como “características intrínsecas à organização do trabalho, com potencial de danos à saúde mental, física e social, além de efeitos no desempenho laboral e satisfação do trabalhador, que interage com o modo operatório da organização”.

A avaliação abrange um conjunto amplo de fatores organizacionais e psicossociais associados às demandas laborais, ao conteúdo do trabalho, às relações sociais, ao ambiente organizacional e aos indicadores de saúde e satisfação. Esses elementos permitem identificar situações que possam contribuir para sobrecarga, estresse, esgotamento emocional, conflitos interpessoais ou outros fatores de risco decorrentes da interação do trabalhador com as circunstâncias organizacionais.

Com base nas informações coletadas, é gerado o relatório de avaliação contendo o inventário e a classificação dos riscos psicossociais identificados, em conformidade com os requisitos aplicáveis da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1). Adicionalmente, é disponibilizada na plataforma uma estrutura de Plano de Ação destinada a apoiar a gestão dos riscos identificados, cabendo à organização avaliada a definição das medidas de prevenção e controle, dos responsáveis, dos prazos de execução e dos critérios de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações implementadas. O relatório, o inventário de riscos e a estrutura do Plano de Ação constituem importantes subsídios para a tomada de decisões e a priorização de intervenções, apoiando a organização na promoção de um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e alinhado às boas práticas de gestão dos riscos psicossociais.

2. Metodologia de Avaliação

2.1. Instrumento utilizado

A avaliação dos riscos psicossociais foi realizada por meio do *Copenhagen Psychosocial Questionnaire* – COPSOQ, instrumento desenvolvido por um grupo de pesquisadores liderados por Tage S. Kristensen e Vilhelm Borg no *Danish National Research Centre for the Working Environment*, da Dinamarca, entre os anos 1995 e 2007 (COPSOQ NETWORK, 2021). A versão brasileira (COPSOQ II), utilizada nesta avaliação, foi adaptada e validada por Josiane Sotrate Gonçalves e colaboradores, atendendo aos requisitos de equivalência semântica, cultural e psicométrica. O questionário validado é constituído de 11 dimensões e 40 perguntas no formato de escala Likert com 5 e 4 alternativas. De acordo com Gonçalves et al. (2021), a versão curta do COPSOQ II-Br apresentou propriedades psicométricas adequadas para utilização no contexto brasileiro.

2.2. Procedimentos de Aplicação e Coleta de Dados

A aplicação do COPSOQ II ocorreu por meio de questionário eletrônico disponibilizado individualmente aos trabalhadores. O fluxo operacional compreendeu as seguintes etapas: i) geração do link exclusivo da avaliação na Plataforma SSTMétrica; ii) envio do link diretamente ao trabalhador pela empresa de consultoria em Segurança e Saúde no Trabalho que atende a empresa avaliada ou pela própria plataforma, quando a avaliação for solicitada sem a participação de consultoria e iii) resposta individual e anônima ao questionário, sem identificação pessoal.

Antes da aplicação propriamente dita do instrumento, é realizado o cadastramento da avaliação na plataforma SSTMétrica, etapa em que são definidos os Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs), considerando-se as atividades desenvolvidas, os ambientes de trabalho e os quantitativos de trabalhadores elegíveis em cada grupo.

Ressalta-se que a participação dos trabalhadores deve ocorrer de forma individual, anônima e voluntária, em condições que assegurem que as respostas reflitam a percepção livre de cada respondente, sem a presença ou supervisão direta de representantes da empresa avaliada, exceto os profissionais de segurança e saúde no trabalho que devem se limitar à orientação operacional, sem interferência nas respostas. Tais garantias visam preservar a confidencialidade das informações e promover um ambiente favorável para que as respostas expressem com fidelidade as percepções reais sobre o ambiente organizacional.

Excepcionalmente, nos casos em que se fizer necessário algum tipo de apoio durante a aplicação, poderá ser designado um profissional da área de Segurança e Saúde no Trabalho, preferencialmente sem vínculo com a empresa avaliada, para prestar esclarecimentos adicionais. O objetivo é garantir

que todos os participantes compreendam adequadamente as questões apresentadas, assegurando a eficácia e a fidedignidade da avaliação realizada.

2.3. Processamento e classificação dos riscos

Os questionários eletrônicos respondidos são automaticamente enviados à plataforma e, em seguida, processados com o devido tratamento estatístico, conforme os critérios técnicos do COPSOQ II, permitindo a classificação dos riscos psicossociais, nos níveis baixo, médio e alto, distribuídos de forma percentual para cada dimensão que integra o instrumento. Este padrão de resultado é internacionalmente aceito e característico do COPSOQ na sua versão original.

Embora o COPSOQ seja reconhecimento e amplamente aceito nos meios acadêmico, corporativo e governamental em nível mundial, como um método robusto de avaliação de riscos psicossociais, no Brasil, por força normativa, a classificação dos riscos ocupacionais deve ser obtida pela combinação da probabilidade de ocorrência de danos à saúde do trabalhador com a severidade do referido dano, conforme definido no item 1.5 da NR-1 (BRASIL, 2025).

Assim, tornou-se necessário expressar os resultados do COPSOQ nos termos exigidos pela NR-1, por meio da aplicação de uma matriz de riscos proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023), do tipo 5 × 5, cujos níveis são classificados em irrelevante, baixo, médio, alto e crítico (Figura 1).

5 Altamente Provável	Médio	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4 Provável	Médio	Médio	Alto	Alto	Crítico
3 Pouco Provável	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
2 Improvável	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
1 Altamente Improvável	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade / Severidade	1 Leve Reversível	2 Moderado Reversível	3 Grave Reversível	4 Grave Irreversível	5 Crítico ou Fatal

Figura 1 - Matriz de riscos, adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023)

Essa conversão teve como base o risco por dimensão (risco global), obtido pelo escore médio de todas as respostas dos trabalhadores para cada uma das dimensões do questionário.

A classificação dos riscos psicossociais, além de estar em conformidade com a NR-1, está em consonância com a NR-17, especialmente no que se refere ao item 17.4 - Organização do Trabalho, que estabelece a necessidade de se considerar, dentre outros, as normas de produção, a exigência de tempo, o ritmo de trabalho e o conteúdo das tarefas (BRASIL, 2022).

2.4. Validação técnica e disponibilização dos resultados

Concluído o processamento dos dados e a classificação dos riscos, a plataforma gera automaticamente um Relatório Preliminar da Avaliação contendo o inventário de riscos psicossociais e a estrutura do Plano de Ação organizada por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), contemplando os resultados classificados nos níveis de risco Médio, Alto e Crítico. A estrutura disponibilizada tem caráter exclusivamente informativo e de apoio à gestão dos riscos identificados, cabendo à organização avaliada a elaboração do Plano de Ação, a definição das medidas de prevenção e controle, dos responsáveis, dos prazos de execução e dos critérios de acompanhamento e avaliação da eficácia das ações implementadas. Adicionalmente, são apresentadas recomendações técnicas associadas às dimensões avaliadas, de natureza orientativa e não vinculante.

Posteriormente, o relatório preliminar é submetido à análise dos responsáveis técnicos pela avaliação, que procedem à validação dos resultados e à emissão do relatório final, o qual é disponibilizado aos interessados na plataforma.

2.5. Diretrizes para Interpretação dos Resultados

O Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II reúne diferentes dimensões relacionadas às condições psicossociais de trabalho, estruturadas a partir dos principais modelos teóricos internacionais sobre estresse ocupacional e saúde no trabalho.

Para fins de interpretação dos resultados, recomenda-se que as dimensões avaliadas sejam compreendidas em três grupos: *Dimensões Organizacionais*, relacionadas às condições e à gestão do trabalho; *Dimensões de Vivência Organizacional*, relacionadas à forma como os trabalhadores percebem e experimentam essas condições; e *Dimensões de Saúde e Consequências*, relacionadas ao bem-estar e aos possíveis efeitos das condições psicossociais de trabalho sobre os trabalhadores.

A análise dos resultados deve considerar tanto cada dimensão individualmente quanto uma leitura sistêmica e integrada do conjunto das dimensões avaliadas. Em especial, os resultados observados nas Dimensões de Saúde e Consequências devem ser interpretados à luz dos resultados obtidos nas Dimensões Organizacionais e de Vivência Organizacional, uma vez que podem refletir a forma como

os trabalhadores percebem, experimentam e respondem às condições psicossociais presentes no contexto laboral.

É importante compreender que os resultados das Dimensões Organizacionais e de Vivência Organizacional não se refletem necessariamente de forma direta ou linear nas Dimensões de Saúde e Consequências, considerando a complexidade dos processos que envolvem a percepção, a adaptação e o adoecimento relacionados ao trabalho. Entretanto, para fins de interpretação dos resultados, é possível adotar as seguintes linhas gerais de raciocínio:

- I. exposição elevada + dano elevado → situação coerente que demanda intervenção;
- II. exposição elevada + dano baixo → possível fase inicial de exposição, existência de fatores protetivos ou adoção de estratégias individuais e coletivas de enfrentamento das condições de trabalho;
- III. exposição baixa + dano elevado → necessidade de investigação complementar, podendo indicar a influência de fatores não capturados pelo instrumento ou de fatores ocupacionais e/ou extraocupacionais não identificados na avaliação.

Para fins de atendimento à Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), os resultados obtidos pelo COPSOQ II foram convertidos para uma matriz de risco baseada na combinação entre probabilidade e severidade. Assim, a definição das prioridades de ação deve considerar, de forma complementar, tanto os resultados originais do COPSOQ II quanto a classificação final dos riscos obtida segundo os critérios da NR-1.

3. Resultados

Os resultados, a seguir apresentados, estão dispostos em tabelas e gráficos, seguindo os padrões característicos do Copenhagen Psychosocial Questionnaire – COPSOQ II (Versão Brasileira) para a avaliação de fatores de riscos psicossociais relacionados com o trabalho, bem como os resultados expressos nos termos da NR - 1, conforme explicado no item metodologia.

Registre-se que se trata de uma avaliação de riscos e não de diagnósticos de adoecimento. Portanto, a interpretação correta dos resultados para cada Dimensão/Perigo Psicossocial refere-se à probabilidade de danos à saúde física, mental e social dos trabalhadores em função do grau de risco associado à cada uma das dimensões. Assim, em uma situação hipotética para a Dimensão/Perigo Psicossocial Satisfação no Trabalho, cujos resultados fossem: Risco Baixo: 48%, Risco Médio: 27% e Risco Alto: 25%, uma interpretação ou leitura adequada com o método COPSOQ, seria:

O nível de risco relacionado à dimensão Satisfação no Trabalho foi classificado como baixo por 48% dos participantes, indicando que para essa parcela dos trabalhadores a probabilidade de danos à saúde física, mental e social é improvável. Entretanto, para 27% e 25% dos trabalhadores, o nível de risco foi classificado como médio e alto, respectivamente, indicando uma chance elevada de danos pessoais e consequente necessidade de medidas de prevenção relativas a este fator de risco para evitar potenciais danos à saúde dos trabalhadores.

Os resultados são exibidos inicialmente conforme os níveis de risco atribuídos pelo COPSOQ II e, na sequência, apresentados segundo a classificação exigida pela NR 1, obtida por meio da matriz de risco probabilidade × severidade.

Resultados da avaliação de riscos psicossociais por GHE, obtidos via COPSOQ II e convertidos para os padrões da NR - 1.

Para atendimento às exigências estabelecidas na Norma Regulamentadora (NR-1), são apresentados os resultados da avaliação dos riscos psicossociais obtidos por meio do COPSOQ II para cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Recomenda-se, preferencialmente, que os GHEs possuam pelo menos trinta integrantes ($n \geq 30$), em consonância com as recomendações metodológicas usualmente adotadas para instrumentos quantitativos. Quando essa condição não for observada, os resultados devem ser interpretados com cautela, em razão da redução da representatividade amostral. Não é recomendável a aplicação deste instrumento em GHEs com menos de dez trabalhadores ($n < 10$), situação em que métodos qualitativos tendem a constituir alternativa metodológica mais adequada. Na sequência, os resultados são convertidos para os padrões exigidos pela NR-1 mediante a aplicação da matriz de riscos descrita na Seção Metodologia de Avaliação.

Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs)

GHE - OPERACIONAL

Atividade Executada

Atividades operacionais de construção civil no canteiro de obras, abrangendo funções como pedreiro, eletricista, armador, encarregado de hidráulica, carpinteiro, encanador, auxiliar de obra, serralheiro, operador de grua e operador de elevador de cremalheira. As atividades envolvem a execução de serviços em diferentes etapas do processo construtivo, incluindo fundações, estruturas, instalações elétricas e hidráulicas, montagem de formas e armações, movimentação e elevação de materiais, além de atividades de apoio geral à produção. Os trabalhadores utilizam ferramentas manuais, elétricas e equipamentos mecânicos, podendo operar sistemas de içamento e transporte vertical de cargas.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Canteiro de obras com áreas abertas e externas, sujeitas a variações climáticas, poeiras e ruído, e áreas fechadas de apoio, como almoxarifado e setor de engenharia. Ambiente dinâmico, com circulação de pessoas, materiais e equipamentos.

Total de Trabalhadores: 96

Total de Respondentes: 80

GHE - TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Atividade Executada

Atividades de técnicas de engenharia relacionadas com a gestão e execução de obra, apoio administrativo, inclusive almoxarifado, gestão de pessoas e segurança do trabalho

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Ambientes fechados, com estrutura para trabalho de escritório, climatizados, com ventilação e iluminação natural e artificial e ambiente aberto no canteiro de obra.

Total de Trabalhadores: 21


Total de Respondentes: 8

Quadro 1 – Níveis de risco psicossociais por dimensão - GHE OPERACIONAL, segundo o COPSOQ II

ORD.	DIMENSÃO COPSOQ II	BAIXO (%)	MÉDIO (%)	ALTO (%)
1	Demandas no trabalho	95%	0%	5%
2	Influência e desenvolvimento	41%	50%	9%
3	Significado e compromisso	89%	7%	4%
4	Relações interpessoais	64%	34%	2%
5	Liderança	69%	24%	7%
6	Satisfação no trabalho	91%	6%	3%
7	Conflitos família e trabalho	46%	40%	14%
8	Valores no local de trabalho	73%	22%	5%
9	Saúde geral	54%	35%	11%
10	Burnout e estresse	91%	0%	9%
11	Comportamentos ofensivos	98%	0%	2%

Gráfico 1 – Distribuição percentual do risco psicossocial por dimensão, segundo o COPSOQ II

GHE: OPERACIONAL

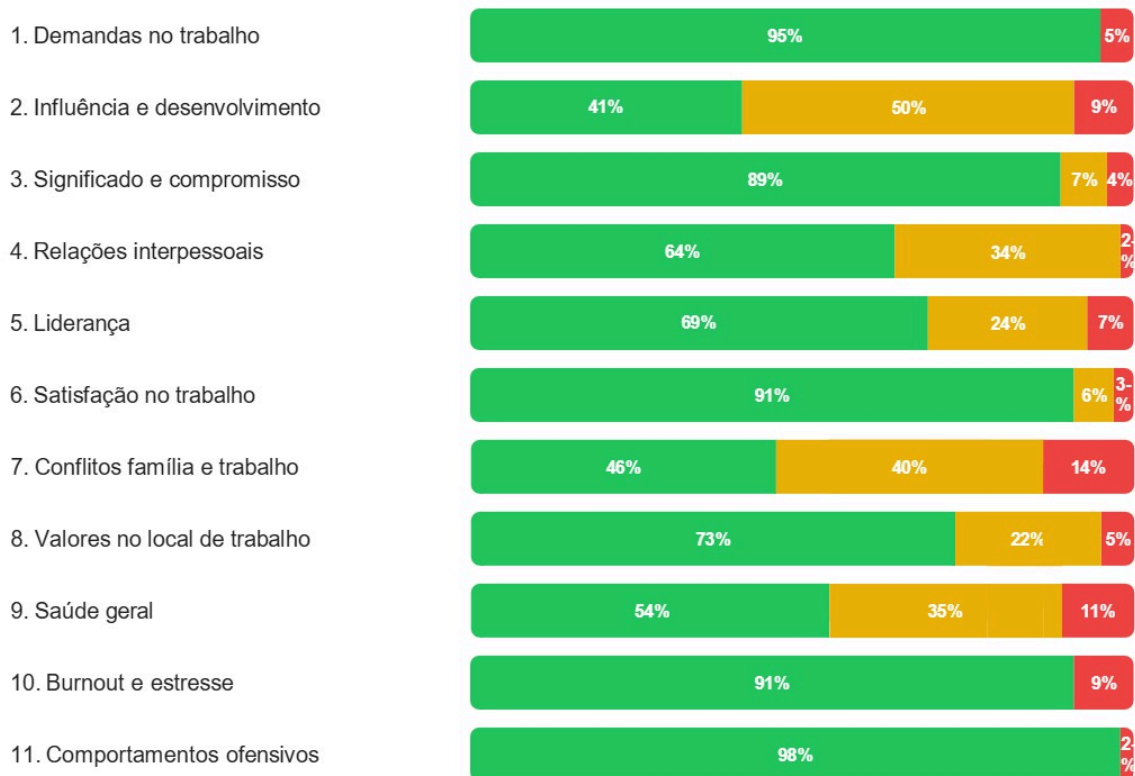

Legenda

■ Baixo
 ■ Médio
 ■ Alto

Quadro 2 – Níveis de risco psicossociais (COPSOQ II - NR) por dimensão, convertidos para os padrões da NR-1

GHE: OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 96

DIMENSÃO	RISCO GLOBAL COPSOQ II	SEVERIDADE	PROBABILIDADE AJUSTADA	NÍVEL DE RISCO (NR-1)
1. Demandas no trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
2. Influência e desenvolvimento	RISCO MÉDIO	2	2	BAIXO
3. Significado e compromisso	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
4. Relações interpessoais	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
5. Liderança	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
6. Satisfação no trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
7. Conflitos família e trabalho	RISCO MÉDIO	3	2	MÉDIO
8. Valores no local de trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
9. Saúde geral	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
10. Burnout e estresse	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO
11. Comportamentos ofensivos	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO


Nota: A probabilidade ajustada é determinada considerando a existência de medidas de prevenção adotadas pela organização, conforme reconhecidas ou não pelos respondentes.

Quadro 1 – Níveis de risco psicossociais por dimensão - GHE TÉCNICO ADMINISTRATIVO, segundo o COPSOQ II

ORD.	DIMENSÃO COPSOQ II	BAIXO (%)	MÉDIO (%)	ALTO (%)
1	Demandas no trabalho	88%	0%	12%
2	Influência e desenvolvimento	88%	12%	0%
3	Significado e compromisso	100%	0%	0%
4	Relações interpessoais	75%	25%	0%
5	Liderança	63%	37%	0%
6	Satisfação no trabalho	100%	0%	0%
7	Conflitos família e trabalho	75%	13%	12%
8	Valores no local de trabalho	100%	0%	0%
9	Saúde geral	63%	25%	12%
10	Burnout e estresse	88%	0%	12%
11	Comportamentos ofensivos	100%	0%	0%

Gráfico 1 – Distribuição percentual do risco psicossocial por dimensão, segundo o COPSOQ II

GHE: TÉCNICO ADMINISTRATIVO

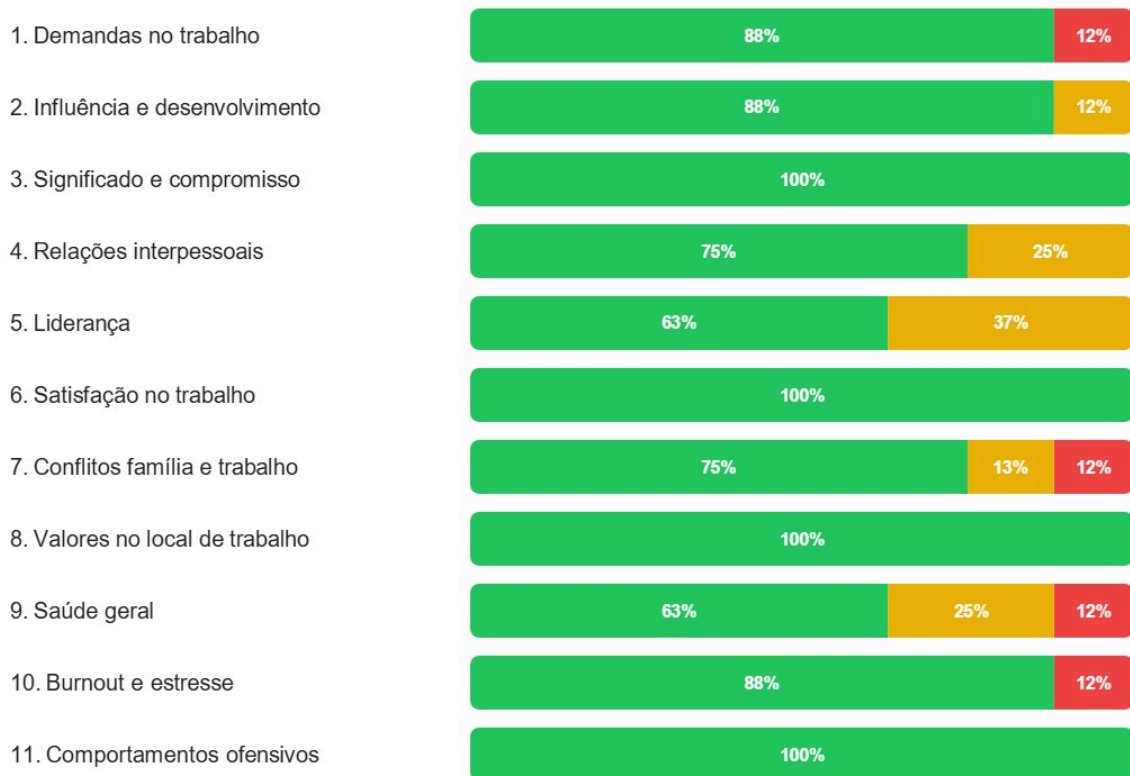

Legenda

■ Baixo
 ■ Médio
 ■ Alto

Quadro 2 – Níveis de risco psicossociais (COPSOQ II - NR) por dimensão, convertidos para os padrões da NR-1

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Trabalhadores expostos: 21

DIMENSÃO	RISCO GLOBAL COPSOQ II	SEVERIDADE	PROBABILIDADE AJUSTADA	NÍVEL DE RISCO (NR-1)
1. Demandas no trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
2. Influência e desenvolvimento	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
3. Significado e compromisso	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
4. Relações interpessoais	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
5. Liderança	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
6. Satisfação no trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
7. Conflitos família e trabalho	RISCO BAIXO	3	1	BAIXO
8. Valores no local de trabalho	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
9. Saúde geral	RISCO BAIXO	2	1	BAIXO
10. Burnout e estresse	RISCO BAIXO	4	1	BAIXO
11. Comportamentos ofensivos	RISCO BAIXO	4	2	MÉDIO

Nota: A probabilidade ajustada é determinada considerando a existência de medidas de prevenção adotadas pela organização, conforme reconhecidas ou não pelos respondentes.

4. Inventário de Riscos Psicossociais por GHE

O Inventário de Riscos Psicossociais consolida os achados da avaliação, convertendo os resultados do COPSOQ II para a metodologia de análise de risco exigida pela NR-1, por meio da combinação entre probabilidade ajustada e severidade dos efeitos potenciais à saúde. A classificação final considera os níveis Irrelevante, Baixo, Moderado, Alto e Crítico, conforme matriz de risco ocupacional proposta por Franchi, Quadros e Amaral (2023). Este inventário representa a formalização técnica dos perigos psicossociais identificados no ambiente de trabalho e constitui a referência oficial para o planejamento de medidas preventivas e corretivas.

OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 96

Demandas no trabalho		BAIXO
Descrição: Refere-se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.		
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde: Fadiga, estresse ocupacional, exaustão mental, distúrbios do sono e risco de acidentes.		
Probabilidade Ajustada 1	Severidade 3	
Medida-Chave de Prevenção Existente: A empresa organiza o volume de trabalho e os prazos de forma compatível com o número de trabalhadores e o tempo disponível. Reconhecimento: 0%		
Prioridade da Ação: Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.		

Influência e desenvolvimento**BAIXO****Descrição:**

Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico, baixa realização profissional.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

O trabalhador tem autonomia para decidir como realizar suas tarefas no dia a dia.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Significado e compromisso**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desengajamento, sofrimento psíquico, perda de sentido no trabalho.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

O trabalho realizado é reconhecido como importante e com propósito claro dentro da organização.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Relações interpessoais**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conflitos interpessoais, isolamento, estresse emocional.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa promove um ambiente de respeito, diálogo e convivência saudável entre os trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Liderança**BAIXO****Descrição:**

Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse ocupacional, insegurança, conflitos e sofrimento psíquico.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A liderança oferece apoio, orientação clara e acompanhamento adequado das atividades.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Satisfação no trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa busca manter boas condições de trabalho e um ambiente organizacional positivo.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Conflitos família e trabalho**MÉDIO****Descrição:**

Refere-se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse, exaustão, conflitos familiares, distúrbios do sono.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A organização evita jornadas excessivas e demandas que consumam tempo e energia além do razoável.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Valores no local de trabalho**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Sofrimento moral, desconfiança, estresse e conflitos organizacionais.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa atua com transparência e fornece informações confiáveis aos trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Saúde geral**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à percepção do trabalhador sobre seu estado geral de saúde.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Redução da capacidade funcional, adoecimento físico e mental.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

As condições de trabalho são organizadas para não prejudicar a saúde física e mental.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Burnout e estresse**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se ao desgaste físico e emocional decorrente do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Síndrome de burnout, ansiedade, depressão, exaustão.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa monitora sinais de estresse e esgotamento e atua preventivamente.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Comportamentos ofensivos**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Transtornos mentais, sofrimento intenso, afastamentos.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

Há canais seguros para denúncia e tratamento adequado de situações de abuso.

Reconhecimento: 6.25%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

TÉCNICO ADMINISTRATIVO

Trabalhadores expostos: 21

Demandas no trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à intensidade das exigências do trabalho, incluindo volume de tarefas, pressão por tempo e ritmo de execução.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Fadiga, estresse ocupacional, exaustão mental, distúrbios do sono e risco de acidentes.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa organiza o volume de trabalho e os prazos de forma compatível com o número de trabalhadores e o tempo disponível.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Influência e desenvolvimento**BAIXO****Descrição:**

Diz respeito ao grau de controle do trabalhador sobre suas atividades e às oportunidades de desenvolvimento profissional.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico, baixa realização profissional.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

O trabalhador tem autonomia para decidir como realizar suas tarefas no dia a dia.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Significado e compromisso**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se à percepção de utilidade e propósito do trabalho, bem como ao vínculo com a organização.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desengajamento, sofrimento psíquico, perda de sentido no trabalho.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

O trabalho realizado é reconhecido como importante e com propósito claro dentro da organização.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Relações Interpessoais**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à qualidade das relações entre colegas, incluindo apoio e cooperação no ambiente de trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conflitos interpessoais, isolamento, estresse emocional.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa promove um ambiente de respeito, diálogo e convivência saudável entre os trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Liderança**BAIXO****Descrição:**

Abrange a qualidade da gestão, suporte da chefia e clareza na condução do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse ocupacional, insegurança, conflitos e sofrimento psíquico.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A liderança oferece apoio, orientação clara e acompanhamento adequado das atividades.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Satisfação no trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à avaliação global do trabalhador sobre seu trabalho e suas condições.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Desmotivação, sofrimento psíquico

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa busca manter boas condições de trabalho e um ambiente organizacional positivo.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Conflitos família e trabalho**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à interferência do trabalho na vida pessoal, especialmente pelo consumo de tempo e energia.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Estresse, exaustão, conflitos familiares, distúrbios do sono.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A organização evita jornadas excessivas e demandas que consumam tempo e energia além do razoável.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Valores no local de trabalho**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se à confiança, justiça e coerência nas práticas organizacionais e na gestão.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Sofrimento moral, desconfiança, estresse e conflitos organizacionais.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa atua com transparência e fornece informações confiáveis aos trabalhadores.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Saúde geral**BAIXO****Descrição:**

Refere-se à percepção do trabalhador sobre seu estado geral de saúde.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Redução da capacidade funcional, adoecimento físico e mental.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

As condições de trabalho são organizadas para não prejudicar a saúde física e mental.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Burnout e estresse**BAIXO****Descrição:**

Relaciona-se ao desgaste físico e emocional decorrente do trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Síndrome de burnout, ansiedade, depressão, exaustão.

Probabilidade Ajustada

1

Severidade

4**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

A empresa monitora sinais de estresse e esgotamento e atua preventivamente.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Comportamentos ofensivos**MÉDIO****Descrição:**

Refere-se à exposição a assédio, violência ou comportamentos abusivos no trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Transtornos mentais, sofrimento intenso, afastamentos.

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

4**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

Há canais seguros para denúncia e tratamento adequado de situações de abuso.

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

No que se refere à NR-17, os fatores psicossociais aqui analisados estão associados à organização do trabalho, às exigências cognitivas, ao estilo de gestão e às relações interpessoais, conforme previsto na ergonomia organizacional.

5. Considerações Finais

A presente avaliação de riscos psicossociais foi realizada com base em metodologia cientificamente fundamentada, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considerando os dados coletados, analisados e interpretados de forma técnica e sistemática. Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e a estruturação de um Plano de Ação correspondente.

Para as dimensões classificadas para inclusão no plano de ação elaborado pela organização avaliada, são apresentadas recomendações técnicas por especialistas da SSTMétrica, considerando os resultados da avaliação realizada. Cabe à organização avaliada decidir pela inclusão parcial ou integral dessas recomendações, conforme seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização.

Responsáveis Técnicos

09/06/2026

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDISON SAMPAIO
Data: 10/06/2026 06:22:00-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciências Ambientais e Saúde
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA MERCES DE LUCENA
Data: 10/06/2026 22:43:24-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações
CRP-DF: 01/8625

Fontes de Consulta

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 17: Ergonomia. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora no 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 765, de 15 de maio de 2025. Estabelece a vigência das alterações da Norma Regulamentadora no 1 referentes à inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 maio 2025.

COPSOQ NETWORK. Copenhagen Psychosocial Questionnaire (COPSOQ): International Network and Guidelines. Copenhagen, Denmark, 2021. Disponível em: <https://www.copsoq-network.org/>. Acesso em: 31 maio 2026.

FRANCHI, Maurício Rodrigues; QUADROS, Bruna Carolina de; AMARAL, Fernando Gonçalves.- Matriz de nível de risco ocupacional: proposta de um modelo segundo os requisitos normativos da Norma Regulamentadora no 01. Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho - ENIT, Brasília, v. 3, n. 1, p. 1-23, 2023.

GONÇALVES, Josiane Sotrate; MORIGUCHI, Cristiane Shinohara; CHAVES, Thaís Cristina; SATO, Tatiana de Oliveira. Cross-cultural adaptation and psychometric properties of the short version of COPSOQ II-Brazil. Revista de Saúde Pública, São Paulo, v. 55, n. 69, 2021. DOI: 10.11606/s1518-8787.2021055003123. Disponível em: <https://doi.org/10.11606/s1518-8787.2021055003123>. Acesso em: 31 maio 2026.

SAMPAIO, Francisco Edison. Absenteísmo-doença de servidores públicos: Ausências Laborais no Poder Legislativo. São Paulo: Editora Dialética, 2023. ISBN 978-65-270-1875-9.
