



DOCUMENTO TÉCNICO

PGR

PROGRAMA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS

SUMÁRIO

1. Controle de Revisões
2. Dados da Empresa Elaboradora
3. Dados do Estabelecimento / Cliente
4. Introdução e Metodologia do PGR
5. Memorial Descritivo — Obra
6. Memorial Descritivo — Áreas de Vivência
7. Base Legal e Responsabilidades
8. Definições e Critérios de Avaliação
9. Levantamento Preliminar / Identificação de Perigos
10. Avaliação de Riscos — Metodologia e Matriz
11. Controle dos Riscos — Hierarquia de Prevenção
12. AEP e Fatores de Riscos Psicossociais (FRPRT)
13. Prevenção com Máquinas e Equipamentos (NR-12)
14. Preparação para Emergências e Simulados
15. Análise de Acidentes e Doenças Relacionadas
16. Indicadores de Monitoramento e Desempenho SST
17. Plano de Ação — Medidas de Prevenção (5W2H)
18. Contratação de Prestadores de Serviços
19. Introdução de Novas Tecnologias ou Mudanças
20. Procedimentos para Registro de Acidentes
21. CIPA — Comissão Interna de Prev. de Acidentes e de Assédio
22. Segurança com Produtos Químicos (NR-26)
23. Comunicação, Capacitação e Treinamento dos Trabalhadores
24. eSocial — Obrigações Decorrentes do GRO
25. Profissional Habilitado e Responsável pelo PGR
26. Inventário de Riscos das Funções
- 26.1 Inventário de Riscos Psicossociais
27. Inventário de Riscos das Funções – Empresas Terceirizadas
28. Documentos e Projetos Obrigatórios

1. CONTROLE DE REVISÕES

DATA	DESCRIÇÃO DAS ALTERAÇÕES	REV.	ELABORAÇÃO	ACOMPANHAMENTO	RESP. IMPLEMENTAÇÃO
05/2025	Emissão inicial — PGR	0	Adriano G. / SECONCI	Mariana de Jesus Souza Ribeiro	Mariana de Jesus Souza Ribeiro
04/2026	Atualização/Revisão	1	Adriano G. / SECONC	Mariana de Jesus Souza Ribeiro	Mariana de Jesus Souza Ribeiro

2. DADOS DA EMPRESA ELABORADORA / RESPONSÁVEL TÉCNICO

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	Serviço Social da Indústria da Construção no Estado de Goiás – SECONCI GO
CNPJ	36.863.637/0001-59
Endereço	Rua C 136 Nº 681 Qd 3037 – Lotes 20 e 21 – Jardim América – Goiânia/GO
Telefone	(62) 3250-7544
Eng. Responsável	Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Registro CREA	CREA – GO n.º 101672344D-GO
Contato Direto	(62) 9 9430-0089
E-mail	segurancadotrabalho@seconcigoias.com.br

3. DADOS DO ESTABELECIMENTO / CLIENTE

CAMPO	INFORMAÇÃO
Razão Social	PORTO ARARAS I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
CNPJ	43.400.608/0001-16
Atividade Principal / CNA	(4110-7/00) Incorporação de empreendimentos imobiliários
Grau de Risco (GR)	3
Endereço	Avenida Deputado Jamel Cecílio, nº 2929, Edif Brookfield Towers Bloco B Sala 402-A21 Andar 4, Jd Goiás, Goiânia, Goiás, 74.810-100
Horário de Trabalho	Turno de segunda a segunda a quinta-feira: 07h - 17h Turno de sexta-feira: 07h-16h Horas extras: Negociadas em casos de necessidade com a equipe.
Nº Total de Trabalhadores	37
Responsável da Empresa	Maurício Figueiredo Menezes
Responsável pelo PGR (cliente)	Juarez de Campos Castro

Responsável pela Implementação	Juarez de Campos Castro
SESMT / Técnico de SST	Juarez de Campos Castro

4. INTRODUÇÃO E METODOLOGIA DO PGR

Este documento constitui o **Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR)** da organização, sendo a materialização do processo contínuo de **Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO)** exigido pela NR-01 (Capítulo 1.5), atualizada pela Portaria MTE n.º 1.419/2024. Enquanto o GRO é o macroprocesso de gestão, o PGR é o seu conjunto de documentos fundamentais, estabelecendo os procedimentos para identificação de perigos, avaliação e controle dos riscos ocupacionais para todos os trabalhadores (próprios, terceirizados e estagiários) expostos no estabelecimento.

O PGR é composto por dois documentos fundamentais, conforme exige a NR-01 subitem 1.5.6.1: (a) o **Inventário de Riscos**, que registra os perigos identificados, os riscos avaliados e as medidas de prevenção existentes por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE); e (b) o **Plano de Ação**, que estabelece as medidas a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, com indicação de responsável, prazo e recursos. Estes documentos são interdependentes: o Inventário fundamenta o Plano de Ação, e o Plano de Ação é avaliado por meio dos indicadores definidos na Seção 16.

O PGR integra-se ao Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (PCMSO — NR-07), ao qual fornece os agentes de risco identificados como subsídio para a determinação dos exames médicos periódicos. A integração é bidirecional: o PCMSO retroalimenta o PGR com agravos à saúde identificados nas avaliações médicas, gerando necessidade de revisão do Inventário de Riscos quando pertinente. O PGR também fundamenta as obrigações de envio de informações ao eSocial (eventos S-2240 e S-2245), conforme detalhado na Seção 24.

Normas regulamentadoras e referenciais técnicos que fundamentam este PGR: NR-01 (GRO), NR-05 (CIPA), NR-06 (EPI), NR-07 (PCMSO), NR-09 (Avaliação de Riscos), NR-10 (Eletricidade), NR-12 (Máquinas e Equipamentos), NR-15 (Insalubridade), NR-16 (Periculosidade), NR-17 (Ergonomia), NR-18 (Construção Civil), NR-23 (Proteção contra Incêndios), NR-24 (Condições Sanitárias), NR-26 (Sinalização de Segurança), NR-33 (Espaço Confinado), NR-35 (Trabalho em Altura), AIHA 2015 / Fundacentro (metodologia de avaliação posicional), e Manual GRO MTE 2025.

4.1 METODOLOGIA E ATUALIZAÇÃO OPERACIONAL

REQUISITO	FORMA DE ATENDIMENTO	REFERÊNCIA NR-01
Periodicidade de Revisão	Análise crítica a cada 2 anos ou quando ocorrerem modificações previstas na NR-01	Subitem 1.5.4.4.6
Gestão de Mudanças	Atualização dinâmica a cada transição de etapa construtiva ou alteração significativa em processos	Subitens 1.5.4.4.6 alíneas a–f
Ferramenta de Gestão	Ciclo PDCA e planos de ação 5W2H	Subitem 1.5.6.2
Solicitação de Revisão	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada mediante formulário específico	Subitem 1.5.4.4.6 alínea f

4.2 ABRANGÊNCIA DO GRO

- Riscos Físicos** — ruído, vibração, calor, frio, radiação não ionizante (UV solar), umidade, pressões anormais;
- Riscos Químicos** — poeiras respiráveis (sílica), fumos metálicos, gases, névoas, produtos químicos conforme FDS;
- Riscos Biológicos** — micro-organismos, vetores, agentes biológicos em fossas e solos contaminados;
- Riscos Ergonômicos** — levantamento manual de cargas, posturas inadequadas, repetitividade, monotonia;
- FRPRT** — Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17);
- Riscos de Acidentes / Eventos Perigosos** — queda de altura, queda de materiais, máquinas, eletricidade, incêndio;

- **Perigos Externos Previsíveis** — fatores externos que possam afetar a SST (NR-01 subitem 1.5.3.2).

5. MEMORIAL DESCRITIVO — OBRA / ESTABELECIMENTO

CARACTERÍSTICA	DESCRIÇÃO
Nome do Empreendimento	PORTO ARARAS I SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Tipo de Obra	Residencial
Fase Atual	Estrutura
Nº de Pavimentos	10 Pavimentos
Área Total Construída	20.629,47 m²
Equipamentos Fixos	Retro escavadeira, mini escavadeira, guindaste, caminhão munck, cremalheira,
Duração Prevista	25/03/2025 a 25/03/2028

6. MEMORIAL DESCRITIVO — ÁREAS DE VIVÊNCIA

Em conformidade com a NR-18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção), NR-24 (Condições Sanitárias e de Conforto), o Anexo 04 apresenta o módulo de dimensionamento do canteiro de obras.

★ Integração com NR-24 obrigatória. Dimensionamento deve considerar o número efetivo de trabalhadores por turno, conforme NR-18 item 18.5.

7. BASE LEGAL E RESPONSABILIDADES (NR-01 GRO)

Todos os requisitos da NR-01 foram contemplados neste PGR, especialmente o capítulo 1.5 – Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO), atualizado pela Portaria MTE nº 1.419/2024 (vigência: 26/05/2026), utilizando a metodologia de Avaliação por Multiplicação Aritmética (Probabilidade x Severidade).

7.1 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

REQUISITO NR-01	COMO ATENDER / EVIDÊNCIA	SEÇÃO NESTE PGR
1.5.2 – Levantamento Preliminar	Realizado antes do início das atividades e nas mudanças	Seção 9
1.5.3 – Identificação de Perigos	Inventário de Riscos por GHE com indicação de trabalhadores expostos	Seção 9
1.5.4 – Avaliação de Riscos	Multiplicação Aritmética (P x S) — Matriz 5x5 / Fundacentro	Seção 10
1.5.4.4.2 – Critérios Documentados	Escalas de Probabilidade e Severidade documentadas e registradas	Seção 10
1.5.5 – Controle dos Riscos	Hierarquia de medidas de prevenção + Plano de Ação 5W2H	Seção 11 / Seção 17

1.5.5.3 – Monitoramento e Desempenho	Indicadores proativos e reativos com fórmulas e metas	Seção 16
1.5.5.4 – Integração com PCMSO	Tabela de exames por agente de risco; conexão com médico do trabalho	Seção 15
1.5.5.5 – Análise de Acidentes	Procedimento completo com causa raiz (5 Porquês / Ishikawa)	Seção 15
1.5.5.6 – Preparação para Emergências	Cenários identificados + brigada constituída + exercícios simulados obrigatórios	Seção 14
1.5.6 – Documentação do PGR	Critérios, Inventário de Riscos e Plano de Ação assinados e datados	Inventário + Seção 17

7.2 MECANISMOS DE PARTICIPAÇÃO DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITENS 1.4 E 1.5.1)

REQUISITO	COMO IMPLEMENTAR	REGISTRO / EVIDÊNCIA
Participação no GRO (1.4.2.a)	Formulários de percepção de risco; inspeções com trabalhadores	Formulários preenchidos (Anexo 02)
Consulta via CIPA (1.4.2.b)	Item fixo na pauta das reuniões ordinárias da CIPA	Atas de reunião da CIPA
Comunicação dos riscos (1.4.2.c)	DDS focados nos riscos do PGR e Plano de Ação	Listas de presença dos DDS
Melhoria do desempenho (1.4.2.d)	Dashboards de SST; planos PDCA; lições aprendidas	Relatórios mensais de SST
Solicitação de revisão (1.5.4.4.6.f)	Trabalhador ou CIPA pode solicitar revisão justificada do PGR	Formulário de solicitação de revisão

7.3 RESPONSABILIDADES DOS TRABALHADORES (NR-01 SUBITEM 1.4.4)

Todos os trabalhadores, independentemente do vínculo empregatício (próprios, terceirizados ou estagiários), têm as seguintes responsabilidades no âmbito deste PGR:

- Cumprir as determinações deste PGR e das instruções de segurança aplicáveis à sua função, conforme treinamento recebido;
- Utilizar corretamente os Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) fornecidos pela organização, conservando-os em perfeito estado e comunicando ao responsável qualquer avaria, vencimento ou necessidade de substituição;
- Comunicar imediatamente ao supervisor imediato e ao Técnico de SST qualquer situação de risco grave e iminente, quase-acidente ou condição insegura identificada no canteiro, sem aguardar autorização para tal;
- Participar obrigatoriamente dos treinamentos, Diálogos Diários de Segurança (DDS) e exercícios simulados programados pela organização, assinando as respectivas listas de presença;
- Colaborar ativamente com a identificação de perigos e com as inspeções de segurança realizadas pela equipe de SST e pela CIPA, respondendo a questionários e percepções de risco quando solicitado;
- Zelar pela ordem e limpeza do posto de trabalho, contribuindo com as práticas de 5S e as medidas de controle administrativo estabelecidas neste PGR;
- Recusar a execução de atividades que coloquem em risco grave e iminente a sua própria segurança ou a de terceiros, comunicando imediatamente o fato ao superior imediato e ao SST (NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158 da CLT).

★ O trabalhador que recusar a execução de atividade em condição de risco grave e iminente não poderá sofrer retaliação, penalidade ou qualquer forma de discriminação, conforme NR-01 subitem 1.4.4.1 e artigo 158, parágrafo único, da CLT.

7.4 ATRIBUIÇÕES DO SESMT / TÉCNICO DE SST (NR-01 SUBITEM 1.4.3)

Cabe ao SESMT ou ao Técnico de SST **subsidiar, orientar e assessorar tecnicamente** a organização no cumprimento das obrigações de SST, tendo como principais atribuições:

- **Subsidiar a elaboração:** fornecer suporte técnico para a criação, monitoramento e revisão do Inventário de Riscos e do Plano de Ação, em conjunto com o Engenheiro de Segurança responsável (SECONCI GOIÁS);

- **Orientar a prevenção:** realizar inspeções técnicas periódicas no canteiro para identificar desvios e orientar as equipes sobre as medidas corretivas necessárias;
- **Promover a capacitação:** ministrar ou coordenar os Diálogos Diários de Segurança (DDS), as integrações de novos trabalhadores e os treinamentos obrigatórios previstos;
- **Assessorar em acidentes:** conduzir tecnicamente a investigação de acidentes e incidentes, fornecendo subsídios para a análise de causas e sugestão de medidas preventivas;
- **Monitorar registros:** apoiar a organização na manutenção e atualização dos registros de entrega de EPIs e dos prontuários de SST dos trabalhadores;
- **Apoiar a CIPA:** participar das reuniões da CIPA, fornecendo dados técnicos e orientando o cumprimento das recomendações da comissão;
- **Consolidar indicadores:** organizar os indicadores de SST da Seção 16 e reportá-los mensalmente à direção da obra para subsidiar a tomada de decisão.

7.5 RESPONSABILIDADES DA ORGANIZAÇÃO / EMPREGADOR (NR-01 SUBITEM 1.4.1)

Cabe à organização, conforme as diretrizes da NR-01 e do Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO):

- **Implementar o GRO:** garantir que o Gerenciamento de Riscos Ocupacionais seja efetivo em todas as etapas da obra, provendo os recursos necessários;
- **Cumprir as Normas:** cumprir e fazer cumprir as disposições legais e regulamentares sobre segurança e saúde no trabalho;
- **Informar os Trabalhadores:** informar aos trabalhadores sobre os riscos ocupacionais existentes nos locais de trabalho, as medidas de prevenção adotadas e os resultados das avaliações ambientais;
- **Elaborar Ordens de Serviço:** elaborar ordens de serviço sobre segurança e saúde no trabalho, dando ciência aos trabalhadores;
- **Permitir a Interrupção do Trabalho:** permitir que o trabalhador interrompa suas atividades quando constatar uma situação de trabalho que, por motivos razoáveis, considere envolver um risco grave e iminente para sua vida ou saúde;
- **Garantir a Integração:** assegurar que as empresas contratadas (terceirizadas) recebam informações sobre os riscos ocupacionais e as medidas de prevenção do canteiro de obras.

8. DEFINIÇÕES E CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DE RISCOS

8.1 DEFINIÇÕES FUNDAMENTAIS (NR-01 / MANUAL GRO MTE 2025)

TERMO	DEFINIÇÃO
Perigo	Fonte com potencial de causar lesão ou agravo à saúde. Pode ser situação, objeto, substância ou comportamento (NR-01 subitem 1.3.2.1).
Risco Ocupacional	Combinação da probabilidade de ocorrência de lesão ou agravo à saúde com a severidade dessas lesões, decorrentes da exposição a um perigo (NR-01 subitem 1.3.2.2).
GRO	Gerenciamento de Riscos Ocupacionais: conjunto de medidas para gestão dos riscos, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação (NR-01 subitem 1.5.1).
PGR	Programa de Gerenciamento de Riscos: documento do GRO composto pelo Inventário de Riscos e Plano de Ação (NR-01 subitem 1.5.6).
GHE	Grupo Homogêneo de Exposição: trabalhadores com perfil de exposição similar a determinados agentes ocupacionais.
LEO / OEL / LT	Limite de Exposição Ocupacional (NR-09 revisada) — equivalente ao OEL (AIHA) e TLV-TWA (ACGIH). Parâmetro de referência quantitativa. Limite de Tolerância (LT): valor máximo permitido pela NR-15.
EPC / EPI	EPC: Equipamento de Proteção Coletiva. EPI: Equipamento de Proteção Individual — CA válido obrigatório, conforme NR-06.

PCMSO	Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (NR-07): integrado ao PGR para monitoramento da saúde dos trabalhadores.
FRPRT	Fatores de Riscos Psicossociais Relacionados ao Trabalho — obrigatório no GRO a partir de 26/05/2026 (NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17).

8.2 ESCALA DE PROBABILIDADE (AIHA 2015 / FUNDACENTRO — ESCALA NUMÉRICA)

NÍVEL	CATEGORIA	AVALIAÇÃO QUANTITATIVA (% LEO/OEL)	AVALIAÇÃO QUALITATIVA (CONTROLES EXISTENTES)
1	Rara	Exposição < 10 % do LEO	Controle excelente – melhor tecnologia disponível; exposição improvável
2	Pouco Provável	10 % < Exposição ≤ 50 % do LEO	Controle em conformidade legal, mantido e monitorado adequadamente
3	Possível	50 % < Exposição ≤ 100 % do LEO	Controle adequado com pequenas deficiências; exposição controlável
4	Provável	100 % < Exposição ≤ 500 % do LEO	Controle incompleto ou com deficiências relevantes; exposição frequente
5	Muito Provável	Exposição > 5× LEO	Controle inexistente ou totalmente inadequado; exposição certa/contínua

★ Os critérios quantitativo e qualitativo são **alternativos e equivalentes** — não devem ser somados ou combinados. A metodologia AIHA 2015 / Fundacentro é baseada na multiplicação aritmética (P x S).

8.3 ESCALA DE SEVERIDADE (AIHA 2015)

NÍVEL	CATEGORIA	DANO À SAÚDE / INTEGRIDADE	DANO AO PROCESSO / PATRIMÔNIO
1	Leve (Insignificante)	Lesão leve sem necessidade de atenção médica; incômodo passageiro; sem afastamento.	Perda financeira insignificante; sem interrupção do processo.
2	Baixa (Menor)	Lesão ou doença séria reversível; afastamento temporário; sem sequelas permanentes.	Dano material de baixo custo; interrupção breve e localizada.
3	Moderada	Lesão ou doença crítica irreversível que pode limitar a capacidade funcional; sequelas permanentes parciais.	Interrupção parcial das atividades; dano material relevante.
4	Alta	Lesão ou doença incapacitante permanente ou mortal (até 10 trabalhadores).	Paralisação significativa; dano patrimonial alto; impacto reputacional.
5	Extrema (Catastrófica)	Mortes ou incapacidades múltiplas (mais de 10 trabalhadores) — acidente ampliado.	Paralisação total; dano irreversível; impacto social e legal grave.

★ NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam **documentados e registrados**. As Seções 8.2 e 8.3 constituem o registro formal e obrigatório dos critérios adotados pelo GRO desta organização, em conformidade com a referida exigência legal.

9. LEVANTAMENTO PRELIMINAR / IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS

9.1 LEVANTAMENTO PRELIMINAR (NR-01 SUBITEM 1.5.2)

O levantamento preliminar de perigos deve ser realizado: (a) antes do início do funcionamento do estabelecimento ou novas instalações; (b) para as atividades existentes; (c) nas mudanças e introdução de novos processos ou atividades de trabalho.

9.2 IDENTIFICAÇÃO DE PERIGOS (NR-01 SUBITEM 1.5.3)

GRUPO DE RISCO	EXEMPLOS DE PERIGOS / AGENTES IDENTIFICADOS
FÍSICO	Ruído, Vibração (mãos-braços e corpo inteiro), Calor (IBUTG), Frio, Radiação Não Ionizante (UV Solar, laser), Umidade, Pressões Anormais
QUÍMICO	Poeiras (respirável, sílica livre cristalina), Fumos Metálicos (soldagem), Gases e Vapores, Névoas, Produtos Químicos (FDS/SDS obrigatória — NR-26)
BIOLÓGICO	Micro-organismos patogênicos, Vetores e pragas, Agentes biológicos em fossas, solos contaminados e resíduos orgânicos
ERGONÔMICO	Levantamento e transporte manual de cargas (>23 kg — NR-17), Posturas inadequadas e forçadas, Repetitividade/Monotonia, Ritmo excessivo de trabalho — <i>Psicossociais (FRPRT)</i> : Sobrecarga de trabalho, Falta de autonomia, Suporte social insuficiente, Assédio moral/sexual, Insegurança no trabalho, Conflitos de papéis — obrigatório a partir de 26/05/2026
ACIDENTE / EVENTO PERIGOSO	Queda de Altura (NR-35), Queda de Materiais, Máquinas sem proteção (NR-12), Eletricidade (NR-10), Incêndio/Explosão, Soterramento, Cortes e perfurações
ESPAÇO CONFINADO (NR-33)	Deficiência ou enriquecimento de oxigênio, gases tóxicos e inflamáveis, soterramento e afogamento em fundações profundas, cisternas, galerias, poços e caixas de inspeção — verificar obrigatoriedade de PTE (Permissão de Trabalho em Espaço Confinado)
PERIGOS EXTERNOS	Condições climáticas extremas, vizinhança industrial, tráfego de veículos adjacente, interferências de terceiros no canteiro (NR-01 subitem 1.5.3.2)

9.3 CRITÉRIOS PARA REVISÃO DA AVALIAÇÃO DE RISCOS (NR-01 SUBITEM 1.5.4.4.6)

#	GATILHO DE REVISÃO
1	Após implementação de medidas de prevenção — avaliação dos riscos residuais
2	Após mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho
3	Quando identificadas ineficácias das medidas de prevenção vigentes
4	Na ocorrência de acidentes, incidentes ou doenças relacionadas ao trabalho
5	Quando houver mudança nos requisitos legais aplicáveis
6	Mediante solicitação justificada dos trabalhadores ou da CIPA

Periodicidade máxima: a cada 2 anos ou até 3 anos para organizações com certificação em sistema de gestão de SST reconhecido pelo MTE.

10. AVALIAÇÃO DE RISCOS OCUPACIONAIS — METODOLOGIA E MATRIZ

10.1 FUNDAMENTO METODOLÓGICO — MULTIPLICAÇÃO ARITMÉTICA (P X S)

A avaliação de riscos adota a metodologia **AIHA 2015 / AS-NZS 4360 / BS 8800**, implementada por meio da **Multiplificação Aritmética (P x S)** — o nível de risco é determinado pelo produto exato da Probabilidade pela Severidade (P x S). As escalas de Probabilidade e Severidade utilizadas estão integralmente documentadas na Seção 8 deste PGR, em atendimento ao subitem 1.5.4.4.2 da NR-01.

10.2 MATRIZ DE RISCO 5x5 (MULTIPLICAÇÃO P X S)

Irrelevante Baixo Moderado Alto Crítico

PROB. / SEV.	SEV 1 — LEVE	SEV 2 — BAIXA	SEV 3 — MODERADA	SEV 4 — ALTA	SEV 5 — EXTREMA
Prob 5 — Muito Provável	MODERADO (5)	ALTO (10)	ALTO (15)	CRÍTICO (20)	CRÍTICO (25)
Prob 4 — Provável	MODERADO (4)	MODERADO (8)	ALTO (12)	ALTO (16)	CRÍTICO (20)
Prob 3 — Possível	BAIXO (3)	MODERADO (6)	MODERADO (9)	MODERADO (12)	ALTO (15)
Prob 2 — Pouco Provável	BAIXO (2)	BAIXO (4)	MODERADO (6)	MODERADO (8)	MODERADO (10)
Prob 1 — Rara	IRRELEVANTE (1)	BAIXO (2)	BAIXO (3)	BAIXO (4)	MODERADO (5)

10.3 NÍVEL DE RISCO E AÇÕES REQUERIDAS (NR-01 SUBITEM 1.5.5.1)

NÍVEL DE RISCO	REFERÊNCIA	CLASSIFICAÇÃO	AÇÃO REQUERIDA
IRRELEVANTE	1	Aceitável	Manter controles existentes.
BAIXO	2, 3, 4*	Aceitável	Melhorias de baixo custo quando possível; verificar que controles estão mantidos.
MODERADO	4*, 5, 6, 8, 9, 10*, 12*	Atenção	Elaborar Plano de Ação com prazo definido; implementar controles adicionais em prazo razoável.
ALTO	10*, 12*, 15, 16	Urgente	Não iniciar a atividade sem controles adequados. Plano de Ação imediato com prazo curto.
CRÍTICO	20, 25	PARALISAÇÃO	PARALISAR a atividade IMEDIATAMENTE. Implementar controles eficazes antes de qualquer reinício.

★ **Nota (*):** Devido à assimetria da matriz, produtos 4, 10 e 12 possuem classificações distintas conforme a origem P×S — verificar diretamente na Matriz 10.2. NR-01 subitem 1.5.4.4.2 exige que os critérios de avaliação sejam documentados. Esta seção constitui o registro formal dos critérios adotados pelo GRO desta organização.

11. CONTROLE DOS RISCOS — HIERARQUIA DE MEDIDAS DE PREVENÇÃO

As medidas de prevenção devem seguir obrigatoriamente a hierarquia estabelecida na NR-01 subitem 1.5.5.1.2. O EPI é **sempre o último recurso** e deve ser justificado quando EPCs são inviáveis ou insuficientes.

ORDEM	MEDIDA	DESCRIÇÃO	EXEMPLO — CANTEIRO DE OBRAS
1ª	Eliminação	Remover completamente o perigo do processo produtivo	Eliminar etapa com exposição a agente cancerígeno; suprimir subida em andaime redesenhando o processo
2ª	Substituição	Substituir por agente, processo ou equipamento menos perigoso	Trocar produto químico por similar menos tóxico; substituir corte manual por equipamento mecanizado
3ª	Controles de Engenharia (EPC)	Barreiras físicas, enclausuramento, ventilação localizada, isolamento da fonte	Proteções em máquinas NR-12; linhas de vida fixas (NR-35); aspiração localizada; guarda-corpos
4ª	Controles Administrativos	Procedimentos, treinamentos, rodízio de postos, sinalização, limitação de tempo de exposição	DDS diário; NR-35 AR/PT; procedimento LOTO (NR-12); rotação de postos; 5S no canteiro
5ª	EPI — Último Recurso	Proteção individual complementar ou emergencial — apenas quando EPCs são inviáveis ou insuficientes	Capacete, cinturão tipo paraquedista, respirador (CA válido — NR-06); protetor auricular conforme dosimetria

12. AEP E FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS (FRPRT)

12.1 AVALIAÇÃO ERGONÔMICA PRELIMINAR (AEP) — NR-17 ART. 17.3.1.2

ÁREA DE AVALIAÇÃO	ASPECTOS VERIFICADOS	RESULTADO ESPERADO
1. Organização do trabalho	Jornada, ritmo, pausas, pressão por produtividade, autonomia	Identificação de sobrecarga e fatores psicossociais
2. Condições ambientais	Temperatura, ruído, iluminação, umidade, qualidade do ar	Subsídio para avaliação dos riscos físicos
3. Posto de trabalho e equipamentos	Layout, ferramentas, dimensões, adequação ao trabalhador	Identificação de inadequações posturais
4. Carga mental / cognitiva	Complexidade das tarefas, atenção requerida, monotonia	Avaliação da carga cognitiva e mental
5. FRPRT	Suporte social, assédio, insegurança, conflitos de papel	Obrigatório a partir de 26/05/2026 — NR-01/NR-17

12.2 FATORES DE RISCOS PSICOSSOCIAIS RELACIONADOS AO TRABALHO (FRPRT)

⚠ A partir de **26/05/2026**, a organização deve avaliar e gerenciar os FRPRT no âmbito do GRO, conforme NR-01 subitem 1.3.4.1 c/c NR-17 e Guia de Riscos Psicossociais MTE (abril/2025).

FATOR PSICOSSOCIAL (FRPRT)	DESCRIÇÃO / COMO AVALIAR	INSTRUMENTO SUGERIDO
Sobrecarga de trabalho	Excesso de demandas, jornadas extensas, pressão por produtividade	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Falta de autonomia e controle	Pouco controle sobre o próprio trabalho, supervisão excessivamente rígida	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Suporte social insuficiente	Baixo suporte de colegas e liderança; isolamento	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Assédio moral / sexual	Qualquer forma de assédio no ambiente de trabalho	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Insegurança no trabalho	Medo de demissão, instabilidade contratual, incerteza sobre o futuro	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS
Conflitos e ambiguidade de papéis	Ambiguidade de função, exigências contraditórias	COPSOQ II-BR (Versão Curta) ou AQUALI-RPS

12.3 AET — QUANDO NECESSÁRIA

Quando a AEP identificar riscos ergonômicos (incluindo FRPRT) com classificação **Moderado ou superior**, a organização deverá contratar Análise Ergonômica do Trabalho (AET) detalhada por profissional habilitado, conforme NR-17 item 17.3.1.3.

13. PREVENÇÃO DE ACIDENTES COM MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS (NR-12)

MÁQUINA / EQUIPAMENTO	LOCAL	PROTEÇÕES NR-12 (EPC)	DOCUMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA	LOTO
Betoneira		Proteção da coroa dentada; botão de parada de emergência; proteção dos pontos de aprisionamento	Manual; registro de manutenção preventiva; treinamento do operador	Procedimento de cadeamento e bloqueio
Serra Circular de Bancada		Protetor superior regulável; divisor de corte; empurrador; capuz de aspiração	NR-12 Checklist; CA dos EPIs; dossiê NR-18	Procedimento de desligamento antes de manutenção
Grua / Guincho		Limitadores de carga e de curso; proteção da cabine; dispositivo anticaída do cabo	Certificado ART; inspeção periódica; treinamento operador e sinaleiro	Procedimento de isolamento para manutenção
Elevador de Obra (Cremalheira)		Trava de segurança; portas nas paradas; limitador de carga e velocidade; para-choque	ART de instalação; inspeção mensal; dossiê NR-18; SPDA	Procedimento de bloqueio de manutenção

★ NR-12 item 12.135: o procedimento LOTO é obrigatório para todas as máquinas que requeiram manutenção com energias residuais. O dossiê por máquina deve ser mantido atualizado no canteiro.

14. PREPARAÇÃO PARA EMERGÊNCIAS E EXERCÍCIOS SIMULADOS

14.1 CENÁRIOS DE EMERGÊNCIA IDENTIFICADOS

CENÁRIO	PROBABILIDADE	MEDIDAS DE RESPOSTA	RESPONSÁVEL
Queda de Altura	Média	Primeiros socorros; SAMU 192; isolamento da área; comunicação ao SST; AR/análise de causas	Técnico SST / Encarregado
Incêndio / Explosão	Baixa-Média	Extinção com extintores adequados; abandono; ponto de encontro; CBMGO 193; brigada	Brigada de Incêndio
Soterramento	Baixa	Paralisação imediata; resgate especializado; CBMGO 193; não mover a vítima sem orientação	Encarregado / SST / CBMGO
Choque Elétrico	Baixa	Desligar energia (LOTO); PCR se necessário; SAMU 192; afastar vítima com material isolante	Eletricista NR-10 / SST
Acidente com Máquinas	Baixa-Média	Desligar equipamento; primeiros socorros; SAMU 192; preservar cena; emitir CAT	Operador / Encarregado / SST
Acidente Ampliado / Grande Magnitude	Muito Baixa	Plano de Emergências de Grande Magnitude (subitem 1.5.5.6.2); acionamento de Defesa Civil; comunicação ao MTE	SST / Engenheiro / Diretoria

14.2 BRIGADA DE INCÊNDIO — CONSTITUIÇÃO E REQUISITOS (NR-23 / IT-17 CBMGO)

A Brigada de Incêndio é obrigatória nos canteiros de obras em conformidade com a NR-23 e com a Instrução Técnica do Corpo de Bombeiros Militar de Goiás (IT-17 CBMGO). Sua constituição, treinamento e manutenção são responsabilidade do empregador, devendo atender aos seguintes requisitos mínimos:

- **Dimensionamento:** mínimo de [X] brigadistas, calculado conforme o número de trabalhadores por turno e o risco de incêndio do canteiro, observando a IT-17 CBMGO e a NR-23;
- **Treinamento teórico-prático:** carga horária mínima conforme IT-17 CBMGO, incluindo: prevenção e combate a incêndio com extintores portáteis, abandono de área, primeiros socorros básicos (RCP e DEA), e comunicação de emergência;
- **Periodicidade de reciclagem:** anual, ou sempre que houver renovação de mais de 50% dos brigadistas ou mudança de fase construtiva que altere o perfil de risco;
- **Registros obrigatórios:** lista de presença dos treinamentos, certificados individuais, designação formal dos brigadistas (portaria ou ato equivalente) e escala de cobertura por turno;
- **Equipamentos da brigada:** mapa de localização dos extintores, mangueiras e hidrantes (se houver), kit de primeiros socorros, rádio comunicador e dispositivo de alarme sonoro;
- **Ponto de encontro:** definir e sinalizar, no canteiro, o ponto de encontro para reunião dos trabalhadores após abandono de área, com distância segura da edificação.

⚠ A ausência de Brigada de Incêndio constituída e treinada configura não conformidade com a NR-23 e pode resultar em autuação fiscal.

14.3 DOCUMENTAÇÃO E EXERCÍCIOS SIMULADOS

AÇÃO	DESCRIÇÃO	FREQUÊNCIA	REGISTRO
Exercício Simulado (OBRIGATÓRIO)	Simulação de abandono e/ou emergência médica com avaliação de desempenho	Anual (mínimo) — NR-01 subitem 1.5.5.6.3	Relatório de exercício simulado assinado
Treinamento da Brigada	Primeiros socorros, combate a incêndio conforme CBMGO	Anual / conforme CBMGO	Lista de presença; certificado
Inspeção de Equipamentos de Emergência	Extintores, macas, kits de primeiros socorros	Mensal	Checklist de inspeção assinado

Atualização do Quadro de Emergências	SAMU 192, CBMGO 193, hospital de referência	Semestral	Quadro fixado em local visível no canteiro
Plano de Grande Magnitude	Eventos com potencial de múltiplas vítimas ou grandes perdas	Revisão anual	Documento aprovado; ART (se aplicável)

15. ANÁLISE DE ACIDENTES E DOENÇAS RELACIONADAS AO TRABALHO

O procedimento abaixo estabelece as 7 etapas obrigatórias para investigação de acidentes de trabalho, incidentes (quase-acidentes) e doenças relacionadas ao trabalho, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.5.5. O procedimento deve ser do conhecimento de todos os trabalhadores e da CIPA, e deve estar afixado no canteiro em local de fácil acesso. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos.

#	ETAPA	DETALHAMENTO E RESPONSÁVEL
1	Notificação Imediata	Comunicar ao Técnico de SST e responsável da obra imediatamente após o evento. Emitir Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT) em até 1 dia útil para acidentes com afastamento ou óbito (Lei n.º 8.213/91, art. 22). Para quase-acidentes, preencher o Registro de Quase-Acidente (Near Miss) no mesmo dia. <i>Responsável: Encarregado / Técnico de SST.</i>
2	Preservação da Cena	Não alterar o local do acidente até a realização da análise inicial pelo Técnico de SST, salvo risco imediato de novos acidentes ou necessidade de atendimento médico de urgência . Realizar registro fotográfico e croqui da cena o mais rapidamente possível. <i>Responsável: Encarregado / SST.</i>
3	Coleta de Dados e Evidências	Contextualização completa do cenário; coleta de depoimentos da vítima (quando possível), preposto e testemunhas — preferencialmente de forma independente. Levantamento de Análises de Risco (ARs), Permissões de Trabalho (PTTs), fichas de entrega de EPI, registros de treinamento, histórico de manutenção de equipamentos e ordens de serviço. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
4	Análise de Causa Raiz	Aplicar o método dos 5 Porquês para causas diretas e o Diagrama de Ishikawa (Causa-Efeito) para mapeamento sistêmico. Identificar e documentar: (a) causas imediatas — ato inseguro ou condição insegura que diretamente causou o evento; (b) causas básicas — fatores pessoais ou de trabalho que geraram as causas imediatas; (c) causa raiz — falha sistêmica de gestão ou processo que originou toda a cadeia causal. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
5	Elaboração do Relatório de Investigação	Redigir Relatório de Investigação de Acidente (RIA) contendo: descrição cronológica do evento, caracterização da vítima e do posto de trabalho, evidências coletadas, árvore de causas, diagrama de Ishikawa, avaliação das medidas de prevenção existentes e sua eficácia, conclusão sobre a causa raiz identificada. O RIA deve ser assinado pelo Técnico de SST e pelo Engenheiro de Segurança. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
6	Plano de Ação Corretivo	Elaborar ações corretivas e preventivas para eliminar ou controlar as causas identificadas, seguindo a hierarquia de medidas de prevenção da Seção 11. Cada ação deve ser inserida no Plano de Ação do PGR (Seção 17) com: descrição da ação, responsável, prazo de implementação e indicador de verificação. <i>Responsável: Técnico de SST / Gestão da Obra.</i>

7	Revisão do PGR e Comunicação	Rever obrigatoriamente o Inventário de Riscos e as medidas de prevenção afetadas pelo evento (gatilho NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea d). Comunicar os resultados da investigação, as causas identificadas e as ações corretivas adotadas a todos os trabalhadores que atuem em atividades similares, preferencialmente em DDS específico, com lista de presença. Encaminhar cópia do RIA à CIPA. <i>Responsável: Técnico de SST.</i>
---	------------------------------	--

★ Todos os registros de acidentes, incidentes e relatórios de investigação devem ser arquivados por no mínimo 5 (cinco) anos e devem estar disponíveis para auditoria do MTE a qualquer tempo. A comunicação do acidente ao eSocial (evento S-2210) deve ser feita no prazo legal.

16. INDICADORES DE MONITORAMENTO E DESEMPENHO EM SST

16.1 INDICADORES PROATIVOS (PREVENÇÃO)

INDICADOR	FÓRMULA / CÁLCULO	META	FREQUÊNCIA
Taxa de conclusão do Plano de Ação	(Ações concluídas / Total de ações) × 100	≥ 80 %	Mensal
Cobertura de DDS realizados	(DDS realizados / DDS programados) × 100	≥ 95 %	Mensal
Treinamentos em SST concluídos	(Trabalhadores treinados / Total expostos) × 100	100 %	Trimestral
Inspeções de segurança realizadas	(Inspeções realizadas / Programadas) × 100	100 %	Semanal
Ações corretivas atendidas	(Ações corrigidas / Não conformidades abertas) × 100	≥ 90 %	Mensal
EPIs entregues com recibo	(EPIs com recibo / Total EPIs entregues) × 100	100 %	Contínuo
Exercícios simulados realizados	Nº realizados / Nº programados	100 % (mín. 1/ano)	Anual

16.2 INDICADORES REATIVOS (HISTÓRICO DE EVENTOS)

INDICADOR	FÓRMULA	META	FREQUÊNCIA
Taxa de Frequência de Acidentes (TF)	(Nº acidentes com afastamento × 1.000.000) / HH trabalhadas	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Gravidade (TG)	(Dias perdidos + debitados × 1.000.000) / HH trabalhadas	0 (meta zero)	Mensal
Taxa de Incidência de Doenças Ocupacionais	(Nº casos × 1.000) / Nº trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral
Quase-acidentes (near miss)	Número absoluto de quase-acidentes reportados	Tendência crescente (cultura de reporte)	Mensal
Absenteísmo por causas ocupacionais	(Dias afastamento ocup. / Dias totais trabalhados) × 100	< 2 %	Mensal
Índice de Gravidade de DORT/LER	Casos confirmados por 100 trabalhadores	Tendência decrescente	Semestral

i OBSERVAÇÃO — CARÁTER MERAMENTE SUGESTIVO

Os indicadores, fórmulas e metas apresentados nesta seção **não têm caráter obrigatório** e representam exclusivamente uma **sugestão técnica** fundamentada nas boas práticas de Segurança e Saúde no Trabalho (SST). A empresa contratante **não está obrigada a segui-los**, podendo adotar indicadores distintos, redefinir metas, alterar frequências ou substituir este conjunto por metodologia própria, conforme sua realidade organizacional. O único requisito legal aplicável é o monitoramento mínimo do GRO previsto na **NR-01 (subitem 1.5.7)**. A adoção de um sistema estruturado de indicadores é fortemente recomendada como boa prática de gestão, mas a escolha dos instrumentos é prerrogativa exclusiva da organização.

17. PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS DE PREVENÇÃO (5W2H)

Este Plano de Ação consolida as medidas de prevenção a serem introduzidas, aprimoradas ou mantidas, vinculadas ao Inventário de Riscos (Anexo I), em conformidade com a NR-01 subitem 1.5.6.1, alínea "b". Adota-se a abordagem **PDCA (Plan, Do, Check and Act)**, largamente utilizada nos sistemas de gestão de segurança e saúde ocupacional.

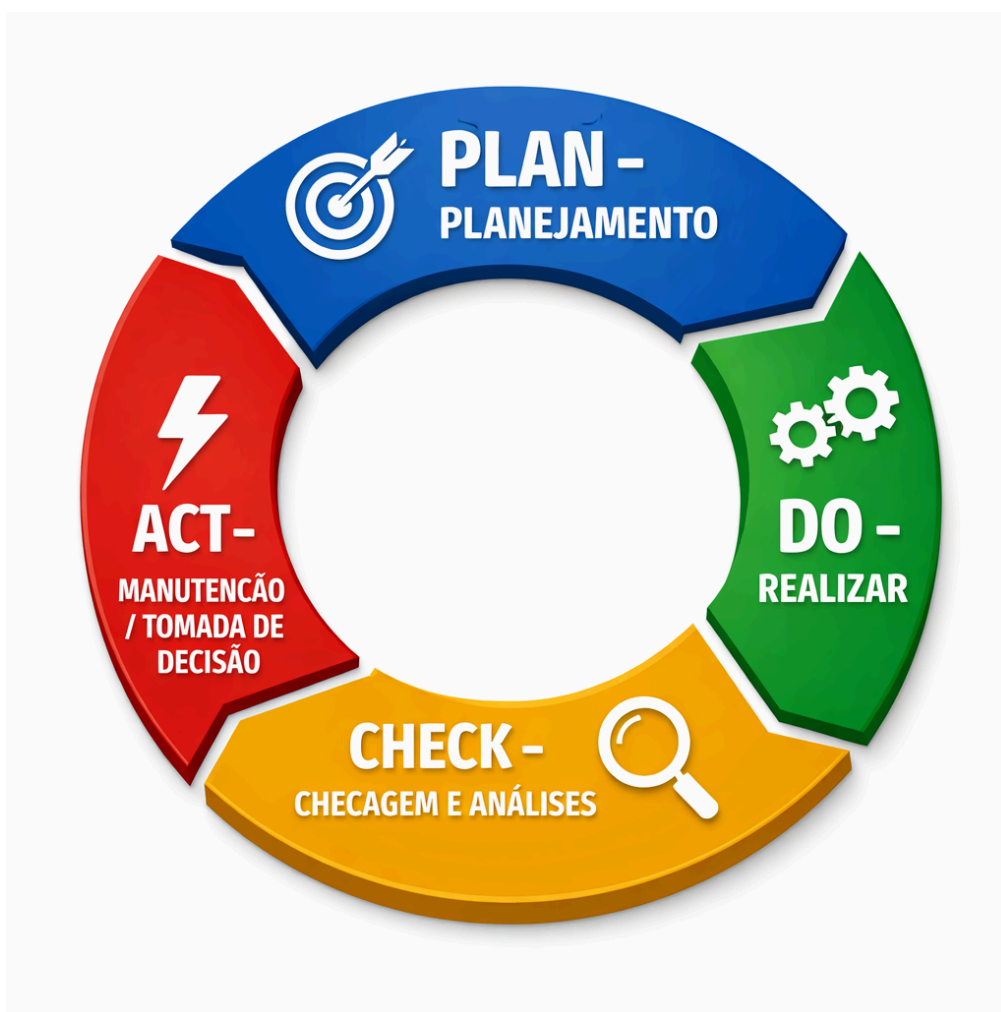


Figura: Metodologia PDCA aplicada ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.

17.1 PLANO DE AÇÃO — MEDIDAS POR GHE / RISCO (METODOLOGIA PDCA)

SELEZIONE A FASE DA OBRA:

FASE INICIAL



* *Filtra as ações recomendadas para cada etapa.*

PRAZO INÍCIO / FINAL	AÇÃO / PERIGO	PLAN (PLANEJAR)	DO (REALIZAR)	CHECK (CHECAR)	ACT (MANUTENÇÃO)	STATUS																																																										
—/—/—	COMUNICAÇÃO PRÉVIA DE OBRA	Verificar responsável para realizar a comunicação antes do início das atividades.	Fazer a Comunicação Prévia no sistema SIT antes do início das atividades.	Verificar o protocolo e arquivar cópia.	Não aplicável – atividade única.																																																											
—/—/—							—/—/—	ELABORAÇÃO DO PCMSO	Alinhar com elaborador do PGR o fornecimento do documento base.	Enviado ao Médico Responsavel pelo PCMSO.	Verificar o documento e exames.	Manutenção do documento e adendos de novos colaboradores.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO	Planejar, projetar e executar conforme projeto e NR-18.	Realizar e aplicar conforme itens normativos.	Verificar compatibilidade do plano com as estruturas.	Modificar (se necessário) e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ
—/—/—	ELABORAÇÃO DO PCMSO	Alinhar com elaborador do PGR o fornecimento do documento base.	Enviado ao Médico Responsavel pelo PCMSO.	Verificar o documento e exames.	Manutenção do documento e adendos de novos colaboradores.																																																											
—/—/—							—/—/—	INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO	Planejar, projetar e executar conforme projeto e NR-18.	Realizar e aplicar conforme itens normativos.	Verificar compatibilidade do plano com as estruturas.	Modificar (se necessário) e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—		
—/—/—	INSTALAÇÃO DO GUARDA CORPO	Planejar, projetar e executar conforme projeto e NR-18.	Realizar e aplicar conforme itens normativos.	Verificar compatibilidade do plano com as estruturas.	Modificar (se necessário) e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—										
—/—/—	LINHA DE VIDA (EPC) OU SPIQ	Projetar proteção coletiva e ancoragem individual.	Montar linha de vida nos perímetros interno e externo.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																		
—/—/—	ÁREAS DE VIVÊNCIA E LAYOUT	Projetar e dimensionar conforme NR-18.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																										
—/—/—	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS PROVISÓRIAS	Cotar e/ou providenciar elaboração do prontuário e projetos.	Realizar margeando pico máximo na etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																																		
—/—/—	PROJETOS DE PROTEÇÃO COLETIVA	Cotar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—	—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																																										
—/—/—	ANÁLISE ERGONÔMICA DO TRABALHO	Cotar por etapa, levantamento em campo e diretrizes NR-17.	Executar o documento e planos de ação.	Checar a eficácia e monitorar afastamentos.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—							—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.		—/—/—																																																		
—/—/—	PROJETO DE PROTEÇÃO SPIQ	Cotar e/ou realizar os projetos por etapa ou todos.	Executar todos necessários da etapa atual.	Verificar compatibilidade entre projeto e execução.	Adequar os locais se necessário e manter atualizado.																																																											
—/—/—																																																																

	CONSULTAR TRABALHADORES (CIPA)	Verificar formulário e realizar de forma individual.	Fornecer e realizar a consulta com o formulário.	Verificar informações e gerar plano de ações.	Executar ações necessárias e continuar com novos colaboradores.	
	MATERIAIS DE PRIMEIROS SOCORROS	Verificar indicação e manter caixa em conformidade.	Realizar aquisição e posicionar estrategicamente.	Verificar compatibilidade e datas de vencimento.	Repor materiais e manter controle de validade.	
	PLANO DE AÇÕES EMERGENCIAIS	Cotar o plano para a etapa atual – simulados e práticas.	Realizar plano e capacitação.	Verificar compatibilidade e avaliar treinamento.	Manter brigadistas em número suficiente e plano atualizado.	
	EPI - FORNECIMENTO E CONTROLE	Verificar e levantar EPIs com Aprovação MTE.	Comprar conforme especificação necessária.	Verificar compatibilidade e avaliar treinamento.	Manter estoque mínimo e trocar se necessário.	
	PROCEDIMENTOS TRABALHO EM ALTURA	Cotar, manter ou atualizar procedimentos.	Validar, anexar e treinar equipe.	Checar as informações e compatibilidade.	Embargar atividades em risco grave e manter inspeção diária.	
	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	Analisar local para ambiente coberto e iluminação.	Montar e manter em conformidade (NR 10, 12, 18).	Validar local e verificar frequência indicada.	Manter em conformidade e reavaliar em mudança de local.	
	ORDEM DE SERVIÇO	Verificar funções e antecipar elaboração (NR-01).	Montar e manter arquivadas.	Validar as informações contidas.	Adequar se necessário em caso de novas funções.	
	LAUDO DE ATERRAMENTO	Planejar laudo de aterramento.	Seguir execução conforme projeto.	Verificar se projeto está conforme execução.	Manter execução e realizar verificação mensal.	
	MOBILIÁRIO ADMINISTRATIVO (NR-17)	Cotar e realizar análise ergonômica AET.	Seguir o que está previsto na AET.	Verificar mensalmente se a mobília está adequada.	Se inadequada, ajustar mobiliário.	
	COBRAR USO DE EPI	Planejar rotina de inspeção sobre o uso.	Entregar e cobrar o uso do EPI.	Inspeção diária.	Aplicar medidas disciplinares se necessário.	
	ORGANIZAÇÃO NOS ACESSOS	Planejar rotina de inspeção para cobrar organização.	Manter os locais de acesso desobstruídos.	Inspeção diária.	Aplicar medidas administrativas se necessário.	

__/__/__	IDENTIFICAÇÃO DE INFLAMÁVEIS	Planejar rotina de inspeção para cobrar separação.	Manter produtos inflamáveis separados e identificados.	Inspeção diária.	Verificar diariamente a estocagem e separação.	
__/__/__						
__/__/__	ORGANIZAÇÃO ALMOXARIFADO	Planejar rotina de inspeção para cobrar organização.	Manter os materiais separados e identificados.	Inspeção diária.	Verificar diariamente a estocagem e separação.	
__/__/__						
__/__/__	TREINAMENTO DIREÇÃO DEFENSIVA	Planejar e executar treinamento para equipe.	Realizar treinamento.	Inspeção diária / Registro.	Manter periodicidade e registrar frequência.	
__/__/__						

★ **GESTÃO DINÂMICA POR FASES:** Este Plano de Ação está estruturado de forma evolutiva. Utilize o seletor acima para filtrar as ações recomendadas para a **Fase Inicial**, **Acabamento** ou **Final** da obra.

A equipe de SST e a CIPA devem revisar mensalmente o status das ações da fase ativa. Ao transitar entre fases, certifique-se de atualizar o Inventário de Riscos e validar as novas medidas de prevenção (ex: gestão de químicos no acabamento).

17.2 PLANO DE AÇÃO — GESTÃO DE INDICADORES E METAS

Abaixo, apresentam-se os indicadores sugeridos para o monitoramento da eficácia das medidas de prevenção, conforme subitem 1.5.7 da NR-01.

17.3 AVALIAÇÕES E DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

DOCUMENTO	FINALIDADE / OBRIGATORIEDADE	STATUS
LIP — Laudo de Insalubridade e Periculosidade	NR-15, NR-16, eSocial (evento S-2240) — obrigatório para trabalhadores com exposição a agentes insalubres ou perigosos	
LTCAT — Laudo Técnico das Condições do Ambiente	Fins previdenciários e eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos para aposentadoria especial	
ART — Anotação de Responsabilidade Técnica	Responsabilidade técnica do PGR (Anexo 01) — obrigatório quando elaborado por Engenheiro de Segurança	
Avaliações Quantitativas	Ruído (NHO-01), poeira, calor (NHO-06), vibração (NHO-09), iluminação — subsidiar LIP, LTCAT, PCMSO e Inventário	
PPP — Perfil Profissiográfico Previdenciário	INSS / eSocial — trabalhadores expostos a agentes nocivos com potencial de aposentadoria especial	

17.4 CRONOGRAMA DE PALESTRAS - SEGURANÇA DO TRABALHO

[illegible]

18. CONTRATAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS (TERCEIRIZADOS)

O Inventário de Riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) está integrado ao PGR do canteiro de obras, em conformidade com o disposto na NR-01 — Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. As atividades, perigos e riscos identificados nos processos executados pelas contratadas foram incorporados ao Inventário de Riscos consolidado do estabelecimento, assegurando a gestão unificada de todos os agentes ocupacionais presentes no canteiro, independentemente do vínculo empregatício dos trabalhadores expostos.

Toda nova contratação de empresa prestadora de serviços deve acionar a revisão do Inventário de Riscos, configurando-se como gatilho obrigatório de Gestão de Mudanças, nos termos da NR-01, subitem 1.5.4.4.6, alínea "b" — que determina a reavaliação dos riscos sempre que houver mudanças em tecnologias, ambientes, processos ou organização do trabalho. A entrada de novos prestadores no canteiro pode introduzir perigos antes não mapeados, alterar os níveis de exposição existentes ou exigir medidas de prevenção adicionais, razão pela qual o processo de revisão deve ser conduzido previamente ao início das atividades da contratada.

Cabe à organização contratante:

- Exigir da prestadora de serviços a entrega do seu Inventário de Riscos específico, que será analisado e integrado ao PGR do canteiro;
- Verificar a compatibilidade entre os riscos declarados pela contratada e os riscos efetivamente presentes no ambiente do canteiro;
- Manter dossiê individual dos trabalhadores terceirizados com cópias de: ASO vigente, comprovantes de treinamentos obrigatórios (NRs aplicáveis), fichas de entrega de EPIs e habilitação para operação de máquinas e equipamentos;
- Verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria pela empresa terceirizada, conforme NR-05;
- Garantir que os trabalhadores terceirizados participem das ações de integração de SST do canteiro, incluindo DDS, treinamentos e exercícios simulados de emergência.

A organização contratante deve exigir da prestadora de serviços a entrega formal de seu Inventário de Riscos específico, que deve ser analisado e incorporado fisicamente aos anexos deste PGR para garantir a gestão unificada de riscos no canteiro.

★ A integração do Inventário de Riscos dos terceirizados ao PGR do canteiro é obrigatória e deve ser formalizada por meio de registro documental. A ausência de revisão do Inventário quando da contratação de novos prestadores configura descumprimento do processo de Gestão de Mudanças previsto na NR-01.

19. INTRODUÇÃO DE NOVAS TECNOLOGIAS OU MUDANÇAS

A organização deve manter um processo contínuo de **Gestão de Mudanças**, assegurando que o Inventário de Riscos e o Plano de Ação sejam revisados sempre que ocorrerem alterações nas condições de trabalho. Em conformidade com o subitem 1.5.4.4.6 da NR-01 e as diretrizes da Inspeção do Trabalho (CANPAT), a revisão do PGR é obrigatória nos seguintes casos:

- **A) Implementação de Medidas de Prevenção:** Após a adoção de novos controles, para avaliar o risco residual;
- **B) Inovações ou Modificações:** Introdução de novas tecnologias, equipamentos, produtos químicos ou mudanças nos processos e organização do trabalho;
- **C) Inadequações ou Ineficácia:** Quando identificadas falhas, insuficiências ou ineficácia nas medidas de prevenção existentes;
- **D) Acidentes ou Doenças:** Na ocorrência de acidentes de trabalho ou doenças relacionadas ao trabalho;
- **E) Mudanças Legais:** Quando houver alteração nos requisitos legais aplicáveis (normas regulamentadoras).

Independentemente dos critérios acima, a avaliação de riscos deve ser revista a cada **2 (dois) anos**, ou em até 3 (três) anos para organizações com sistema de gestão de SST certificado. Toda mudança significativa deve ser precedida de Análise de Risco (AR/APR) e registro no formulário de Gestão de Mudanças.

20. PROCEDIMENTOS PARA REGISTRO DE ACIDENTES E INCIDENTES

Seguir as 7 etapas da Seção 15 deste PGR. Os registros devem ser mantidos por no mínimo 5 anos e devem estar disponíveis para auditoria a qualquer tempo. O procedimento deve ser comunicado a todos os trabalhadores e à CIPA (NR-01 subitem 1.5.5.5 / Manual GRO MTE 2025, seção 12.4). O acidente de trabalho deve ser notificado ao eSocial pelo evento S-2210 no prazo legal estabelecido.

Página 17 de 26

21. CIPA — COMISSÃO INTERNA DE PREVENÇÃO DE ACIDENTES E DE ASSÉDIO

A Comissão Interna de Prevenção de Acidentes e de Assédio (CIPA) deve ser constituída conforme os requisitos da NR-05 e do Quadro I de dimensionamento, levando em conta o número de empregados e o Grau de Risco da atividade principal do estabelecimento. A CIPA é um órgão bipartite, composto por representantes eleitos pelos trabalhadores e indicados pelo empregador.

21.1 CONSTITUIÇÃO E DIMENSIONAMENTO

- **Dimensionamento:** conforme Quadro I da NR-05, com base no número total de empregados do estabelecimento e no Grau de Risco da atividade (CNAE), verificar o número de membros titulares e suplentes por parte do empregador e dos trabalhadores — [preencher após consulta ao Quadro I para o CNAE específico] ;
- **Mandato:** 1 (um) ano, com uma única reeleição permitida para os membros eleitos pelos trabalhadores;
- **Processo eleitoral:** organizado pelo empregador com prazo mínimo de 60 dias de antecedência do término do mandato vigente, garantida a participação de todos os trabalhadores com registro no estabelecimento;
- **Obrigatoriedade de CIPA própria por terceirizadas:** empresas prestadoras de serviços instaladas em estabelecimentos de Grau de Risco 3 ou 4 devem verificar a obrigatoriedade de constituição de CIPA própria, conforme NR-05 item 5.6.

21.2 ATRIBUIÇÕES DA CIPA NO ÂMBITO DO GRO (NR-01 SUBITEM 1.4.2.B)

- Participar da identificação de perigos e da avaliação de riscos, fornecendo a percepção dos trabalhadores sobre as condições de trabalho no canteiro;
- Acompanhar a implementação e o monitoramento das medidas do Plano de Ação, verificando prazos e eficácia;
- Analisar acidentes e incidentes ocorridos no canteiro, emitindo recomendações e acompanhando as ações corretivas;

- Investigar e encaminhar denúncias de assédio moral e sexual, em conformidade com a nova denominação da comissão e com as disposições da Lei n.º 14.457/2022;
- Elaborar e manter atualizado o Mapa de Riscos do canteiro, como instrumento complementar de comunicação dos riscos aos trabalhadores;
- Solicitar a revisão justificada do Inventário de Riscos ou do PGR sempre que identificar condições de risco não contempladas ou medidas de prevenção ineficazes (NR-01 subitem 1.5.4.4.6, alínea f).

21.3 PAUTA MÍNIMA DAS REUNIÕES ORDINÁRIAS

- Leitura e aprovação da ata da reunião anterior;
- Análise dos acidentes e incidentes ocorridos desde a última reunião;
- Acompanhamento do Plano de Ação do PGR — verificação do status de cada ação;
- Análise de denúncias de assédio e condições de risco reportadas pelos trabalhadores;
- Verificação dos indicadores de SST da Seção 16;
- Definição de assuntos a tratar na próxima reunião e atribuição de responsabilidades.

★ As atas de reunião da CIPA constituem evidência documental obrigatória do funcionamento do GRO e devem ser assinadas por todos os membros presentes, arquivadas por no mínimo 5 anos e disponibilizadas ao MTE quando solicitado.

22. SEGURANÇA EM ATIVIDADES COM PRODUTOS QUÍMICOS (NR-26)

Manter relação atualizada de todos os produtos químicos utilizados com as respectivas FDS (Fichas com Dados de Segurança — NR-26). O inventário completo de produtos químicos deve ser integrado ao Inventário de Riscos do PGR. Os trabalhadores devem ser treinados sobre os riscos e as medidas de controle de cada produto utilizado, com registro em lista de presença.

As FDS de todos os produtos químicos devem estar disponíveis no local de trabalho, em idioma português, em local de fácil acesso e conhecimento pelos trabalhadores, conforme NR-26 item 26.4. A rotulagem dos produtos deve estar em conformidade com o Sistema Globalmente Harmonizado (GHS). Produtos químicos cancerígenos, mutagênicos ou tóxicos para a reprodução devem receber atenção prioritária no Inventário de Riscos, com adoção de medidas de controle na ordem hierárquica da Seção 11.

23. COMUNICAÇÃO, CAPACITAÇÃO E TREINAMENTO DOS TRABALHADORES (NR-01 subitem 1.5.1)

A organização deve assegurar que todos os trabalhadores — próprios, terceirizados e estagiários — sejam informados sobre os riscos identificados no Inventário de Riscos referentes às suas atividades, bem como sobre as medidas de prevenção adotadas e os procedimentos de emergência vigentes, em conformidade com NR-01 subitem 1.5.1 e subitem 1.4.2, alínea "c".

23.1 INTEGRAÇÃO DE NOVOS TRABALHADORES

Todo trabalhador admitido — próprio ou terceirizado — deve passar por integração de SST antes de iniciar suas atividades no canteiro. A integração deve abordar, no mínimo:

- Apresentação do PGR: estrutura, objetivos e como acessá-lo;
- Riscos identificados para a função/GHE do trabalhador, conforme Inventário de Riscos;
- Medidas de prevenção em vigor: EPCs disponíveis, procedimentos de trabalho seguro e EPIs obrigatórios para cada atividade;
- Procedimentos de emergência: cenários identificados na Seção 14, pontos de encontro, números de emergência e atribuições da brigada;
- Direitos do trabalhador: recusa de atividade em risco grave e iminente (NR-01 subitem 1.4.4.1); canais para comunicação de riscos e solicitação de revisão do PGR;

- Procedimento para registro de quase-acidentes (near miss).

★ A integração deve ser documentada com lista de presença assinada pelo trabalhador, data e conteúdo abordado. Cópia deve ser arquivada no dossiê do trabalhador e no prontuário de SST do canteiro.

23.2 CRONOGRAMA DE TREINAMENTOS OBRIGATÓRIOS POR NR

TREINAMENTO	NORMA	CARGA HORÁRIA MÍNIMA	PERIODICIDADE DE RECICLAGEM	TRABALHADORES-ALVO
Integração de SST / GRO	NR-01 subitem 1.5.1	4 h	Admissão; retorno após afastamento > 30 dias	Todos
EPI — Uso, Guarda e Conservação	NR-06	2 h	Anual	Todos
Saúde e Segurança na Construção Civil	NR-18	6 h	Anual	Todos do canteiro
Trabalho em Altura	NR-35	8 h (básico)	A cada 2 anos	Trabalhadores em altura ≥ 2 m
Eletricidade — Segurança	NR-10	40 h (básico)	A cada 2 anos	Eletricistas / expostos
Máquinas e Equipamentos	NR-12	Conforme risco	Mudança de Risco / equipamento	Operadores
Brigada de Incêndio	NR-23 / IT-17 CBMGO	Conforme IT-17	Anual	Brigadistas designados
Espaço Confinado	NR-33	16 h (supervisor/vigia)	Anual	Quando aplicável
Ergonomia e FRPRT	NR-17 / NR-01	4 h	Anual — obrigatório a partir de 26/05/2026	Todos
CIPA — Formação de Cipeiros	NR-05	20 h	A cada mandato (1 ano)	Membros da CIPA

23.3 DIÁLOGO DIÁRIO DE SEGURANÇA (DDS)

O DDS deve ser realizado diariamente, no início de cada turno de trabalho, com duração mínima de 5 a 10 minutos. Cada DDS deve abordar temas relevantes ao trabalho do dia, com foco nos riscos do Inventário de Riscos e nas medidas de prevenção. O registro do DDS deve conter: data, tema abordado, nome do condutor e lista de presença assinada por todos os trabalhadores presentes. Os registros devem ser arquivados por no mínimo 2 anos.

24. eSocial — OBRIGAÇÕES DECORRENTES DO GRO

O eSocial é o sistema de registro digital de informações trabalhistas, previdenciárias e tributárias instituído pelo Governo Federal, e constitui o principal mecanismo de fiscalização eletrônica do cumprimento das obrigações do GRO pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE) e pela Receita Federal. As informações do PGR e do PCMSO devem ser registradas no eSocial nos seguintes eventos obrigatórios:

EVENTO ESOCIAL	CONTEÚDO	PRAZO / PERIODICIDADE	RESPONSÁVEL
S-2220 — Monitoramento da Saúde do Trabalhador	Registro dos Atestados de Saúde Ocupacional (ASOs) emitidos pelo médico do PCMSO: admissional, periódico, retorno ao trabalho, mudança de risco e demissional	Até o dia 15 do mês subsequente ao do evento	Médico Responsavel pelo PCMSO / RH
S-2240 — Condições Ambientais do Trabalho	Registro dos agentes nocivos aos quais o trabalhador está exposto, com base no Inventário de Riscos e no LIP/LTCAT: agente, intensidade, técnica utilizada, limite de tolerância e EPC/EPI utilizados	Antes do início da exposição; atualizar em até 15 dias após qualquer alteração	SST
S-2210 — Comunicação de Acidente de Trabalho (CAT)	Registro de qualquer acidente ou doença do trabalho, independentemente de haver afastamento ou de sua duração	Até o 1º dia útil após o acidente; em caso de óbito: imediatamente	Empregador / RH / SST

⚠ O não preenchimento ou preenchimento incorreto do evento S-2240 configura descumprimento das obrigações acessórias do eSocial e pode resultar em multas administrativas e impactar a concessão de aposentadoria especial ao trabalhador. A consistência entre o Inventário de Riscos do PGR e os dados enviados ao S-2240 deve ser verificada a cada revisão do PGR.

25. PROFISSIONAL HABILITADO E RESPONSÁVEL PELO PGR

Adriano Augusto Gonçalves de Oliveira
Engenheiro de Segurança do Trabalho
SECONCI GOIÁS
CREA: 101672344 D-GO

Juarez de Campos Castro
Responsável pela Implementação do PGR — Cliente

LOCAL E DATA
Goiâni-GO , 10 de Abril de 2026.

26. ANEXO I — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo existente no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

GHE 01 - BETONEIRA

-- Selecione o Setor --



Cargo / Função	Operador de Betoneira
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7154-05.Programam a produção e o fornecimento de concreto e misturam seus agregados. Preparam o ambiente, os equipamentos de trabalho e os insumos do concreto. Descarregam e bombeiam o concreto.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	Turno de segunda a segunda a quinta-feira: 07h - 17h Turno de sexta-feira: 07h-16h

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas estacionária (betoneira)	Irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Umidade	Área de operação da betoneira com umidade ou constantemente encharcado. Atividade por longos períodos executando massas de concreto, reboco, chapisco e afins.	Doenças do aparelho respiratório, de pele	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Calçado impermeável; Luvas de borracha; Roupas impermeáveis	
FISICO	Vibração localizada (mão e braço)	Operação de máquinas estacionária (betoneira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Sílica livre	Manipulação do produto para abastecimento do tambor da betoneira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	

QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	O contato das poeiras de cimento (seco ou húmido) com os olhos pode causar lesões graves e potencialmente irreversíveis.: O contato das poeiras de cimento (seco ou húmido) com os olhos pode causar lesões graves e potencialmente irreversíveis.: O cimento pode ter um efeito irritante na pele húmida (devido à transpiração ou humidade) ou originar dermatites por contacto após prolongado contacto. O contacto prolongado entre as poeiras de cimento ou betão de cimento frescos e a pele pode causar irritação, dermatites ou queimaduras graves, pois estas desenvolvem-se sem sentir dor	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e posicionamento de sacas de cimento, aditivos e correlacionados	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	2	MODERADO (8)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em atividades rotineiras de serviço na obra.	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	5	2	MODERADO (10)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas (betoneira)	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 02 - ARMAÇÃO

Cargo / Função	Armador
Qt. Trabalhadores	14
Descrição das Atividades	7153-15. Preparam a confecção de armações e estruturas de concreto. Cortam e dobram ferragens de lajes. Não usam policorte.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruído	Proximidade de atividades com operação de máquinas e equipamentos (lixadeira)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
FISICO	Vibração localizada (mão e braço)	Operação de máquinas (lixadeira)	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Manipulação do produto para abastecimento do tambor da betoneira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e posicionamento de sacas de cimento, aditivos e correlacionados	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	2	MODERADO (8)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas (Lixadeira)	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 03 - CARPINTARIA

Cargo / Função	Carpinteiro, Meio Oficial de Carpinteiro
Qt. Trabalhadores	17
Descrição das Atividades	7155-05. Planejam trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas de madeira. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos. 7155-05. Auxiliam nos trabalhos de carpintaria, preparam canteiro de obras e montam fôrmas de madeira. Confeccionam fôrmas de madeira e forro de laje (painéis), constroem andaimes e proteção de madeira. Montam portas e esquadrias. Finalizam serviços tais como desmonte de andaimes, limpeza, seleção de materiais reutilizáveis, armazenamento de peças e equipamentos.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos (eletroportáteis: Furadeira, parafusadeira e serra manual)	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Poeira da madeira	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte/ movimentação manual de fôrmas, estruturas, escoras, tabuas e correlacionados	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	2	MODERADO (8)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais

(COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 04 - PRODUÇÃO 01

Cargo / Função	Pedreiro, Meio Oficial de Pedreiro, Servente
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7152-10. Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contra pisos. 7170-20. Organizam e preparam o local de trabalho na obra; constroem fundações e estruturas de alvenaria. Aplicam revestimentos e contra pisos. 7170-20. Demolem edificações de concreto, de alvenaria e outras estruturas; preparam canteiros de obras, limpando a área. Efetuam manutenção de primeiro nível, limpando máquinas e ferramentas. Realizam escavações e preparam massa de concreto e outros materiais.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
QUIMICO	Sílica livre	Manipulação do produto para abastecimento do tambor da betoneira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Cimento Portland	Utilização de cimento no processo de trabalho	O contato das poeiras de cimento (seco ou húmido) com os olhos pode causar lesões graves e potencialmente irreversíveis.: O contato das poeiras de cimento (seco ou húmido) com os olhos pode causar lesões graves e potencialmente irreversíveis.: O cimento pode ter um efeito irritante na pele húmida (devido á transpiração ou humidade) ou originar dermatites por contacto após prolongado contacto. O contacto prolongado entre as poeiras de cimento ou betão de cimento frescos e a pele pode causar irritação, dermatites ou queimaduras graves, pois estas desenvolvem-se sem sentir dor	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e posicionamento de sacas de cimento, aditivos e correlacionados	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	2	MODERADO (8)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 05 - LIMPEZA

Cargo / Função	Auxiliar de Limpeza, Copeira, Auxiliar de serviços gerais
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	5143-20. Limpeza e manutenção dos ambientes de trabalho. Conservação e organização dos ambientes da empresa. 5143-25.Executar serviços de limpeza geral com base em uma rotina diária, limpando, varrendo, ou lavando as dependências do escritório central, stand de vendas e obras, assim como os móveis, utensílios e instalações, para manter condições de higiene e conservação do ambiente. Zelar pela limpeza e conservação das instalações e área de trabalho para manter em boas condições de uso, além de cuidar da copa, fazer café, lavar utensílios e repor insumos. Respeitar e fazer respeitar todas as normas de qualidade, meio ambiente, saúde e segurança no trabalho no âmbito de suas funções. 5134-30-Copeira: Limpeza e manutenção dos ambientes de trabalho.Conservação e organização dos ambientes da empresa e preparam café e chá.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Produtos Domissanitários	Uso de saneantes domissanitários destinados à higienização, desinfecção ou desinfestação de ambientes (desinfetante, detergente).	Irritação imediata no contato com a pele, quando inalado pode causar bloqueio das vias respiratórias.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)		

QUIMICO	Silica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
BIOLOGICO	Microorganismos Patogênicos	Higienização das instalações sanitárias	Infecções em geral	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)		
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Movimentação e transporte de materiais utilizados na limpeza.	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 06 - ELÉTRICA

Cargo / Função	Eletricista, Meio Oficial de Elétrica
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7156-10. Planejam serviços de manutenção e instalação eletroeletrônica e realizam manutenções preventiva, preditiva e corretiva. Instalam sistemas e componentes eletroeletrônicos e realizam medições e testes.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas e equipamentos	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibrações localizadas (mão e braço)	Operação de Máquinas e equipamentos	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Levantamento e transporte manual de materiais de manutenção de máquinas e equipamentos	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar instalações em atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados	4	1	BAIXO (4)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

ACIDENTE	Eletricidade	Trabalho com rede energizada	O choque elétrico pode ocasionar contrações violentas dos músculos, a fibrilação ventricular do coração, lesões térmicas e não térmicas podendo levar a óbito, como efeito indireto temos as quedas e batidas	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo), sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas isolantes dielétricas; Capacete dielétrico; Calçado dielétrico; Óculos	
----------	--------------	------------------------------	---	---	---	------------------------	---	--	--

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 07 - CREMALHEIRA

Cargo / Função	Operador de Cremalheira
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7821-25. Operam cremalheira na cabine de comando. Organizam e preparam cargas para levar aos pavimentos superiores. Organizam pessoal para levar aos pavimentos. Check list diário do equipamento.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Operação de máquinas	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração (corpo inteiro)	Operação de Máquinas	Efeitos adversos na coluna vertebral, devido à exposição à VCI, como lombalgia, degeneração precoce da região lombar e hérnia de disco, dores musculares, náuseas, entre outros.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Limitação do tempo de exposição	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais (argamassa, tijolos, pisos cerâmico, tintas e outros)	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves,	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com máquinas e equipamentos	Fraturas, cortes, perfurações, amputação de membros	4	2	MODERADO (8)	Realização do check-list diário do equipamento, uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 08 - SUPERVISÃO DE EQUIPES

Cargo / Função	Encarregado de Acabamento, Encarregado de Armação, Encarregado de Forma, Encarregado de Instalações, Encarregado de Obras, Mestre de Obra
Qt. Trabalhadores	06
Descrição das Atividades	Encarregado de Acabamento- 7102-05: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil - acabamento. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, uxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra. Encarregado de Armação-7102-05: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Encarregado de Forma-7102-05: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra. Encarregado de Instalações-7102-05: Supervisionam equipes de trabalhadores da elétrica e hidráulica. Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, uxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Encarregado de Obras- 7102-05: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra. Mestre de Obra- 7102-05: Supervisionam equipes de trabalhadores da construção civil. Elaboram documentação técnica e controlam recursos produtivos da obra (arranjos físicos, equipamentos, materiais, insumos e equipes de trabalho). Controlam padrões produtivos da obra tais como inspeção da qualidade dos materiais e insumos utilizados, orientação sobre especificação, fluxo e movimentação dos materiais e sobre medidas de segurança dos locais e equipamentos da obra. Administram o cronograma da obra.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Supervisionar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
----------	--------------------	---	---	---	---	------------------------	---	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 09 - ADMINISTRAÇÃO

Cargo / Função	Analista comercial, Analista de crédito, Analista de Empreendimento, Analista de Empreendimento JR I, Analista de Empreendimento PL I, Assistente Administrativo, Assistente de Vendas, Atendente de Vendas Junior I, Auxiliar Administrativo de Obras, Encarregado Administrativo de Obras, Estagiário, Analista Comercial PL III, Analista de Empreendimento PL II, Assistente de Atendimento, Assistente de Vendas Jr, Coordenador Comercial PL III
Qt. Trabalhadores	03

Descrição das Atividades	Analista comercial: 1423-30. Relacionamento com clientes, entender as necessidades e garantir satisfação. Analista comercial PL III: 1423-30. Relacionamento com clientes, entender as necessidades e garantir satisfação. Analista de crédito: 1423-30. Avaliar a capacidade de crédito de possíveis clientes, e seus esforços reduzem os riscos financeiros e ajudam a tomar decisões informadas sobre extensões de crédito ou relacionamentos comerciais. Analista de Empreendimento: 4221-05. Executar atividades relacionadas a atendimento ao cliente, organização do ambiente de trabalho. Analista de Empreendimento JR I: 4221-05. Executar atividades relacionadas a atendimento ao cliente, organização do ambiente de trabalho. Analista de Empreendimento PL I: 4221-05. Executar atividades relacionadas a atendimento ao cliente, organização do ambiente de trabalho. Analista de Empreendimento PL II: 4221-05. Executar atividades relacionadas a atendimento ao cliente, organização do ambiente de trabalho. Assistente Administrativo: 4110-10. Documentos administrativos diversos, emissão de N.F, verificar recebimentos e lançamento no sistema, atendimento ao cliente via telefone. Assistente de Atendimento: 4110-10. Documentos administrativos diversos, emissão de N.F, verificar recebimentos e lançamento no sistema, atendimento ao cliente via telefone. Assistente de Vendas Jr: 4221-05. Responsável por tarefas administrativas relativas à área comercial da empresa. Isso inclui acompanhar entregas, verificar e encaminhar pedidos, organizar agendas a atividades operacionais. Assistente de Vendas: 4221-05. Responsável por tarefas administrativas relativas à área comercial da empresa. Isso inclui acompanhar entregas, verificar e encaminhar pedidos, organizar agendas a atividades operacionais. Atendente de Vendas Junior: 4221-05. ATENDIMENTO AO CLIENTE - vendas Atendente de Vendas Junior I: 4221-05. ATENDIMENTO AO CLIENTE - vendas Auxiliar Administrativo de Obras: 4110-05. Responsável por tarefas administrativas relativas à área comercial da empresa. Isso inclui acompanhar entregas, verificar e encaminhar pedidos, organizar agendas a atividades operacionais. Coordenador Comercial PL III: 1423-05. Analisa estratégias de vendas, acompanha concorrência, identifica e aponta tendências mercadológicas, estuda projeções e quadros comparativos e elabora relatórios gerenciais, para subsidiar informações à gerência na tomada de decisão e atender os resultados previstos Encarregado Administrativo de Obras: 4110-05. Documentos administrativos diversos como departamento pessoal e financeiro, verificar recebimentos e lançamento no sistema, atendimento ao cliente via telefone. Estagiário-901: Auxiliar nos procedimentos qualidade, meio ambiente e saúde e segurança e realização de documentos relacionados a norma do Sistema de Gestão Integrado - SGI.
Local de Trabalho	Trabalho realizado dentro do escritório e em campo, para acompanhamento e fiscalização das atividades.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 10 - ALMOXARIFADO

Cargo / Função	Almoxarife, Auxiliar de Almoxarife
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	4141-05. Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais no almoxarifado. Realizam os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar 4141-05. Recepcionam, conferem e armazenam produtos e materiais no almoxarifado. Realizam os lançamentos da movimentação de entradas e saídas e controlam os estoques. Distribuem produtos e materiais a serem expedidos. Organizam o almoxarifado para facilitar a movimentação dos itens armazenados e a armazenar.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do almoxarifado e em campo.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	

ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materias de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	2	MODERADO (8)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.



GHE 11 - ENGENHARIA

Cargo / Função	Analista de Engenharia, Assistente de Gestão Ambiental, Auxiliar de arquitetura, Auxiliar de Engenharia, Engenheiro Civil, Técnico em Edificações
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	Analista de Engenharia-3121-05: Auxiliar nos procedimentos qualidade, meio ambiente e saúde e segurança e realização de documentos relacionados a norma do Sistema de Gestão Integrado - SGI. Auxiliar no controle de projetos da obra. Acompanhamento físico conforme cronograma da obra Assistente de Gestão Ambiental-3212-10: Auxilia na gestão ambiental das atividades da obra através dos processos denidos pelo Sistema de Gestão Ambiental. Auxiliar de arquitetura-3185-05: Produzir desenhos técnicos em softwares como AutoCAD, Revit. Criar modelagens 3D para visualização de projetos. Atualizar plantas, cortes, fachadas e detalhes construtivos de acordo com as instruções do arquiteto responsável. Auxiliar de Engenharia-2142-80: Auxiliar nos procedimentos qualidade, meio ambiente e saúde e segurança e realização de documentos relacionados a norma do Sistema de Gestão Integrado - SGI. Engenheiro-2142-05: Orientam e cobram dos colaboradores quanto a realização dos serviços, gerenciam obras, controlam a qualidade de empreendimentos. Coordenam a operação, manutenção e planejamento do empreendimento. Técnico em Edificações-3121-05: Controlar, acompanhar, emitir relatórios, verificar pendências, solicitar alterações de qualidade, acompanhar a produção, materiais, projetos, fundações e lançamentos da construtora
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Quando na administração, pé direito de aproximadamente 3m, ventilação e iluminação artificial".
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Silica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos períodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	4	2	MODERADO (8)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 12 - MAQUINAS PESADAS

Cargo / Função	Operador de Maquinas
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	6410-10. Operação de máquinas – retro escavadeira ou pá carregadeira. Mistura agregados para atividades de pavimentação. Serviços de carga em caminhões e transporte de materiais/insumos.
Local de Trabalho	O profissional atua em diversas áreas da obra, onde as condições de pé-direito, iluminação e ventilação variam. Na cabine, é fundamental que haja janelas amplas para garantir boa visibilidade e sistemas de ar condicionado e aquecimento, mantendo a temperatura confortável durante o trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Radiação não ionizante	Trabalho a céu aberto	Exaustão ao calor; Sudorese; Desidratação. Nos olhos podem causar ceratites, conjuntivites e cataratas.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor solar FPS 30+; Óculos com proteção UV	
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Alquenil amina	utilizado na lubrificação de maquinas.	Fissuras na pele. O contato repetido ou prolongado pode causar o ressecamento da pele.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)		
ERGONOMICO	Postural	Trabalho sentado por longos periodos	Quanto mais tempo uma pessoa passa sentada, mais propensa ela se torna a desenvolver problemas crônicos como doenças cardiovasculares, além de outras condições adversas para a saúde.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Arranjo fisico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 13 - INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS

Cargo / Função	Encanador, Meio Oficial Hidráulico
Qt. Trabalhadores	03
Descrição das Atividades	7241-10. Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, denem traçados e dimensionam tubulações; especificam, quantificam e inspecionam materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de uídos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios. 7241-10. Operacionalizam projetos de instalações de tubulações, denem traçados e dimensionam tubulações; especificam, quantificam e inspecionam materiais; preparam locais para instalações, realizam pré-montagem e instalam tubulações. Realizam testes operacionais de pressão de uídos e testes de estanqueidade. Protegem instalações e fazem manutenções em equipamentos e acessórios
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruído	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
FISICO	Vibração localizadas (mão e braço)	Operação de máquinas e equipamentos eletroportáteis	Exposição diária prolongada a vibração na região das mãos pode resultar no que é denominado síndrome dos dedos brancos. Outros efeitos podem ser danos as juntas, músculos do pulso e cotovelo. A síndrome dos dedos brancos, em seu estado avançado, é caracterizada por dano as artérias e nervos e tecidos moles da mão.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual, revezamentos e pausas durante as atividades	Luvas antivibração; Pausas e revezamento de atividades	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	

QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	Acetato de etila	colagem de tuvos e conexoes	provoca irritação da pele com ressecamento e vermelhidão. provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Acetona	colagem de tuvos e conexoes	provoca irritação da pele com ressecamento e vermelhidão. provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Metilsilanotriol triacetato (	colagem de tuvos e conexoes	Provoca queimaduras graves à pele com dor, formação de bolhas e descamação. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Pode irritar ligeiramente as vias respiratórias	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)		
QUIMICO	Diacetato de dibutil-estanho	colagem de tuvos e conexoes	Provoca queimaduras graves à pele com dor, formação de bolhas e descamação. Provoca lesões oculares graves com queimadura, lacrimejamento e dor. Pode irritar ligeiramente as vias respiratórias	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)		
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materias de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	2	MODERADO (8)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	

ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE - 14 PINTURA

Cargo / Função	Pintor
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	7166-10. Organizam e preparam o local de trabalho na obra, lixar superfícies e retirando irregularidades das áreas a serem pintadas, prepara tintas e massa para aplicação, aplicar massa tipo PVA ou acrílica lixar, aplicar tintas acrílica PVA e ou esmalte nas superfícies, realizam limpeza e organização do ambiente de trabalho, recolhendo restos de materiais utilizados, utiliza lixadeira Manual e pistola a AR direto.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruido	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Em processos realizados que inclua: Lixar, furar, esmerilhar, cortar, montar, desmontar, moldar, polir e assim por diante, que são atividades que deixam o trabalhador em contato com as partículas de sílica que aparecem na forma de poeira	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, tais como de pulmão, estômago, fígado, esôfago, pâncreas, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	
QUIMICO	di-butil-laurato de estanho	em processo de pintura	Irrita a pele. Pode causar sonolência ou vertigens. Pode afetar órgãos (pulmões, rins, SNC).	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)		

QUIMICO	2-butanol	em processo de pintura	O produto causa irritação na pele e nos olhos, com vermelhidão e dor. A exposição repetida ou prolongada pode danificar o fígado e o sistema nervoso central, gerando sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, irritabilidade, distúrbios auditivos, visuais e do sono. Também pode causar sonolência, vertigem, náusea e tontura	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Acetona	em processo de pintura	: Moderadamente tóxico, severamente irritante para pele, para os olhos, mucosas e trato respiratório	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Acetato de etila	em processo de pintura	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode ser nocivo se ingerido. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura. Pode provocar irritação das vias respiratórias, podendo ocasionar espirros e tosse. Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar cirrose hepática.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Etanol	em processo de pintura	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode ser nocivo se ingerido. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura. Pode provocar irritação das vias respiratórias, podendo ocasionar espirros e tosse. Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar cirrose hepática.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	2-butóxi-etanol	em processo de pintura	Provoca irritação à pele com vermelhidão, dor e ressecamento. Provoca irritação ocular grave com vermelhidão e dor. Pode ser nocivo se ingerido. Pode provocar sonolência ou vertigem, podendo ocasionar náusea e tontura. Pode provocar irritação das vias respiratórias, podendo ocasionar espirros e tosse. Provoca danos ao fígado por exposição repetida ou prolongada, podendo ocasionar cirrose hepática.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)		

QUIMICO	Querosene	em processo de pintura	Em contato com os olhos pode causar irritação. Em contato com a pele pode causar vermelhidão. exposição única pode provocar depressão do sistema nervoso central (snc) e irritação às vias respiratórias, com dor de cabeça, náusea, tontura, confusão mental, perda de consciência, sonolência, vertigem, tosse, dor de garganta e falta de ar. Pode ser fatal se ingerido e penetrar nas vias respiratórias por causar pneumonite química.	1	1	IRRELEVANTE (1)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro orgânico; Luvas de nitrila; Óculos de segurança	
QUIMICO	Tolueno	em processo de pintura	O produto causa irritação na pele e nos olhos, com vermelhidão e dor. A exposição repetida ou prolongada pode danificar o fígado e o sistema nervoso central, gerando sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, irritabilidade, distúrbios auditivos, visuais e do sono. Também pode causar sonolência, vertigem, náusea e tontura.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Metiletilcetona	em processo de pintura	O produto causa irritação na pele e nos olhos, com vermelhidão e dor. A exposição repetida ou prolongada pode danificar o fígado e o sistema nervoso central, gerando sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, irritabilidade, distúrbios auditivos, visuais e do sono. Também pode causar sonolência, vertigem, náusea e tontura.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Xileno	em processo de pintura	O produto causa irritação na pele e nos olhos, com vermelhidão e dor. A exposição repetida ou prolongada pode danificar o fígado e o sistema nervoso central, gerando sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, irritabilidade, distúrbios auditivos, visuais e do sono. Também pode causar sonolência, vertigem, náusea e tontura.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara c/ filtro p/ vapores orgânicos; Luvas de nitrila; Óculos	
QUIMICO	Nitrito de sódio	em processo de pintura	O produto causa irritação na pele e nos olhos, com vermelhidão e dor. A exposição repetida ou prolongada pode danificar o fígado e o sistema nervoso central, gerando sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, irritabilidade, distúrbios auditivos, visuais e do sono. Também pode causar sonolência, vertigem, náusea e tontura.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)		

QUIMICO	Hidróxido de amônio	em processo de pintura	O produto causa irritação na pele e nos olhos, com vermelhidão e dor. A exposição repetida ou prolongada pode danificar o fígado e o sistema nervoso central, gerando sintomas como confusão mental, dificuldade de concentração, irritabilidade, distúrbios auditivos, visuais e do sono. Também pode causar sonolência, vertigem, náusea e tontura.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)		
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ERGONOMICO	Levantamento e Transporte Manual de cargas	Transporte manual de materiais de construção civil em geral	Lesões no seu sistema musculoesquelético, dores intensas na coluna, na região lombar, nos ombros, nos braços e nos pulsos, incidência de Ler e Dort.	4	2	MODERADO (8)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Luvas de proteção mecânica; Calçado de segurança	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	

ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana depressiva, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinhal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	
ACIDENTE	Máquinas e equipamentos	Atividades com a máquinas	Fraturas, cortes, perfurações e amputação de membros.	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo). Sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) ambos conforme plano de ação PDCA.	Protetor auditivo; Luvas de raspa; Óculos de segurança; Calçado c/ biqueira	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 15 - PORTARIA

Cargo / Função	Vigia Diurno, Vigia Noturno
Qt. Trabalhadores	01
Descrição das Atividades	5174-20. Zelar pela guarda do patrimônio e exercem a vigilância, percorrendo-os sistematicamente e inspecionando suas dependências, para evitar incêndios, roubos, entrada de pessoas estranhas e outras anormalidades.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
QUIMICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
BIOLOGICO	Ausência de agente nocivo	NA	NA			NÃO DEFINIDO	NA	Não aplicável	
ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos periodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Analise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Violência Física)	Durante confronto direto com terceiros.	Lesões superficiais, traumas e hemorragias.	4	2	MODERADO (8)	Treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS)	Colete de sinalização; Medidas administrativas de segurança patrimonial	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diálogo Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	

ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
----------	-------------------------------	--	---	---	---	---------------------	---	---	--

Legenda (P × S):  Irrelevante (1)  Baixo (2–4)  Moderado (4–12)  Alto (10–16)  Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

GHE 16 - SESMT

Cargo / Função	Técnico de Segurança do Trabalho, Auxiliar Técnico de Segurança do Trabalho, Estagiário.
Qt. Trabalhadores	02
Descrição das Atividades	3516-05. Elaboram, participam da elaboração e implementam política de saúde e segurança no trabalho (SSO) – ISO 45001; realizam auditoria, acompanhamento e avaliação na área; identificam variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente. Desenvolvem ações educativas na área de saúde e segurança no trabalho; participam de perícias e fiscalizações e integram processos de negociação. Participam da adoção de tecnologias e processos de trabalho; gerenciam documentação de SSO; investigam, analisam acidentes e recomendam medidas de prevenção e controle. 3516-05. Presta suporte ao Técnico de Segurança nas atividades relacionadas à prevenção de acidentes, promoção da saúde ocupacional e manutenção de condições seguras no ambiente de trabalho, Auxiliar nas inspeções de áreas, equipamentos e ferramentas, controlar a entrega, devolução e validade de EPIs, preencher e organizar documentos de segurança (fichas, relatórios, checklists), acompanhar treinamentos obrigatórios e auxiliar no controle de certificados, apoiar na realização de DDS (Diálogo Diário de Segurança), orientar colaboradores quanto às práticas de segurança, auxiliar na investigação preliminar de acidentes e quase acidentes, dar suporte na implementação do PCMSO, PGR e demais programas de SST, auxiliar na fiscalização do uso adequado de EPIs e apoiar o Técnico de Segurança nas atividades de campo e rotinas administrativas. 901. Auxiliar nos procedimentos e documentos de meio ambiente e saúde e segurança do trabalho.
Local de Trabalho	O profissional realiza suas atividades em diversos locais da obra, onde o pé direito, iluminação e ventilação podem variar de acordo com o local de trabalho. Trabalho realizado dentro do escritório e em campo.
Jornada de Trabalho	

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
FISICO	Ruído	Proximidade com equipamentos e máquinas utilizados na obra	A exposição ao ruído excessivo pode apresentar diversos sintomas no organismo como irritabilidade, ansiedade, dor de cabeça, zumbido, tontura, estresse, falta de concentração, perda de memória, dificuldades no entendimento da fala e de comunicação, insônia, doenças cardiovasculares e, em um estágio mais gravoso, perda auditiva irreversível	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Protetor auditivo tipo plug ou concha (CA aprovado MTE)	
QUIMICO	Poeira respirável	Poeiras geradas no processo produtivo no canteiro de obras na fase atual.	Quando há ação de substâncias irritantes, como a poeira, a entrada e a saída de ar dos pulmões ficam comprometidas e podem resultar em chiado no peito, falta de ar e tosse.	4	1	BAIXO (4)	Uso de equipamentos de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF2; Óculos de segurança; Calçado de segurança	
QUIMICO	Sílica livre	Poeiras geradas no uso de máquinas e equipamentos	A exposição à sílica também pode aumentar o risco de doenças autoimunes, esclerose sistêmica, artrite reumatoide, lúpus, complicações na derme, anemia hemolítica, além de vários tipos de câncer, intestino, ósseo, faríngeo, pele, cérebro e rim (INCA, 2012).	4	2	MODERADO (8)	Uso de equipamentos ou medidas de proteção individual (conforme lista abaixo)	Máscara PFF3; Óculos de segurança	

ERGONOMICO	Postural	Trabalho em pé por longos períodos	O cansaço e as dores nas pernas são apenas alguns dos problemas causados por trabalhar em pé. As complicações podem ser estender para os joelhos, o quadril, a coluna e a postura de modo geral.	4	1	BAIXO (4)	Ginástica laboral e Análise Ergonômica do Trabalho, medidas a serem implantadas e acompanhadas conforme plano de ação.	Não aplicável — AET, ginástica laboral, pausas	
ACIDENTE	Arranjo físico inadequado (Perfuração)	Em deslocamento no canteiro de obras	Infecções bacterianas, lesões dermatológicas e até mesmo consequências mais graves.	4	2	MODERADO (8)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA	Luvas anti-corte / raspa; Calçado c/ biqueira de aço; Óculos de segurança	
ACIDENTE	Queda de materiais	Queda de materiais na área da edificação	Hemorragias, perfuração de órgãos internos, lesões permanentes, deficiência física, incapacitantes	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sistema de proteções coletivas, treinamentos e orientações no Diário Diário de Segurança (DDS) conforme plano de ação PDCA.	EPI conforme avaliação específica de risco — CA aprovado MTE (NR-06)	
ACIDENTE	Piso irregular ou em desnível	Piso escorregadio, ondulado, com obstáculo e/ou com materiais diversos	Fraturas, lesões diversas, inclusive com possibilidade de serem incapacitantes.	4	1	BAIXO (4)	Organização e limpeza do canteiro, sinalização, iluminação, nivelamento e regularização do local de passagem de pessoas (conforme plano de ação PDCA)	Calçado antiderrapante c/ biqueira; Capacete de segurança	
ACIDENTE	Trabalho em Altura	Realizar atividades superiores a 2m com risco de queda	Múltiplas lesões possíveis, na cabeça é comum que ocorra fratura craniana deprimida, contusão cerebral e hemorragia intracraniana; no tórax pode-se encontrar contusão pulmonar, ruptura dos brônquios ou da aorta e fratura do esterno resultante da hiper flexão do queixo; na coluna espinal, os corpos vertebrais podem ser fraturados.	4	2	MODERADO (8)	Uso de EPIs (conforme lista abaixo) Treinamento de qualificação do trabalhador e orientações, sistema de proteção coletiva, ambos conforme plano de ação PDCA	Cinto paraquedista; Talabarte duplo c/ absorvedor de energia; Capacete c/ jugular	

Legenda (P x S): Irrelevante (1) Baixo (2–4) Moderado (4–12) Alto (10–16) Crítico (20–25)

NOTA 1 — Avaliação e controle dos fatores psicossociais está descrita no item 26.1 deste PGR — Inventário de Riscos Psicossociais (COPSOQ II-BR / AQUALI-RPS).

NOTA 2 — A metodologia considerada como quantitativa deverá ser realizada medição conforme especificado no plano de ação PDCA e, até que seja executada a medição esta avaliação será qualitativa por julgamento técnico.

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo existente no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é **obrigatório para a validade do PGR** (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a").*

- ★ O Inventário de Riscos das Funções deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, mudança de fase construtiva, introdução de novos processos ou contratação de novas empresas prestadoras de serviços, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.
- ★ O inventário dos riscos das empresas prestadoras de serviços (terceirizadas) integra este anexo, em conformidade com o disposto na Seção 18 deste PGR.

26.1 INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS

O presente inventário contempla os riscos psicossociais identificados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3 e 1.5.6.1 e com as diretrizes da Portaria MTE n.º 1.419/2024. A avaliação segue a Matriz 5×5 da Seção 10 deste PGR.

INVENTÁRIO DE RISCOS PSICOSSOCIAIS POR GHE

GHE: TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Cargo / Função	TÉCNICO ADM / OPERACIONAL
Qt. Trabalhadores	6
Descrição das Atividades	Execução de atividades operacionais, técnicas, administrativas e de supervisão em canteiro de obras e áreas de apoio, envolvendo serviços de construção civil, montagem e desmontagem de estruturas, armação de ferragens, carpintaria, alvenaria, concretagem, limpeza e organização do canteiro, movimentação de materiais, operação de máquinas e equipamentos, inspeção e acompanhamento das frentes de serviço, controle e distribuição de equipes, fiscalização da execução das atividades, apoio às ações de segurança do trabalho, controle administrativo da obra, atendimento e controle de acesso, além do cumprimento de procedimentos operacionais, normas internas e requisitos de segurança e saúde ocupacional.
Local de Trabalho	Ambiente de trabalho composto por áreas administrativas, canteiro de obras, frentes de serviço e áreas de apoio operacional, com atividades realizadas em ambientes abertos e fechados.
Jornada de Trabalho	O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas

GRUPO	PERIGO / ASPECTO	FONTE	AGRAVO	S	P	NÍVEL DE RISCO	MEDIDAS EXISTENTES	EPI NECESSÁRIO	MEDIDAS ADICIONAIS
Psicossocial (Ergonômico)	Organização do Trabalho Divisão de Tarefas — ritmo, prazos e condições de execução	O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas	Transtornos mentais.	2	3	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Organização do Trabalho Divisão Social do Trabalho — normas, comunicação e autonomia	Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho	Transtornos mentais.	3	2	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Estilo de Gestão Estilo Individualista — centralização e controle rígido	Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho	Transtornos mentais.	3	2	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Estilo de Gestão Estilo Coletivista — relações de troca e valorização coletiva	Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.	Transtornos mentais.	1	2	BAIXO (2)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Psicossocial (Ergonômico)	Indicadores de Sofrimento Falta de Sentido do Trabalho — sentimentos de inutilidade	Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.	Transtornos mentais.	4	2	MODERADO (8)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Indicadores de Sofrimento Esgotamento Mental — desânimo, insatisfação e desgaste	Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho	Transtornos mentais.	3	2	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Indicadores de Sofrimento Falta de Reconhecimento — desvalorização e falta de liberdade	Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho	Transtornos mentais.	2	2	BAIXO (4)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Médio / Longo Prazo Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.
Psicossocial (Ergonômico)	Danos Relacionados ao Trabalho Danos Psicológicos — sentimentos negativos sobre si e a vida	Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.	Transtornos mentais.	5	2	MODERADO (10)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Danos Relacionados ao Trabalho Danos Sociais — isolamento e dificuldades nas relações	Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.	Transtornos mentais.	4	2	MODERADO (8)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.
Psicossocial (Ergonômico)	Danos Relacionados ao Trabalho Danos Físicos — dores no corpo e distúrbios biológicos	Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos	Transtornos mentais.	3	2	MODERADO (6)	Monitoramento contínuo das condições organizacionais.	Não aplicável	Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Legenda (P × S): Irrelevante (1) Baixo (2-4) Moderado (4-12) Alto (10-16) Crítico (20-25)

* O inventário de riscos psicossociais deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições organizacionais de trabalho, mudança de gestão ou identificação de novos fatores de risco, conforme NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

27. ANEXO II — INVENTÁRIO DE RISCOS DAS FUNÇÕES – EMPRESAS TERCEIRIZADAS

O presente anexo apresenta o Inventário de Riscos detalhado por função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras, em conformidade com a NR-01 subitens 1.5.3, 1.5.6.1 e 1.5.8.1.1. O inventário contempla a identificação dos perigos, a avaliação dos riscos ocupacionais e as medidas de prevenção aplicáveis a cada Grupo Homogêneo de Exposição (GHE). Os níveis de Probabilidade (P) e Severidade (S) utilizados seguem as escalas documentadas na Seção 8 deste PGR, e a classificação do risco segue a Matriz 5×5 da Seção 10.

MODELO DE INVENTÁRIO DE RISCOS POR FUNÇÃO

** Replicar o modelo acima para cada função/cargo das empresas terceirizadas atuantes no canteiro de obras. O preenchimento completo do Inventário com dados reais de cada GHE é obrigatório para a validade do PGR (NR-01 subitem 1.5.6.1 alínea "a" c/c 1.5.8.1.1).*


★ O Inventário de Riscos das empresas terceirizadas deve ser atualizado sempre que houver alteração nas condições de trabalho, ingresso de nova prestadora de serviços ou mudança de fase construtiva, conforme gatilhos de revisão da NR-01 subitem 1.5.4.4.6.

28. DOCUMENTOS E PROJETOS OBRIGATÓRIOS — NR-18 E NORMAS CORRELATAS


#	DOCUMENTO	RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO	STATUS
1	Projeto da Área de Vivência do Canteiro (NR-18 item 18.5)	Profissional legalmente habilitado (ART)	
2	Projeto Elétrico das Instalações Temporárias	Engenheiro Elétrico (ART)	
3	Projetos dos Sistemas de Proteção Coletiva (SPC)	Engenheiro Civil (ART)	
4	Projeto do SPIQ — Sistema de Proteção Individual contra Quedas (NR-35)	Engenheiro (ART)	
5	Relação e Especificações Técnicas dos EPIs por GHE	SECONCI / SST	
6	Prontuário de Instalações Elétricas — PIE (acima de 75 KVA)	Engenheiro Elétrico (ART)	
7	Dossiê de Máquinas e Equipamentos (NR-12)	SST / Fabricante	

28.1 ART — ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DO ELABORADOR

28.2 OUTROS DOCUMENTOS COMPLEMENTARES

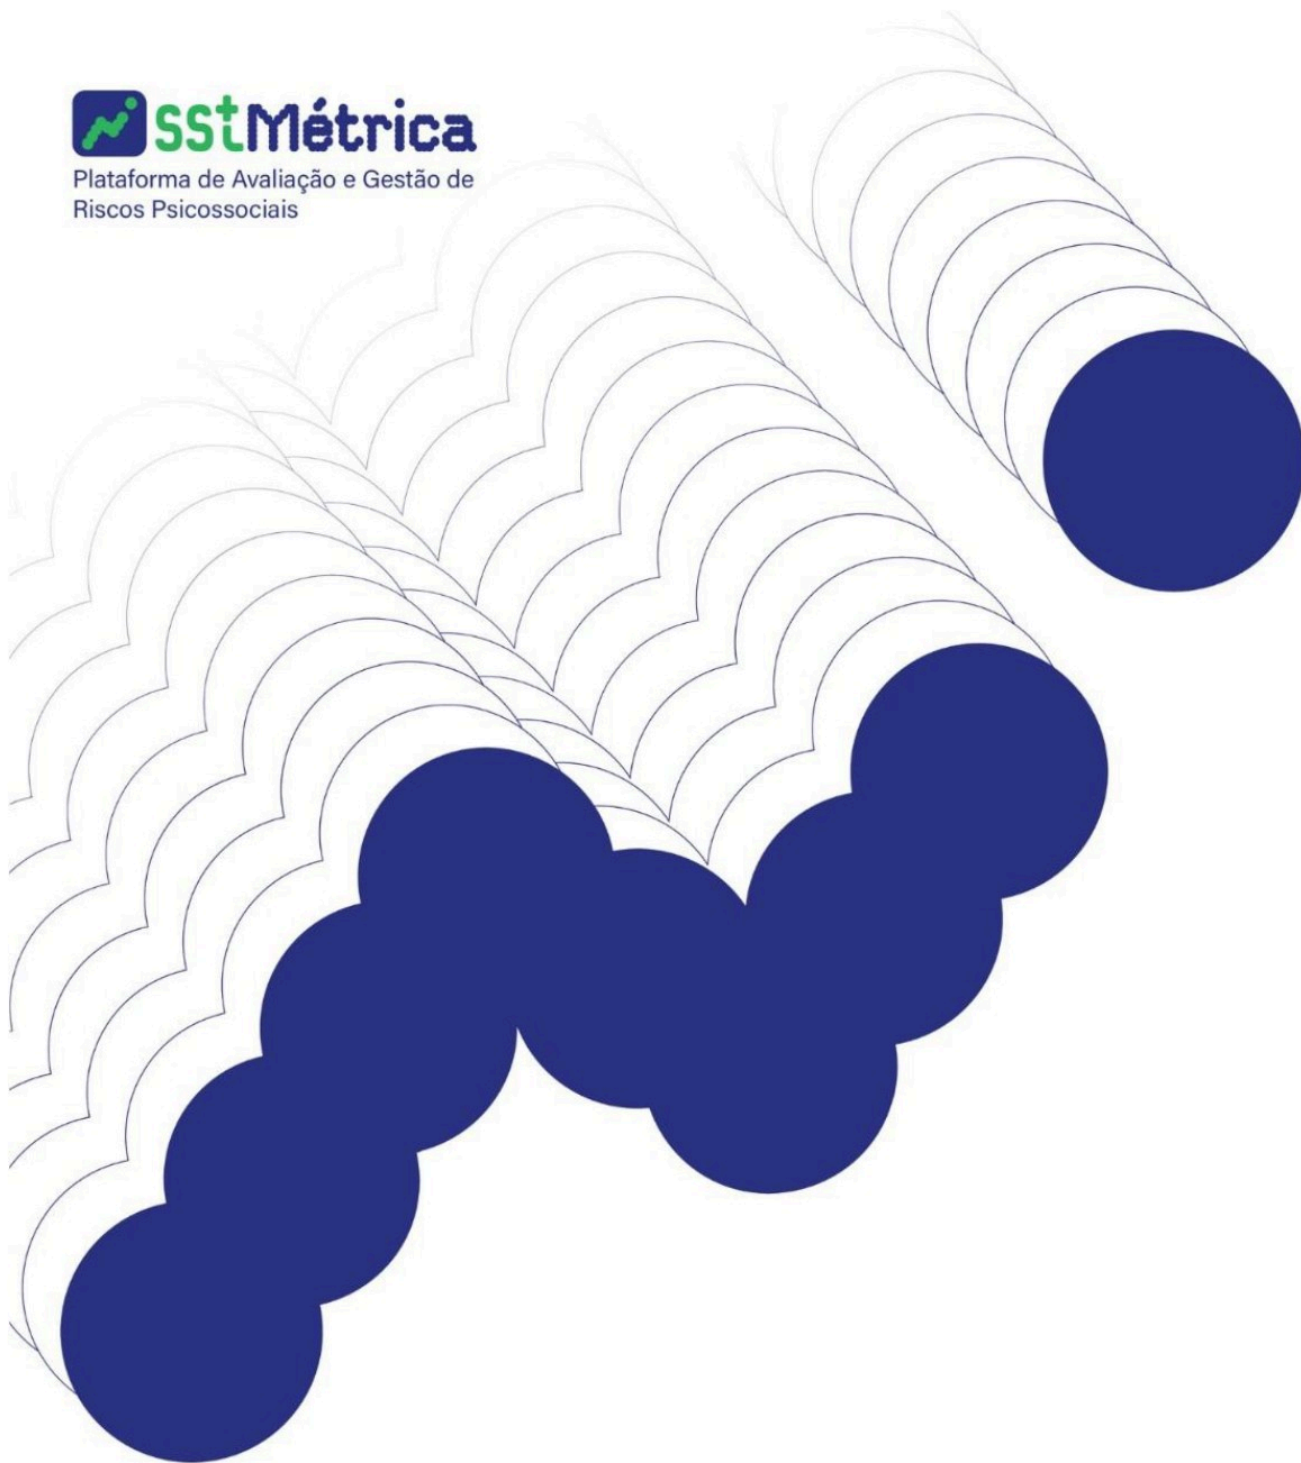

Relatório de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho

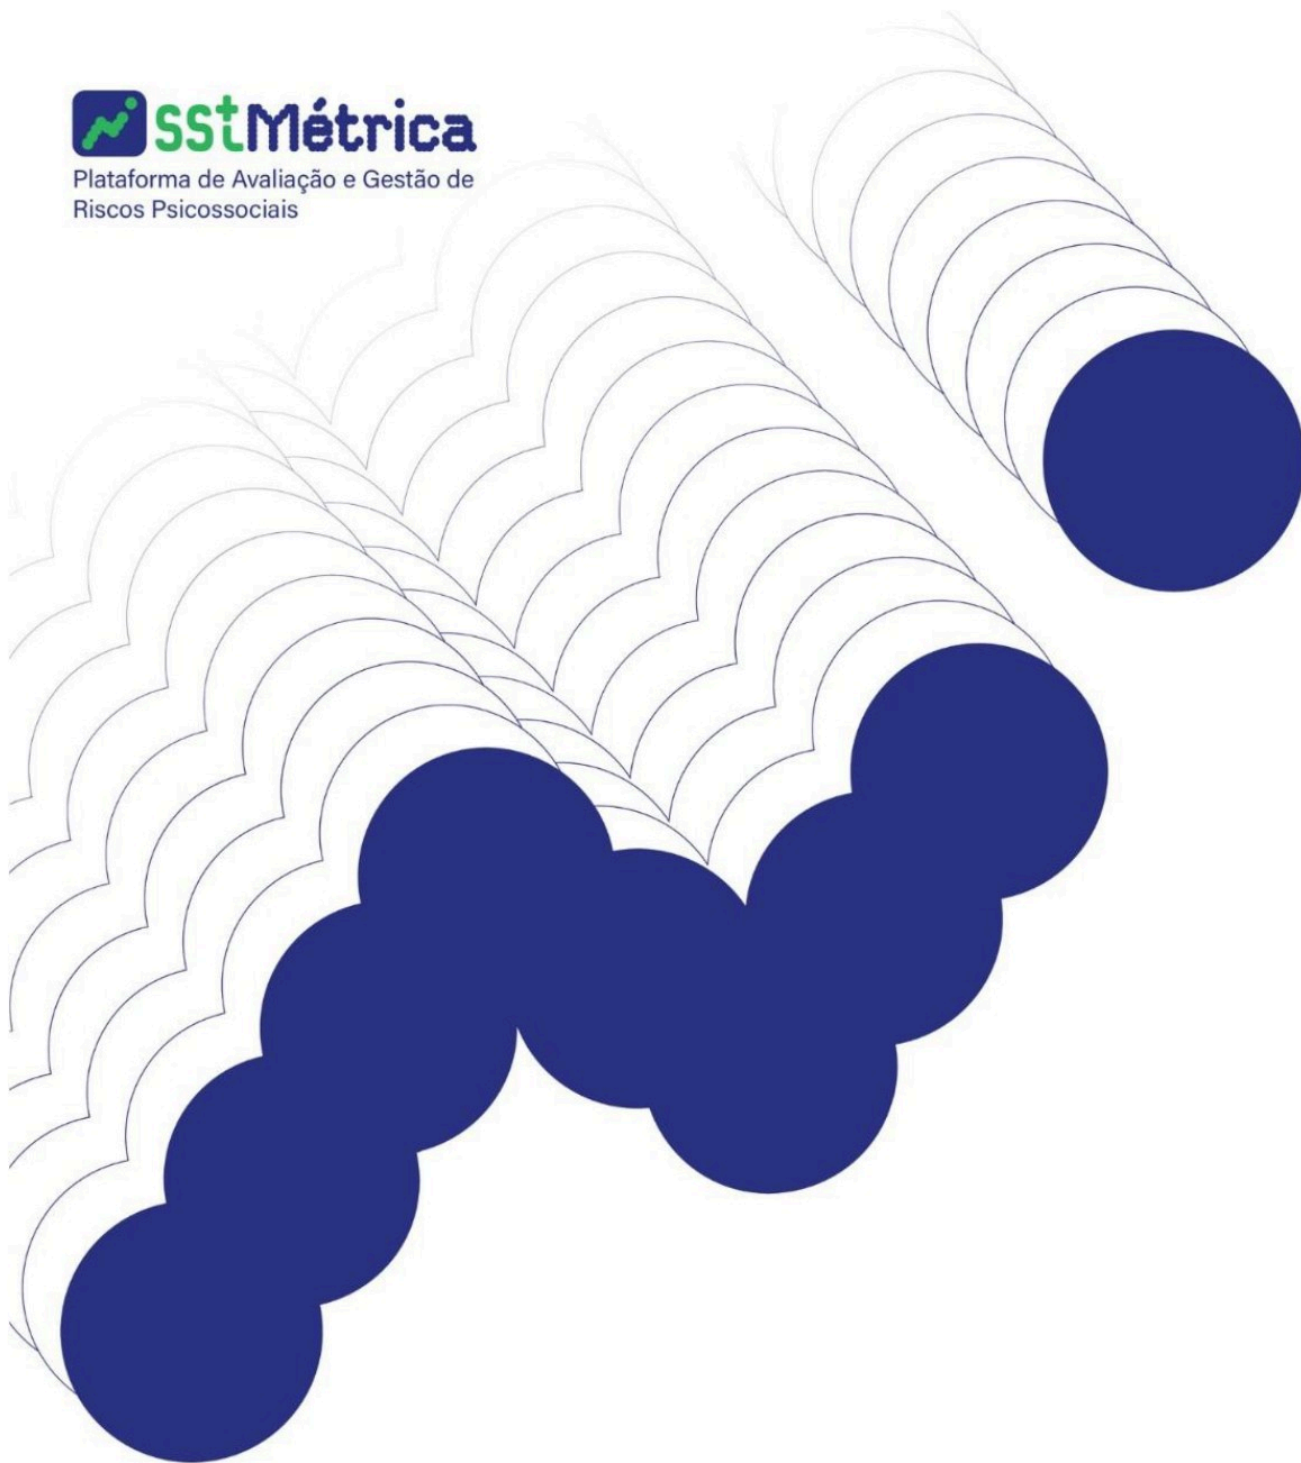

Relatório de Avaliação de Riscos Psicossociais no Trabalho

Este relatório foi elaborado no âmbito da Plataforma SSTmétrica por meio da aplicação do Instrumento de Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais no Trabalho - AQUALI-RPS, em conformidade com as diretrizes da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

Responsáveis Técnicos

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho | UFG
Mestre em Ciências Ambientais e Saúde | PUC Goiás
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais | FEUP - Portugal
CREA-PI 1964/D

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga | UnB
Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho
e das Organizações | UnB
CRP-DF: 01/8625

Nota Técnica de Responsabilidade

Este relatório contempla a avaliação dos riscos psicossociais relacionados ao trabalho, realizada por meio do instrumento AQUALI-RPS (Avaliação Qualitativa de Riscos Psicossociais), operacionalizado pela Plataforma de Avaliação e Gestão de Riscos Psicossociais – SSTmétrica.

A responsabilidade técnica dos especialistas refere-se exclusivamente ao processo de avaliação e à elaboração do relatório final conclusivo, contendo o detalhamento da metodologia aplicada, os resultados alcançados e o inventário dos riscos, nos termos da Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1).

A elaboração e execução do Plano de Ação no âmbito do Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR) constituem responsabilidade exclusiva da organização avaliada ou de consultoria por ela formalmente designada.

As recomendações técnicas disponibilizadas pela plataforma, decorrentes da avaliação, possuem caráter técnico-orientativo e têm por finalidade subsidiar a tomada de decisão da organização na definição do Plano de Ação.

Direitos Autorais e Uso Restrito

Este relatório é de uso exclusivo da organização contratante e não poderá ser reproduzido, distribuído ou alterado, total ou parcialmente, sem autorização expressa dos responsáveis técnicos e da Plataforma SSTmétrica.

FICHA CADASTRAL**1. RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO QUESTIONÁRIO**NOME FANTASIA
SECONCI GOIASRAZÃO SOCIAL
SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA CONSTRUCAO
ESTADO DE GOIASCNPJ
36863637000159INSCRIÇÃO ESTADUAL
INSENTOCNAE
86.30-5-03 - Atividade médica ambulatorial restrita a
consultasTELEFONE DA EMPRESA
6232510005EMAIL INSTITUCIONAL
coord.seguranca@seconcigoias.com.brCONTATO (TELEFONE ALTERNATIVO)
ADRIANO OLIVEIRA / E-MAIL: coord.seguran-
ca@seconcigoias.com.br / 62 99430-0089CIDADE
GoiâniaESTADO
GO**2. DADOS DA EMPRESA AVALIADA**NOME FANTASIA
PORTO ARARAS IRAZÃO SOCIAL
Porto Araras I Spe Empreendimentos Imobiliarios LtdaCNPJ
43400608000116INSCRIÇÃO ESTADUAL
-CNAE
4120-4/00TELEFONE DA EMPRESA
0000000000CIDADE
GoiâniaESTADO
GO

1. Introdução

A inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) tornou-se uma exigência legal a partir da alteração do item 1.5 da Norma Regulamentadora nº 1 (NR 1), promovida pela Portaria MTE nº 1.419, de 27 de agosto de 2024 (BRASIL, 2024). Essa atualização ampliou a abrangência dos fatores de risco ao estabelecer, no item 1.5.3.1, que os fatores psicossociais passam a integrar expressamente o grupo de fatores ergonômicos a serem avaliados pelas organizações. A obrigatoriedade de aplicação dessa mudança foi definida pela Portaria MTE nº 765, de 15 de maio de 2025 (BRASIL, 2025), que fixou a vigência da alteração para 26 de maio de 2026. Dessa forma, todas as organizações, independentemente de porte ou setor econômico, estão legalmente obrigadas a realizar a avaliação dos fatores de riscos psicossociais e incluí-los em seu Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR), garantindo sua plena integração ao processo de gestão dos riscos ocupacionais.

A avaliação destes fatores de risco, para além de atender o disposto na NR - 1, impõe a necessidade da aplicação de metodologias com fundamentação científica. Avaliação Qualitativa dos Riscos Psicossociais no Trabalho – AQUALI-RPS tem como finalidade oferecer uma compreensão abrangente das condições psicossociais que podem influenciar a saúde, o bem-estar e o desempenho dos trabalhadores. Os fatores de riscos psicossociais, no entendimento de Sampaio (2023), podem ser descritos como “características intrínsecas à organização do trabalho, com potencial de danos à saúde mental, física e social, além de efeitos no desempenho laboral e satisfação do trabalhador, que interage com o modo operatório da organização”

A avaliação abrange um conjunto amplo de fatores organizacionais e psicossociais associados às demandas laborais, ao conteúdo do trabalho, às relações sociais, ao ambiente organizacional e aos indicadores de saúde e satisfação. Esses elementos permitem identificar situações que possam contribuir para sobrecarga, estresse, esgotamento emocional, conflitos interpessoais ou outros fatores de risco decorrentes da interação do trabalhador com as circunstâncias organizacionais.

Com base nas informações coletadas, foram elaborados o Inventário de Riscos Psicossociais e o respectivo Plano de Ação, que oferecem subsídios para a tomada de decisões, priorização de intervenções e implementação de medidas preventivas e corretivas. Esses produtos visam apoiar a organização na construção de um ambiente de trabalho mais saudável, seguro e alinhado às boas práticas de gestão de riscos psicossociais.

2. Metodologia de Avaliação

2.1. Instrumento utilizado:

Trata-se do Instrumento de Avaliação Qualitativa dos Riscos Psicossociais no Trabalho (AQUALI-RPS), desenvolvido a partir do estudo de doutorado de Lucena (2022), cujo foco central foi investigar os riscos psicossociais nas organizações e a associação destes com acidentes e doenças ocupacionais com desfecho no afastamento do trabalho. A pesquisa teve como base teórico-metodológica o Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho – PROART, desenvolvido por Facas (2013), cuja estrutura de escalas e fatores orientou a construção do roteiro de entrevistas realizadas no estudo. O AQUALI-RPS resulta desse referencial e foi desenvolvido para atender, especialmente, pequenos e médios grupos de trabalhadores, propondo uma abordagem participativa, acessível e tecnicamente consistente, em conformidade com a NR - 1 (Brasil, 2022) e com a NR 17 - Ergonomia, especialmente o item 17.4 - Organização do Trabalho que estabelece a necessidade de considerar na avaliação de tais riscos, as normas de produção, a exigência de tempo, o ritmo do trabalho e o conteúdo das tarefas (BRASIL, 2022).

O AQUALI-RPS estrutura-se a partir de Histórias-Base associadas a 10 fatores de escala, os quais estão agrupados nas quatro escalas temáticas do PROART: Organização do Trabalho, Estilo de Gestão, Indicadores de Sofrimento e Danos Relacionados ao Trabalho. Essa estrutura favorece uma interação do trabalhador com o instrumento de avaliação de modo a levá-lo a uma reflexão sobre a sua vivência organizacional, a partir de cada história, desenvolvida especialmente para cada fator. Conforme definido no PROART, esses fatores têm por finalidade avaliar dimensões organizacionais consideradas relevantes no contexto dos riscos psicossociais do trabalho.

Com o objetivo de alinhar o instrumento à lógica operacional da plataforma e facilitar sua gestão automatizada, o termo **fator de escala** passou a ser tratado como **dimensão**, em consonância com a nomenclatura adotada no instrumento AQUALI-RPS, utilizado nesta avaliação. Essa equivalência terminológica não representa conflito conceitual, uma vez que ambos os termos traduzem a noção de fator de risco psicossocial ou subescala de análise.

2. Metodologia de Avaliação

2.2. Procedimentos de Aplicação e Coleta de Dados

A aplicação do AQUALI-RPS ocorre por meio de um formulário eletrônico, disponibilizado aos trabalhadores na plataforma SSTMétrica que contém as histórias - base e respectivas opções de respostas, cujo acesso se dá a partir de link específico, gerado para cada avaliação.

Durante essa etapa, são apresentadas aos respondentes as medidas de prevenção relativas a cada dimensão avaliada, cuja existência na organização deve ser confirmada ou não. Há, ainda, um campo aberto para que o trabalhador possa indicar outras medidas existentes que não estejam previamente listadas.

Ressalta-se que a participação dos trabalhadores deve ocorrer de forma individual, anônima e voluntária, em condições que assegurem que as respostas reflitam a percepção livre de cada respondente, sem a presença ou supervisão direta de representantes da empresa avaliada, ou qualquer tipo de constrangimento. Tais garantias visam preservar a confidencialidade das informações e promover um ambiente favorável para que as respostas expressem com fidelidade as percepções reais sobre o ambiente organizacional.

Excepcionalmente, nos casos em que se fizer necessário algum tipo de apoio durante a aplicação, poderá ser designado um profissional da área de Segurança e Saúde no Trabalho, preferencialmente sem vínculo com a empresa avaliada, para prestar esclarecimentos adicionais. O objetivo é garantir que todos os participantes compreendam adequadamente as questões apresentadas, assegurando a eficácia e a fidedignidade da avaliação realizada.

2.3. Processamento das respostas

Na sequência das respostas do AQUALI-RPS, todas as informações e dados são enviados de forma direta e automática à plataforma SSTMétrica que realiza o tratamento, conforme critérios técnicos e científicos do instrumento. Concluída esta etapa, é gerado um Relatório Preliminar da Avaliação, contendo o inventário de riscos psicossociais e o plano de ação. Ao acessar o relatório, a organização é convidada a analisar o plano de ação proposto, podendo alterá-lo (acrescentar mais ações), bem como definir os responsáveis por sua execução. Finalmente, depois desta última etapa, os responsáveis técnicos pela avaliação, especialistas em riscos psicossociais, validam a avaliação e o relatório definitivo fica disponibilizado na plataforma para os interessados.

2. Metodologia de Avaliação

A classificação dos níveis de riscos psicossociais é realizada por meio da aplicação de uma matriz de riscos 5 × 5 (cinco linhas por cinco colunas), conforme proposta metodológica de Franchi, Quadros e Amaral (2023). Os níveis de risco são categorizados em: Irrelevante, Baixo, Moderado, Alto e Crítico (ver Figura 1), sendo atribuídos a cada uma das dimensões que compõem o instrumento. Esse procedimento visa atender ao disposto na Norma Regulamentadora nº 1 – Disposições Gerais (Brasil, 2022), especialmente o item 1.5.7.3.2, que trata da obrigatoriedade de avaliação e classificação dos riscos. Importa destacar que a classificação final do risco não decorre de um cálculo algébrico tradicional ($P \times S$), mas sim de uma combinação conceitual entre os níveis de probabilidade e severidade, conforme orientação metodológica dos autores da matriz.

5 Altamente Provável	Médio	Alto	Alto	Crítico	Crítico
4 Provável	Médio	Médio	Alto	Alto	Crítico
3 Pouco Provável	Baixo	Médio	Médio	Médio	Alto
2 Improvável	Baixo	Baixo	Médio	Médio	Médio
1 Altamente Improvável	Irrelevante	Baixo	Baixo	Baixo	Médio
Probabilidade / Severidade	1 Leve Reversível	2 Moderado Reversível	3 Grave Reversível	4 Grave Irreversível	5 Crítico ou Fatal

Figura 1 - Matriz de riscos, adaptada de Franchi, Quadros e Amaral (2023)

2. Metodologia de Avaliação

2.4. Geração do relatório final de avaliação

Após o processamento das respostas, foi gerado o relatório preliminar da avaliação dos riscos psicossociais e submetido à análise dos responsáveis técnicos, os quais, depois de validar seu conteúdo, assinaram e disponibilizaram o documento final aos interessados.

3. Resultados

A seguir, são apresentados os resultados da avaliação psicossocial realizada por meio do instrumento AQUALI-RPS, com base nas respostas fornecidas pelos trabalhadores do grupo avaliado. O instrumento permitiu identificar o nível de risco associado a cada um dos fatores de escala, agrupados em quatro escalas principais: Organização do Trabalho, Estilo de Gestão, Sofrimento e Danos Relacionados ao Trabalho.

Os dados são apresentados em dois formatos complementares: **Quadro 1**: apresenta o nível de risco psicossocial atribuído a cada fator de escala e o nível médio por escala, com classificação baseada na matriz de risco 5×5 (probabilidade × severidade), conforme diretrizes da NR-1.

Mapa de Calor: distribui visualmente os níveis de risco por fator e por escala, utilizando um código de cores padronizado (Irrelevante a Crítico), o que permite identificar rapidamente áreas de maior vulnerabilidade e facilita a priorização das ações preventivas.

Os resultados são exibidos inicialmente conforme os níveis de risco atribuídos pelo AQUALI-RPS e, na sequência, apresentados segundo a classificação exigida pela NR 1, obtida por meio da matriz de risco probabilidade × severidade.

A legenda ao final do mapa indica a correspondência entre as cores e os respectivos níveis de risco. A disposição gráfica favorece a visualização comparativa entre os fatores e escalas, sendo uma ferramenta essencial para subsidiar a tomada de decisão no âmbito da gestão dos riscos psicossociais.

Todos os resultados, incluindo o inventário de riscos e o plano de ação, são apresentados por Grupo Homogêneo de Exposição (GHE), considerando que tais grupos devem possuir, preferencialmente, um número de integrantes não inferior a 5 ($n \geq 5$). Quando essa condição não for verificada, o GHE passa a ser tratado como global.

Grupos Homogêneos de Exposição (GHEs)

GHE - TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Atividade Executada

Execução de atividades operacionais, técnicas, administrativas e de supervisão em canteiro de obras e áreas de apoio, envolvendo serviços de construção civil, montagem e desmontagem de estruturas, armação de ferragens, carpintaria, alvenaria, concretagem, limpeza e organização do canteiro, movimentação de materiais, operação de máquinas e equipamentos, inspeção e acompanhamento das frentes de serviço, controle e distribuição de equipes, fiscalização da execução das atividades, apoio às ações de segurança do trabalho, controle administrativo da obra, atendimento e controle de acesso, além do cumprimento de procedimentos operacionais, normas internas e requisitos de segurança e saúde ocupacional.

Caracterização do Ambiente de Trabalho

Ambiente de trabalho composto por áreas administrativas, canteiro de obras, frentes de serviço e áreas de apoio operacional, com atividades realizadas em ambientes abertos e fechados.

Total de Trabalhadores: 6

Total de Respondentes: 7

Quadro – Níveis de risco por escala e dimensão - GHE TÉCNICO ADM / OPERACIONAL, avaliação qualitativa

Total de Respostas: 7

ESCALA	NÍVEL DE RISCO	DIMENSÃO	NÍVEL DE RISCO
Organização do Trabalho	MÉDIO	Divisão de Tarefas	MÉDIO
		Divisão Social do Trabalho	MÉDIO
Estilo de Gestão	MÉDIO	Estilo Individualista	MÉDIO
		Estilo Coletivista	BAIXO
Indicadores de Sofrimento	MÉDIO	Falta de Sentido do Trabalho	MÉDIO
		Esgotamento Mental	MÉDIO
		Falta de Reconhecimento	BAIXO
Danos Relacionados ao Trabalho	MÉDIO	Danos Psicológicos	MÉDIO
		Danos Sociais	MÉDIO
		Danos Físicos	MÉDIO

Mapa de Calor - Distribuição do nível de risco psicossocial por Escala - GHE TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Escala	Dimensão	Irrelevante	Baixo	Médio	Alto	Crítico	Risco-Escala
Organização do Trabalho	Divisão de Tarefas						
	Divisão Social do Trabalho						
Estilo de Gestão	Estilo Individualista						
	Estilo coletivista						
Indicadores de Sofrimento	Falta de Sentido do Trabalho						
	Esgotamento Mental						
	Falta de Reconhecimento						
Danos Relacionados ao Trabalho	Danos Psicológicos						
	Danos Sociais						
	Danos Físicos						

● Irrelevante ● Baixo ● Médio ● Alto ● Crítico

4. Inventário de Riscos Psicossociais

A presente avaliação de riscos psicossociais foi realizada com base em metodologia cientificamente fundamentada, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considerando os dados coletados, analisados e interpretados de forma técnica e sistemática. Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e a estruturação de um Plano de Ação correspondente.

Para as dimensões classificadas para inclusão no plano de ação elaborado pela organização avaliada, são apresentadas recomendações técnicas por especialistas da SSTMétrica, considerando os resultados da avaliação realizada. Cabe à organização avaliada decidir pela inclusão parcial ou integral dessas recomendações, conforme seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização.

TÉCNICO ADM / OPERACIONAL

Trabalhadores expostos: 6

Divisão de Tarefas		MÉDIO
Descrição: O ritmo, prazos e condições oferecidas para a execução das tarefas		
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde: Estresse ocupacional, sobrecarga mental, fadiga, sensação de ineficiência		
Probabilidade Ajustada 3	Severidade 2	
Medida-Chave de Prevenção Existente: Rodízio entre tarefas repetitivas e criativas Reconhecimento: 0%		
Prioridade da Ação: Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.		

4. Inventário de Riscos Psicossociais

Divisão Social do Trabalho

MÉDIO

Descrição:

Normas, comunicação, avaliação, autonomia e participação relativos ao trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conflitos interpessoais, sentimento de injustiça, desagregação de equipe

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

3

Medida-Chave de Prevenção Existente:

Inclusão de trabalhadores em diferentes etapas do processo produtivo

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Estilo Individualista

MÉDIO

Descrição:

Centralização das decisões no papel do gestor, forte sistema burocrático, valorização das regras em detrimento aos sujeitos, sistema disciplinar rígido e alto controle do trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Competitividade excessiva, isolamento, ansiedade, dificuldade de cooperação

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

3

Medida-Chave de Prevenção Existente:

Treinamentos para gestores em empatia e escuta ativa

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

4. Inventário de Riscos Psicosociais

Estilo coletivista

BAIXO**Descrição:**

Se caracteriza por relações de troca bem estabelecidas entre seus membros, valorização da criatividade e inovação. Favorece a interação profissional e a promoção de um maior bem-estar das pessoas. Prioriza a busca de promoção, tem flexibilidade em relação aos níveis hierárquicos e valoriza o reconhecimento e o compromisso com o trabalho.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Conformismo forçado, pressão grupal, dificuldade de afirmação pessoal

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

1**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

Estabelecimento de metas coletivas (além das individuais)

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

Falta de Sentido do Trabalho

MÉDIO**Descrição:**

Se caracteriza por sentimentos de inutilidade, ao fazer um trabalho que não tem sentido para si mesmo, nem é importante e significativo para a organização, clientes e/ou para a sociedade.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Apatia, sentimento de inutilidade, sofrimento moral, desmotivação crônica

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

4**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

Alinhamento dos objetivos individuais com a missão da empresa

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

4. Inventário de Riscos Psicosociais

Esgotamento Mental

MÉDIO**Descrição:**

Sentimentos de injustiça, desânimo, insatisfação e/ou desgaste com seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Ansiedade, insônia, dificuldade de concentração, sinais de burnout

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

3**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

Pausas programadas durante a jornada

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Falta de Reconhecimento

BAIXO**Descrição:**

Sentimentos de desvalorização, não aceitação e/ou admiração pelos colegas e chefias, e falta de liberdade para expressar o que pensa e sente em relação ao seu trabalho

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Baixa autoestima, tristeza, frustração, desvalorização emocional

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

2**Medida-Chave de Prevenção Existente:**

Premiações simbólicas (elogios públicos, certificados)

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Médio / Longo Prazo**

Risco aceitável; ações preventivas podem ser programadas para médio ou longo prazo, com monitoramento contínuo.

4. Inventário de Riscos Psicossociais

Danos Psicológicos

MÉDIO

Descrição:

Caracterizado por sentimentos negativos em relação a si mesmo e a vida em geral.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Transtornos de ansiedade, depressão, crises emocionais, irritabilidade persistente

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

5

Medida-Chave de Prevenção Existente:

Parcerias com psicólogos externos para acolhimento

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

Danos Sociais

MÉDIO

Descrição:

Caracterizado por comportamentos de isolamento e dificuldades nas relações familiares e sociais.

Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde:

Isolamento social, conflitos familiares, retraimento, deterioração das relações interpessoais

Probabilidade Ajustada

2

Severidade

4

Medida-Chave de Prevenção Existente:

Incentivo a confraternizações e momentos coletivos

Reconhecimento: 0%

Prioridade da Ação:**Curto Prazo**

As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.

4. Inventário de Riscos Psicossociais

Danos Físicos		MÉDIO
Descrição: Caracterizado por dores no corpo e distúrbios biológicos		
Possíveis Lesões ou Agravos à Saúde: Dores musculares, cefaleias, distúrbios gastrointestinais, somatizações		
Probabilidade Ajustada 2	Severidade 3	
Medida-Chave de Prevenção Existente: Avaliação ergonômica do posto de trabalho Reconhecimento: 0%		
Prioridade da Ação: Curto Prazo As medidas devem ser planejadas e inovadoras em breve para reduzir o risco e evitar agravamento.		

No que se refere à NR-17, os fatores psicossociais aqui analisados estão associados à organização do trabalho, às exigências cognitivas, ao estilo de gestão e às relações interpessoais, conforme previsto na ergonomia organizacional.

5. Considerações Finais

A presente avaliação de riscos psicossociais foi realizada com base em metodologia cientificamente fundamentada, em conformidade com a Norma Regulamentadora nº 1 (NR-1), considerando os dados coletados, analisados e interpretados de forma técnica e sistemática. Os resultados obtidos expressam os níveis de risco associados às dimensões do instrumento aplicado, possibilitando a elaboração do Inventário de Riscos Psicossociais e a estruturação de um Plano de Ação correspondente.

Para as dimensões classificadas para inclusão no plano de ação elaborado pela organização avaliada, são apresentadas recomendações técnicas por especialistas da SSTMétrica, considerando os resultados da avaliação realizada. Cabe à organização avaliada decidir pela inclusão parcial ou integral dessas recomendações, conforme seus critérios técnicos, organizacionais e operacionais. A implementação, o acompanhamento e a avaliação da eficácia das ações adotadas são de responsabilidade da organização.

Responsáveis Técnicos

01/06/2026

Documento assinado digitalmente
 FRANCISCO EDISON SAMPAIO
Data: 01/06/2026 07:31:59-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Francisco Edison Sampaio

Engenheiro de Segurança do Trabalho, Mestre em Ciências Ambientais e Saúde
Doutor em Segurança e Saúde Ocupacionais
CREA-PI 1964/D

Documento assinado digitalmente
 LUCIANA MERCES DE LUCENA
Data: 01/06/2026 15:35:31-0300
Verifique em <https://validar.iti.gov.br>

Luciana Mercês de Lucena

Psicóloga, Mestre e Doutora em Psicologia do Trabalho e das Organizações
CRP-DF: 01/8625

Fontes de Consulta

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 1: Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora no 17: Ergonomia. Brasília: MTE, 2020.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 1.419, de 27 de agosto de 2024. Altera a Norma Regulamentadora no 1 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 28 ago. 2024.

BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Portaria MTE no 765, de 15 de maio de 2025. Estabelece a vigência das alterações da Norma Regulamentadora no 1 referentes à inclusão dos riscos psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. Diário Oficial da União: seção 1, Brasília, DF, 16 maio 2025.

FACAS, Emílio Peres. Protocolo de Avaliação dos Riscos Psicossociais no Trabalho – PROART. 2013. Tese (Doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações) – Universidade de Brasília, Brasília, 2013.

FRANCHI, Maurício Rodrigues; QUADROS, Bruna Carolina de; AMARAL, Fernando Gonçalves. - Matriz de nível de risco ocupacional: proposta de um modelo segundo os requisitos normativos da Norma Regulamentadora no 01. Revista da Escola Nacional da Inspeção do Trabalho - ENIT, Brasília, v. 3, n. 1, p. 1-23, 2023.

LUCENA, Luciana Mercês de. “Um caquinho de vidro, parece que não tem como colar”: riscos psicossociais, acidente e adoecimento do trabalhador brasileiro. 2022. Tese (Doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações) – Universidade de Brasília, Brasília, 2022.

SAMPAIO, Francisco Edison. Absenteísmo-doença de servidores públicos: Ausências Laborais no Poder Legislativo. São Paulo: Editora Dialética, 2023. ISBN 978-65-270-1875-9.
